


OU-16500-116500-116796-5-04-Schema-ArbeitsEbene-SW.dwg, 22. Feb. 2023 12:04

Schema Arbeitsebenenherstellung Spundwandarbeiten

- Deichinstandsetzung im Bestand mittels statisch wirksamer Spundwand in
Deichachse und Erhöhung der Deichkrone zur Einhaltung des Freibords von 1 m

M 1:50

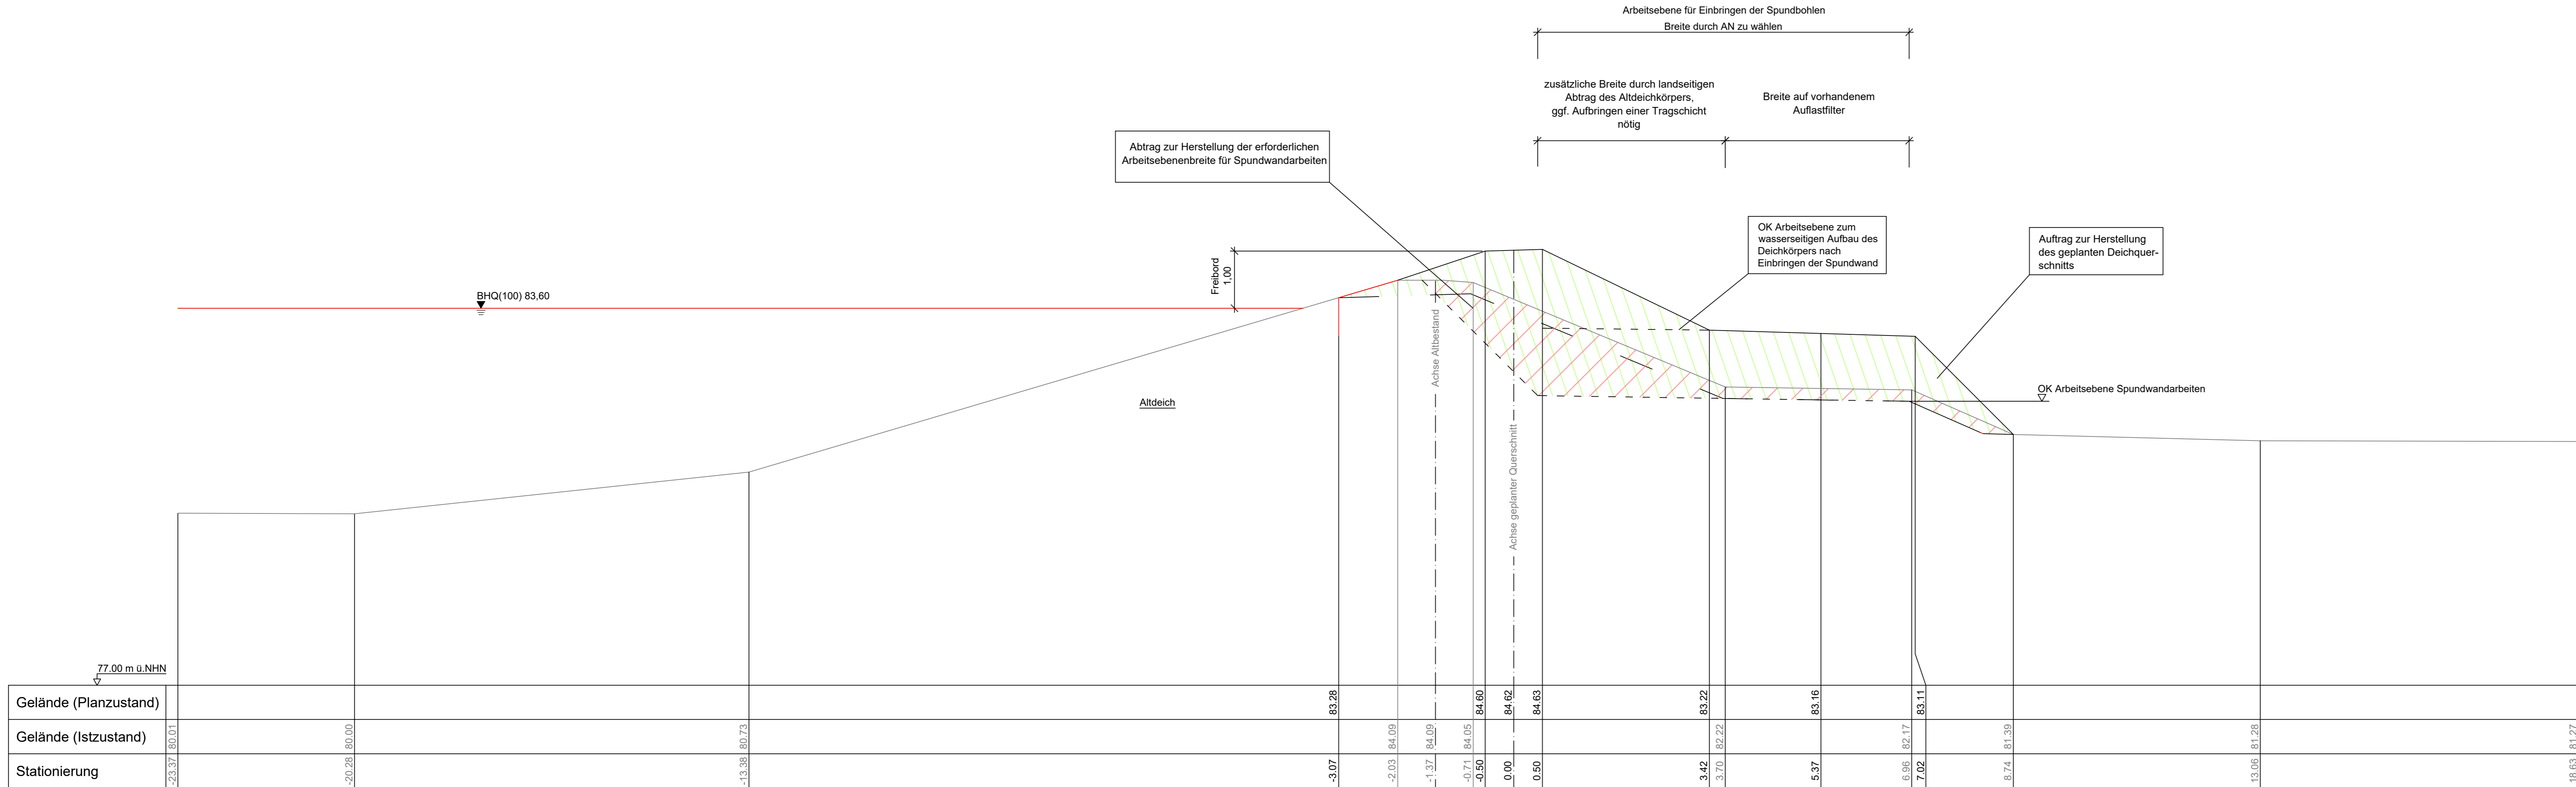


Ablaufschema:

- Abtrag des Bestandsdeichs landseitig zur Schaffung einer Arbeitsebene für die Einbringung der Innendichtung (Spundwand)
- Herstellen der Innendichtung in der Achse des geplanten Deichquerschnitts
- Materialauftrag zur Herstellung einer Arbeitsebene für den wasserseitigen Aufbau und die Konturierung von der Landseite der Spundwand aus. Notwendige Höhe und Breite ist durch den AN zu wählen. Der Auftrag folgt dabei der geplanten Neukontur des herzustellenden Deiches.
- Wiederaufbau/ Konturierung des wasserseitig der Spundwand gelegenen Deichkörpers von landseitiger Arbeitsebene aus.
- Aufbau/ Konturierung des landseitigen Deichkörpers. Planungsgemäße Ausbildung des Deichverteidigungsweges, der Deichkrone und der Deichböschung

Legende:

- IST-Zustand
- PLAN-Zustand

1:50



Vermessung durch (März 2011):

Hemminger Ingenieurgesellschaft
Am Schwarzgraben 30
04924 Bad Liebenwerda
Tel.: 03 53 41/150-0
Fax.: 03 53 41/150 55

Änderungsindex				
Index	Datum	Name	Signum	Bemerkung
a				
b				
c				
Auftraggeber				
		Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen		
		Betrieb Elbaue / Mulde / Untere Weiße Elster		
				
Auftragnehmer				
		CDM Smith Consult GmbH Weißenfeller Straße 65 H 04229 Leipzig		tel: 0341 33389300 fax: 0341 33389392 leipzig@cdmsmith.com www.cdmsmith.com
Lagebezug: ETRS89, UTM33			Höhenbezug: DHHN92	
Landkreis: Nordsachsen			Gemeinde: Beilrode	
Gemarkung: Zwethau			Flurstück: diverse	
	Datum	Name	Unterschrift	Z 10.4 - Elbe, Deich Torgau Elbbrücke bis Siel Zwethau I, rechts, km 2+600 bis km 3+760 Schema Herstellung Arbeitsebene für SW-Arbeiten Station 2+600 bis 3+760
Gez.	10.02.2023	Nouri		
Bearb.	10.02.2023	Lehmann		
Gepr.	10.02.2023	Renker		
EL-QS-116796-5-04-Schema-ArbeitsEbene-SW.dwg				
Auftragsnr.: 2.265.1261.015			Plan-Nr.: 5-04-009	Maßstab
Phase: Ausführungsplanung			LTV-Nr.:	1:50
				Blatt 1
				1 BL
