


Nr.	Vorgang	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vor.	Ressource	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal
								3. Qtl	4. Qtl	1. Qtl	2. Qtl
1		Eingang Bestellung beim Auftragnehmer	2 Tage	Don 17.10.24	Fre 18.10.24		AN				
2		Start der Leistungserbringung/ Benennung des zuständigen Projektleiters/Kick Off Meeting	10 Tage	Mon 04.11.24	Fre 15.11.24		AN,AG				
3		Beauftragungsphase	25 Tage	Mon 18.11.24	Fre 20.12.24						
4		Bereitstellung der vorhandenen Anlagendokumentation	5 Tage	Mon 18.11.24	Fre 22.11.24	2	AG				
5		Erstellung und Lieferung der Vorabdokumentation (Berichtsmuster und Terminplan)	15 Tage	Mon 25.11.24	Fre 13.12.24	4	AN				
6		Abstimmung und Freigabe der Vorabdokumentation	5 Tage	Mon 16.12.24	Fre 20.12.24	5	AN,AG				
7		Ausführungsphase	46 Tage	Die 07.01.25	Die 11.03.25						
8		Prüfung der vorhandenen Anlagen- und Gebäudedokumentation/ vor Ort Besichtigung	5 Tage	Die 07.01.25	Mon 13.01.25	6	AN				
9		Sicherheitseinweisung des AN	1 Tag	Die 14.01.25	Die 14.01.25	8					
10		Erstellung des Messkonzepts/ Terminplan auf Grundlage der vor Ort Besichtigung	5 Tage	Mit 15.01.25	Die 21.01.25	9	AN				
11		Abstimmung und Freigabe des Messkonzepts	10 Tage	Mit 22.01.25	Die 04.02.25	10	AG				
12		Durchführung der energetischen Inspektionen	10 Tage	Mit 05.02.25	Die 18.02.25	11	AN,AG				
13		Aktualisierung der Anlagenschemen	5 Tage	Mit 19.02.25	Die 25.02.25	12	AN				
14		Erstellung und Lieferung der Inspektionsberichte	10 Tage	Mit 26.02.25	Die 11.03.25	13	AN				
15		Abschlussphase	10 Tage	Mit 12.03.25	Die 25.03.25						
16		Durchsicht der Inspektionsberichte und Anlagenschemen	5 Tage	Mit 12.03.25	Die 18.03.25	14	AG				
17		Leistungsfeststellung und Abnahme mit Protokoll	5 Tage	Mit 19.03.25	Die 25.03.25	16	AN,AG				

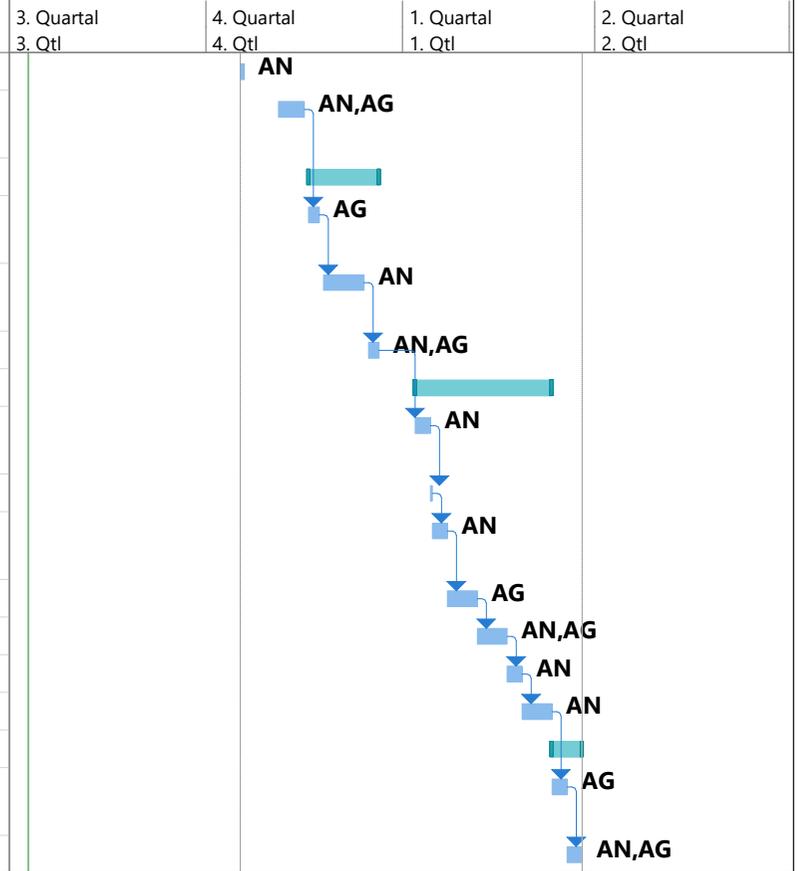

202407\_000459\_EI\_Terminplan  
Datum: Mit 10.07.24

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			
