


Nr.	Vorgangname	Dauer <sup>1)</sup>
1	<b>Los_A314 + A315_Abdichtung_Gussasphaltestrich</b>	<b>99 Tage</b>
2	Los A314 + A315_Gussasphalt / Estrich / Leistungsabruf	12 Tage
3	Los A314 + A315_Gussasphalt / Estrich / Werk- u. Montagepläne	12 Tage
4	Los A314 + A315_Gussasphalt / 3. OG Achse 1-14	5 Tage
5	Los A314 + A315_Gussasphalt / 2. OG Achse 1-14	5 Tage
6	Los A314 + A315_Gussasphalt / 1. OG Achse 1-14	5 Tage
7	Los A314 + A315_Gussasphalt / EG Achse 1-14	5 Tage
8	Los A314 + A315_Gussasphalt / 3. OG Achse 14-29	5 Tage
9	Los A314 + A315_Gussasphalt / 2. OG Achse 14-29	5 Tage
10	Los A314 + A315_Gussasphalt / 1. OG Achse 14-29	5 Tage
11	Los A314 + A315_Gussasphalt / EG Achse 14-29	5 Tage
12	Los A314 + A315_Abdichtungsarbeiten / Estrich / KG Achse 1-14	5 Tage
13	Los A314 + A315_Gussasphalt / KG Achse 14-29	5 Tage
14	Los A314 + A315_Abdichtungsstreifen unter Trockenbauwände	5 Tage
15	Los A314 + A315_Abdichtung Bodenplatte	10 Tage
16	Los A314 + A315_Restarbeiten Verfugen, Vergießen, Beräumen Schutzbelag	30 Tage

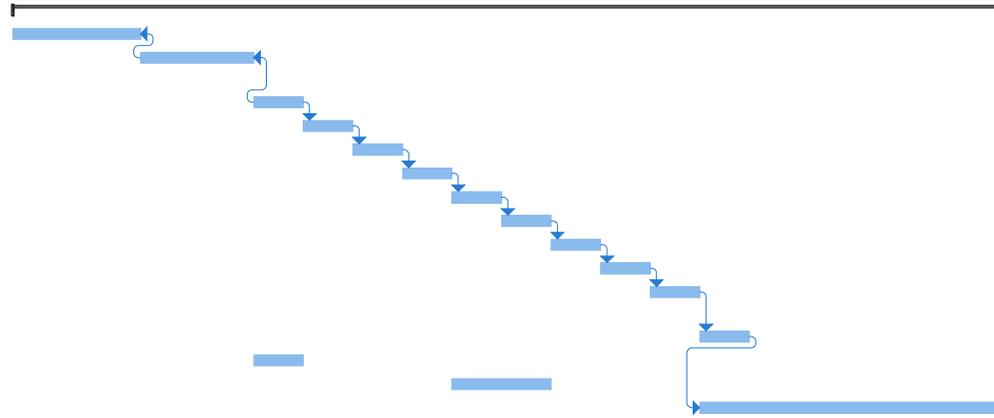

1) Angaben sind Werkzeuge

## Vorabzug - Los A314b315 Abdichtung / Estrich / Gußasphalt

Vorgang		Externe Vorgänge		Manueller Vorgang		Nur Ende	
Unterbrechung		Externer Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Meilenstein		Inaktiver Vorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Sammelvorgang		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Projektsammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Nur Anfang			
