


| Nr. | Vorgangsname | Dauer | Anfang | Ende | % Abgeschl. | Vorgänger |
|-----|--|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|------------|
| 0 | Kolonnadenviertel 2.BA - Rahmenterminplan | 429 Tage | Don 12.12.24 | Die 08.09.26 | 0% | |
| 1 | Planung Stufe 1 | 135 Tage | Don 12.12.24 | Don 03.07.25 | 0% | |
| 2 | Ausschreibung Planerleistung | 46 Tage | Don 12.12.24 | Fre 21.02.25 | 0% | |
| 3 | Zuschlag TGA-Planer | 0 Tage | Fre 21.02.25 | Fre 21.02.25 | 0% | 2 |
| 4 | Kick-Off Beratung | 0 Tage | Fre 07.03.25 | Fre 07.03.25 | 0% | 3EA+2 Woc |
| 5 | Planungsphase LP 1-3 | 79 Tage | Mon 10.03.25 | Don 03.07.25 | 0% | 4AA |
| 6 | Vorstellung LP 3 | 0 Tage | Don 03.07.25 | Don 03.07.25 | 0% | 5 |
| 7 | AR für Baubeschluss | 0 Tage | Don 11.09.25 | Don 11.09.25 | 0% | |
| 8 | Weiterführende Planung | 50 Tage | Fre 04.07.25 | Don 11.09.25 | 0% | 6 |
| 9 | Planung / Ausführung Stufe 2 | 105 Tage | Don 11.09.25 | Die 17.02.26 | 0% | |
| 10 | Start Weiterbeauftragung Planer (Stufe 2) | 0 Tage | Don 11.09.25 | Don 11.09.25 | 0% | 7;8 |
| 11 | Erstellung LP 5 und 6 inkl. LVs | 40 Tage | Don 11.09.25 | Fre 07.11.25 | 0% | 7 |
| 12 | Prüfung LVs | 5 Tage | Mon 10.11.25 | Fre 14.11.25 | 0% | 11 |
| 13 | Ausschreibung / Beauftragung | 60 Tage | Mon 17.11.25 | Die 17.02.26 | 0% | 12 |
| 14 | Baubeginn | 130 Tage | Mit 04.03.26 | Die 08.09.26 | 0% | |
| 15 | Baupahse | 130 Tage | Mit 04.03.26 | Die 08.09.26 | 0% | 13EA+10 Ta |
| 16 | Bauende | 0 Tage | Die 08.09.26 | Die 08.09.26 | 0% | 15 |

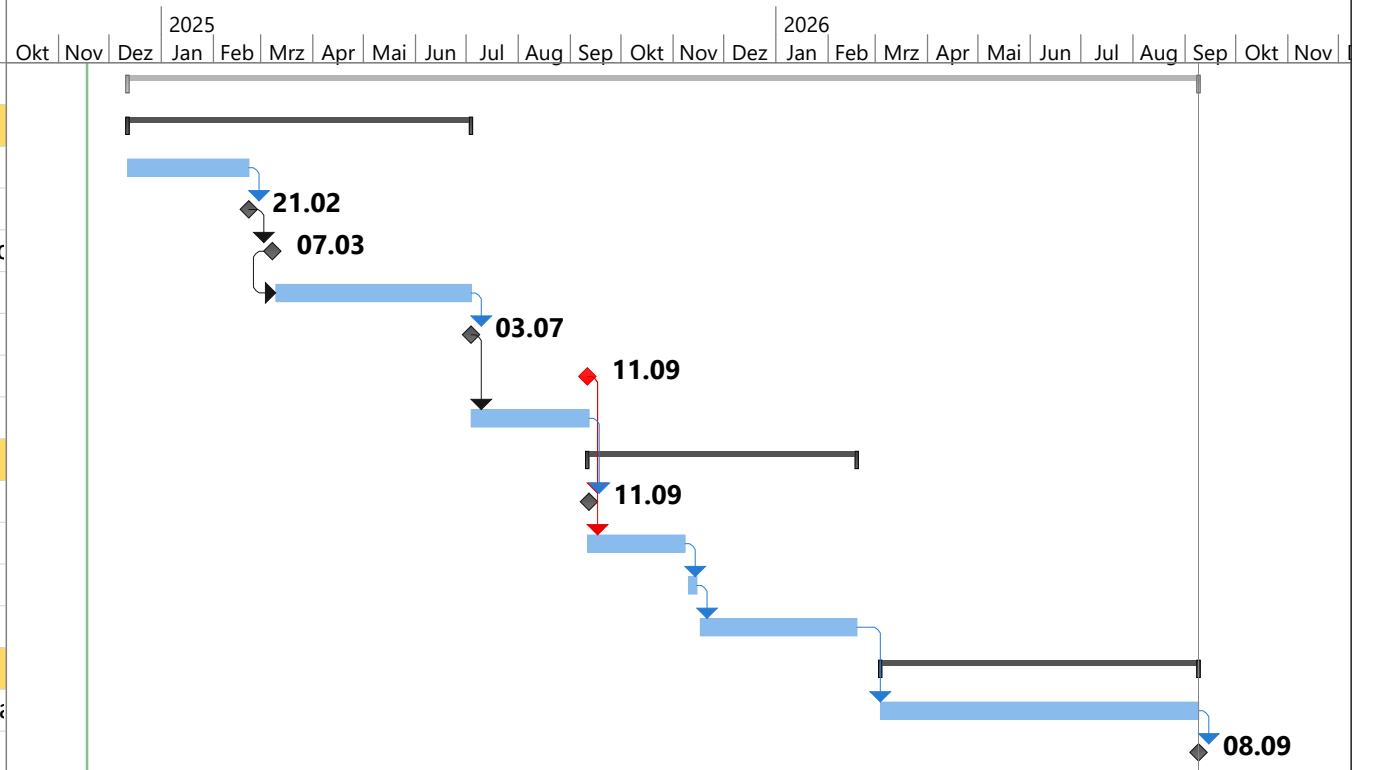

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|----------------------|--|-----------------------|--|
| Projekt: Kolonnadenviertel 2.BA Datum: Mon 18.11.24 | Vorgang | | Projektsammelvorgang | | Manueller Vorgang | | Nur Anfang | | Stichtag | |
| | Unterbrechung | | Inaktiver Vorgang | | Nur Dauer | | Nur Ende | | In Arbeit | |
| | Meilenstein | | Inaktiver Meilenstein | | Manueller Sammelrollup | | Externe Vorgänge | | Manueller Fortschritt | |
| | Sammelvorgang | | Inaktiver Sammelvorgang | | Manueller Sammelvorgang | | Externer Meilenstein | | | |
