


| Nr. | Vorgang | Dauer | Anfang | Ende | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--|
| 1 | Sanierung von 4 Sanitärbereichen Kita Sonnenschein, Zwönitz | 304 Tage | Mon 28.10.24 | Die 10.02.26 | |
| 2 | Planungsleistungen | 91 Tage | Mon 28.10.24 | Fre 21.03.25 | |
| 3 | Vorplanung Architektur | 35 Tage | Mon 28.10.24 | Fre 13.12.24 | |
| 4 | Entwurfsplanung Architektur | 21 Tage | Mon 13.01.25 | Mon 10.02.25 | |
| 5 | Ausführungsplanung Architektur | 15 Tage | Die 11.02.25 | Mon 03.03.25 | |
| 6 | Vorplanung HLS | 21 Tage | Mon 16.12.24 | Fre 31.01.25 | |
| 7 | Entwurfsplanung HLS | 15 Tage | Mon 03.02.25 | Fre 21.02.25 | |
| 8 | Ausführungsplanung HLS | 15 Tage | Mon 24.02.25 | Fre 14.03.25 | |
| 9 | Erstellung Leistungsverzeichnisse | 14 Tage | Die 04.03.25 | Fre 21.03.25 | |
| 10 | Los 05 Bauhaupt, Los 06 Tischler, Los 07 Bodenbelag, Los 08 Malerarbeiten, Los 09 Fliese, Los 10 Elektrorarbeiten, | 14 Tage | Die 04.03.25 | Fre 21.03.25 | |
| 11 | Los 11 HLS-Installation | 10 Tage | Mon 10.03.25 | Fre 21.03.25 | |
| 12 | Vergabeverfahren | 42 Tage | Mon 24.03.25 | Fre 23.05.25 | |
| 13 | Los 05 Bauhaupt, Los 06 Tischler, Los 07 Bodenbelag, Los 08 Malerarbeiten, Los 09 Fliese, Los 10 Elektrorarbeiten, | 25 Tage | Mon 24.03.25 | Die 29.04.25 | |
| 14 | Los 11 HLS-Installation | 25 Tage | Mon 24.03.25 | Die 29.04.25 | |
| 15 | Auswertung Angebote Bau | 6 Tage | Mit 30.04.25 | Don 08.05.25 | |
| 16 | Auswertung Angebote HLS | 6 Tage | Mit 30.04.25 | Don 08.05.25 | |
| 17 | Auftragserteilung SR 23.05.2025 | 1 Tag | Fre 23.05.25 | Fre 23.05.25 | |
| 18 | Baumaßnahme | 171 Tage | Mon 26.05.25 | Die 10.02.26 | |
| 19 | 1. Strang WC-Anlage 2 Geschosse Bad 1 und Bad 3 | 93 Tage | Mon 26.05.25 | Die 07.10.25 | |
| 20 | Bauleistung | 23 Tage | Die 10.06.25 | Don 10.07.25 | |
| 21 | Baustelleneinrichtung | 1 Tag | Die 10.06.25 | Die 10.06.25 | |
| 22 | Abbrucharbeiten | 8 Tage | Mit 11.06.25 | Fre 20.06.25 | |
| 23 | Rohbauarbeiten, inkl. Betonschneider | 10 Tage | Mon 23.06.25 | Fre 04.07.25 | |
| 24 | Putzarbeiten | 4 Tage | Mon 07.07.25 | Don 10.07.25 | |
| 25 | Trockenbauarbeiten | 56 Tage | Fre 11.07.25 | Fre 26.09.25 | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------|--|
| Projekt: Kita Sonnenschein Sanierung von 4 WC-Anlagen Datum: Mon 17.03.25 | Vorgang | | Inaktiver Vorgang | | Manueller Sammelrollup | | Externer Meilenstein | |
| | Unterbrechung | | Inaktiver Meilenstein | | Manueller Sammelvorgang | | Stichtag | |
| | Meilenstein | | Inaktiver Sammelvorgang | | Nur Anfang | | In Arbeit | |
| | Sammelvorgang | | Manueller Vorgang | | Nur Ende | | Manueller Fortschritt | |
| | Projektsammelvorgang | | Nur Dauer | | Externe Vorgänge | | | |

| Nr. | Vo | Vorgangsname | Dauer | Anfang | Ende | Gantt Chart Timeline | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | Trockenbau Wände stellen | 6 Tage | Fre 11.07.25 | Fre 18.07.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | Trockenbau Wände schließen | 10 Tage | Fre 25.07.25 | Don 07.08.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | WC-Trennwände stellen | 2 Tage | Don 25.09.25 | Fre 26.09.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | Fliesenarbeiten | 24 Tage | Fre 08.08.25 | Mit 10.09.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | Estricharbeiten | 4 Tage | Fre 08.08.25 | Mit 13.08.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | Fliesenarbeiten | 15 Tage | Don 21.08.25 | Mit 10.09.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | Tischlerarbeiten | 26 Tage | Mon 26.05.25 | Don 03.07.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | Fenster bestellen | 25 Tage | Mon 26.05.25 | Mit 02.07.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | Fenster montieren | 1 Tag | Don 03.07.25 | Don 03.07.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | Malerarbeiten | 52 Tage | Mon 07.07.25 | Die 16.09.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | Farben/Tapeten entfernen | 5 Tage | Mon 07.07.25 | Fre 11.07.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | Anstrich/Tapezierarbeiten | 8 Tage | Fre 05.09.25 | Die 16.09.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | Bodenbelag | 3 Tage | Fre 12.09.25 | Die 16.09.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | Haustechnik HLS | 81 Tage | Fre 06.06.25 | Mon 29.09.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | Abbruch vorh. Installation | 8 Tage | Fre 06.06.25 | Mit 18.06.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | Rohinstallation | 12 Tage | Die 15.07.25 | Mit 30.07.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | Fußbodenheizung EG | 5 Tage | Fre 01.08.25 | Don 07.08.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | Feininstallation | 5 Tage | Don 14.08.25 | Mit 20.08.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | Endmontage | 8 Tage | Mit 17.09.25 | Fre 26.09.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | messen/prüfen/regeln | 1 Tag | Mon 29.09.25 | Mon 29.09.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | Haustechnik Elektro | 79 Tage | Die 03.06.25 | Mon 22.09.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | Freischaltung / Baustrom | 2 Tage | Die 03.06.25 | Mit 04.06.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | Rohinstallation | 5 Tage | Mon 23.06.25 | Fre 27.06.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | Endmontage | 4 Tage | Mit 17.09.25 | Mon 22.09.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | Reinigung / Umzug | 6 Tage | Mon 29.09.25 | Die 07.10.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | 2. Strang WC-Anlage 2 Geschosse Bad 2 und Bad 4 | 78 Tage | Mit 08.10.25 | Die 10.02.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | Bauleistung | 15 Tage | Mit 08.10.25 | Die 28.10.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | | Baustelleneinrichtung | 1 Tag | Mit 08.10.25 | Mit 08.10.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | Abbrucharbeiten | 6 Tage | Don 09.10.25 | Don 16.10.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------|--|
| Projekt: Kita Sonnenschein Sanierung von 4 WC-Anlagen Datum: Mon 17.03.25 | Vorgang | | Inaktiver Vorgang | | Manueller Sammelrollup | | Externer Meilenstein | |
| | Unterbrechung | | Inaktiver Meilenstein | | Manueller Sammelvorgang | | Stichtag | |
| | Meilenstein | | Inaktiver Sammelvorgang | | Nur Anfang | | In Arbeit | |
| | Sammelvorgang | | Manueller Vorgang | | Nur Ende | | Manueller Fortschritt | |
| | Projektsammelvorgang | | Nur Dauer | | Externe Vorgänge | | | |

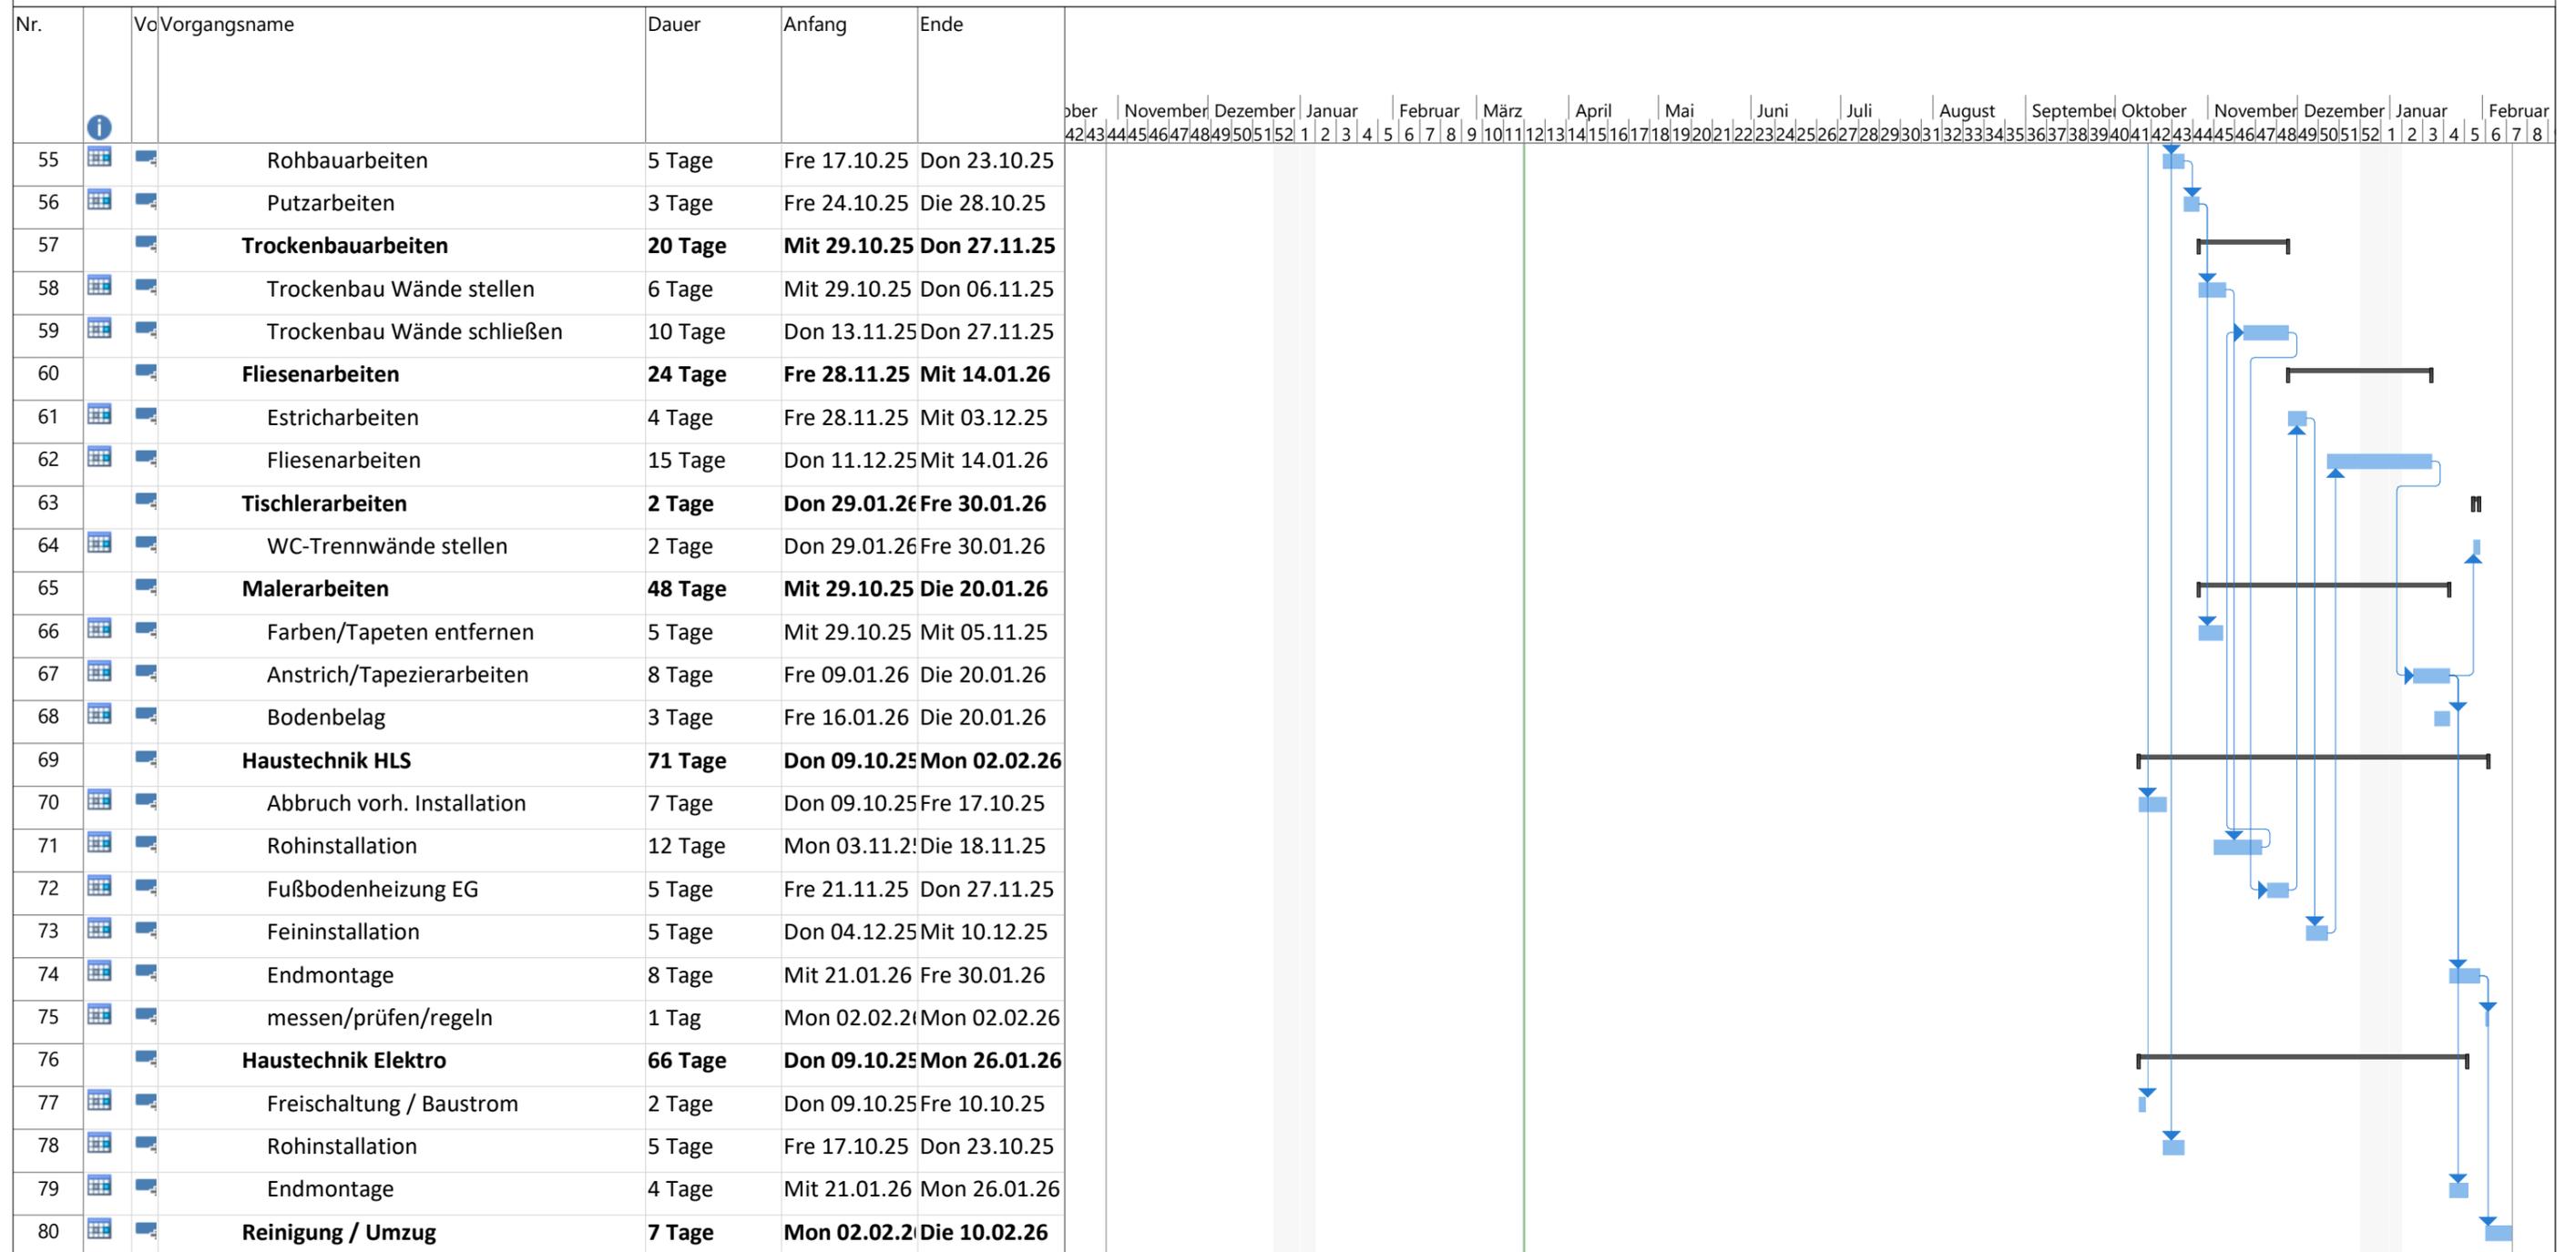

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------|--|
| Projekt: Kita Sonnenschein Sanierung von 4 WC-Anlagen Datum: Mon 17.03.25 | Vorgang | | Inaktiver Vorgang | | Manueller Sammelrollup | | Externer Meilenstein | |
| | Unterbrechung | | Inaktiver Meilenstein | | Manueller Sammelvorgang | | Stichtag | |
| | Meilenstein | | Inaktiver Sammelvorgang | | Nur Anfang | | In Arbeit | |
| | Sammelvorgang | | Manueller Vorgang | | Nur Ende | | Manueller Fortschritt | |
| | Projektsammelvorgang | | Nur Dauer | | Externe Vorgänge | | | |
