


Legende	
<b>ASB-P</b>	Asbest (VDI 3866-5 Anlage B)
<b>HBCD</b>	Hexabromcyclododecan (HBCD)
<b>LAGA/Dep</b>	Einstufung LAGA/ Dep V-Ergebnisse
<b>KI-Wert</b>	KI-Wert von Künstliche Mineralfasern (KMf)
<b>PAK-P</b>	Polycyclische arom. Kohlenwasserstoffe (PAK)
<b>X</b>	Probenahmeestelle Materialprobe

<b>ASB-P</b>	<b>PAK-P</b>	<b>HBCD</b>
23902443-001	P103426	23902443-004
Abdichtung	Abdichtung	Styropordämmung
negativ	2,16 mg/kg	3.400 mg/kg

<b>KI-Wert</b>	23902443-003
Dammauflager	KI 22,5

<b>KI-Wert</b>	23902443-002
Rohrisolierung	KI 31,4

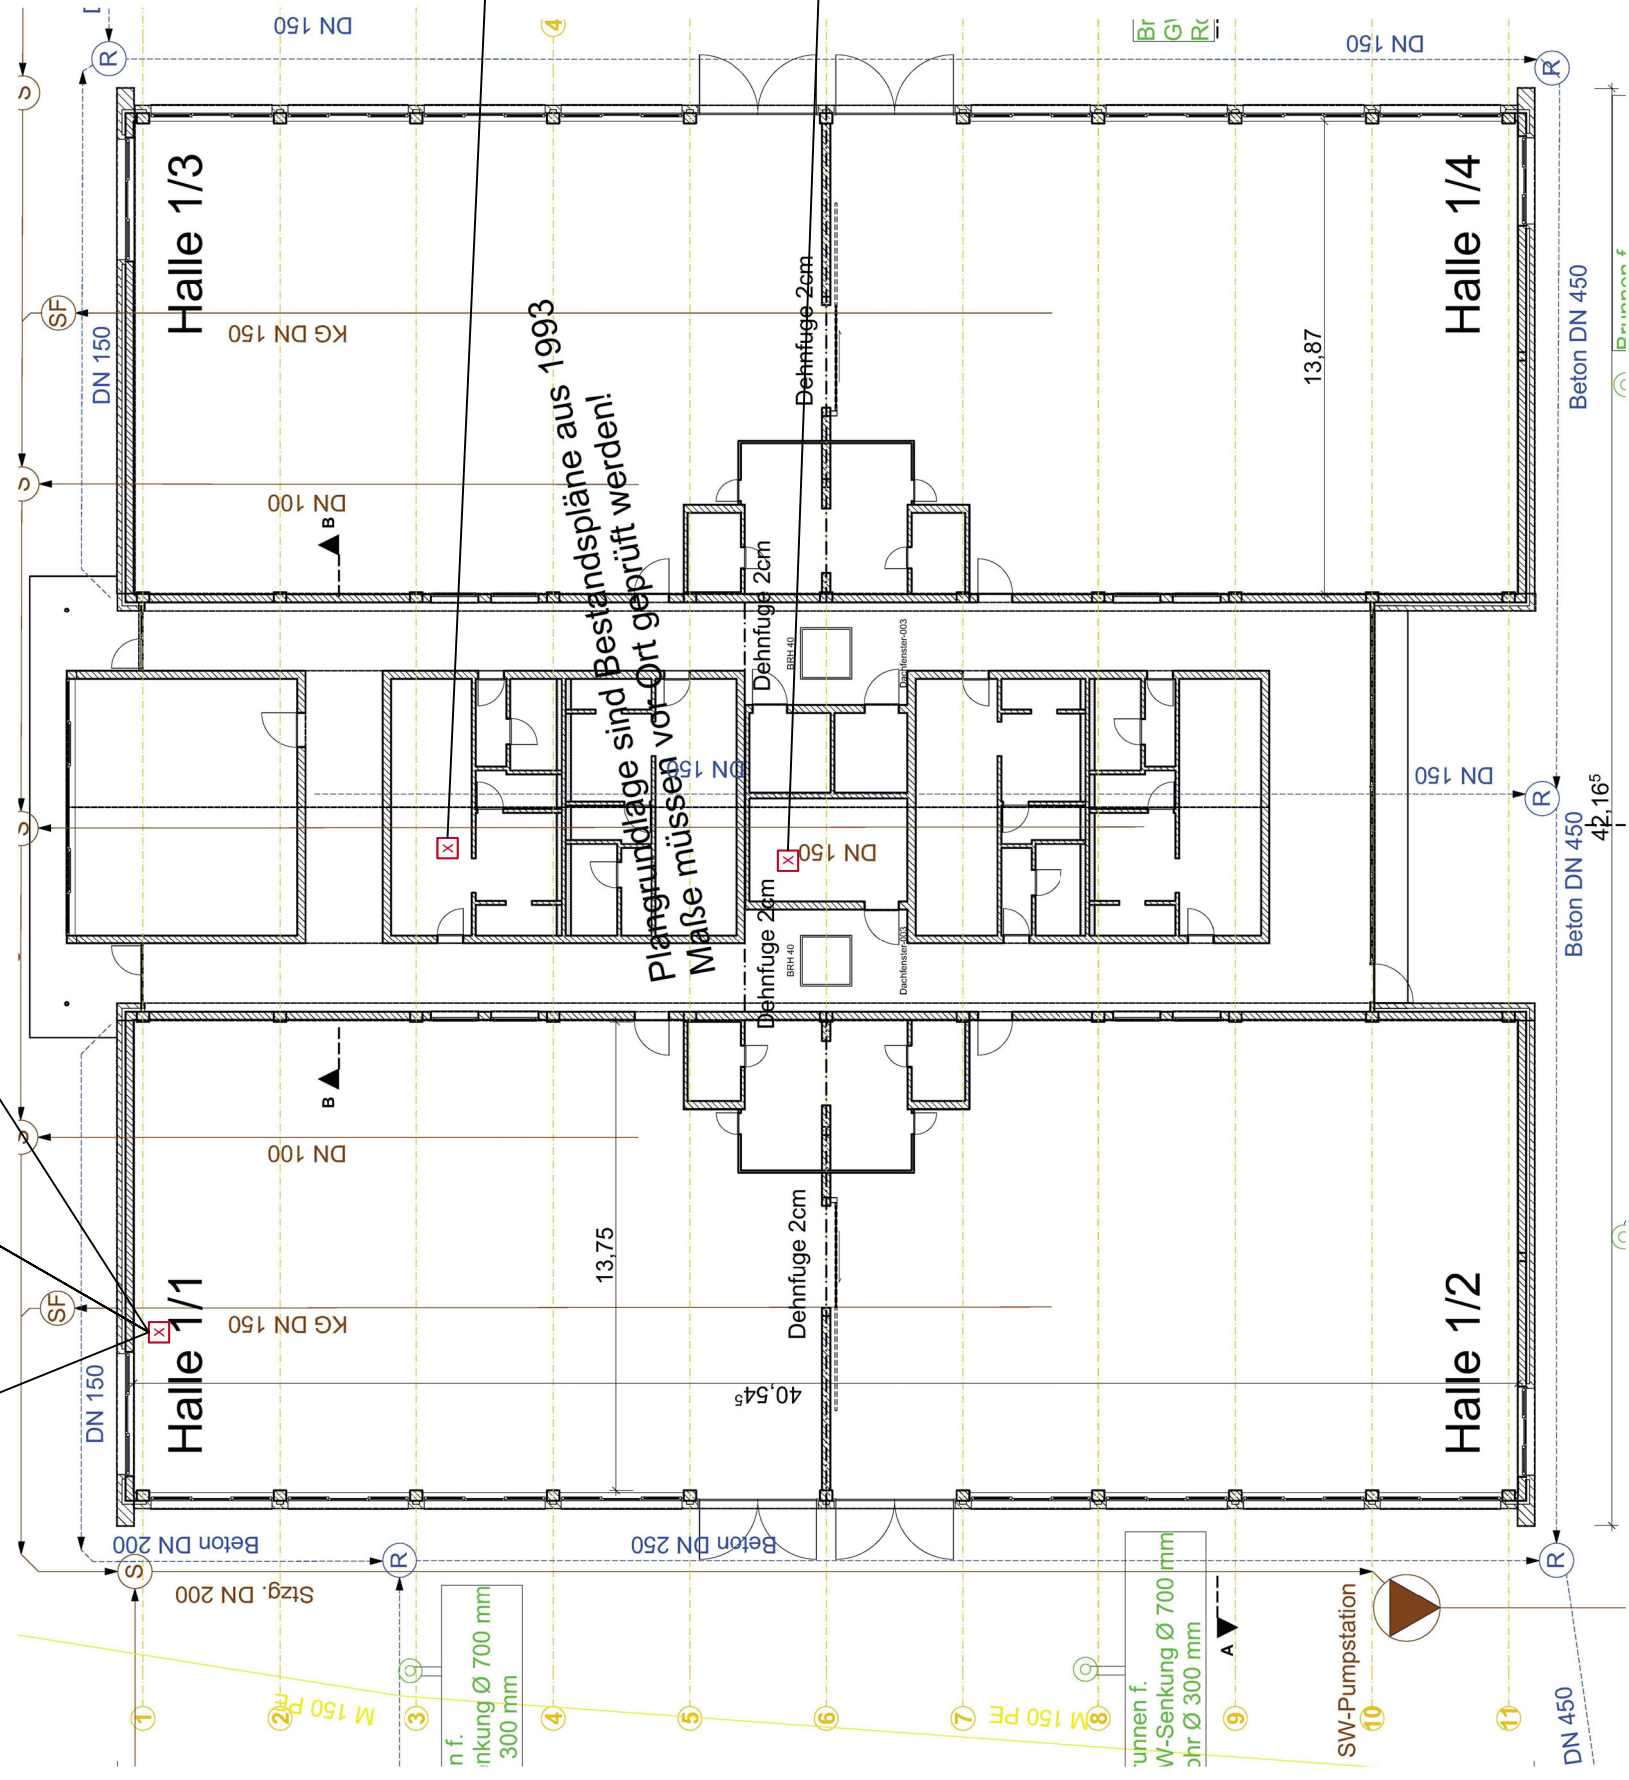

Bauschadstoffberatung  
 Andreas Glebner  
 Florian Geyer-Siedlung 7 d  
 06425 Aisleben  
 Tel.: 034692381969  
 Mail: info@bauschadstoffberatung.de

Beton DN 450  
 Brunn f

Probenahmepunkte Halle 1-1  
 Auftrag: Schadstoffuntersuchung  
 ÜAZ Halleben  
 Auftragsnummer:  
 Bau Bildung Sachsen-Anhalt e.V.  
 Südstraße 4  
 06179 Halleben  
 23-BSB-030  
 M -  
 Gez.: Andreas Glebner  
 Dat.: 17.04.2023  
 Anlage: 2
