



BAUGRUNDBÜRO  
DR.-ING. WEISENBURG

**Dynamischer Plattendruckversuch  
mit dem Leichten Fallgewichtsgerät  
nach TP BF-StB Teil B 8.3**

Bauvorhaben: Eisleben, BürgerRatHaus

Anlage: 6

Prüfart/-fläche: Sch 2/ - 0,6 m u OKS


Datum: 30.07.21

Bodenart: T, g\*, s, o'

Prüfer: We.

Prüfung: DP 1

Dynamischer Platten-  
druckversuch mit dem  
LEICHTEN FALLGERÄT nach  
TP BF-StB Teil B 8.3  
Prüfgerät: ZORN ZFG-02

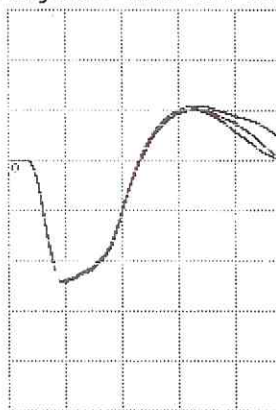

s: 0.5 mm/cm t: 10ms/cm

Fr 30.07.21 11:22:13  
Nr: 380

Nr.	v(mm/s)	s (mm)
1.	322.5	1.214
2.	334.1	1.223
3.	330.8	1.198
i.M.	329.1	1.211

s/v= 3.679 ms  
Evd= 18.6 MN/m<sup>2</sup>

Bemerkungen:

Witterung: trocken

Plattenunterlage: Sand

Sonst. Bemerkung:
