Nr.	Vorgangsn	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1		IK-H OP-Sanierung	598 Tage?	Fre 08.03.24	Don 03.09.26
2		Umstrukturierung Werkstatthof (Parken und Müllcontainer)	7 Tage	Fre 08.03.24	Mon 18.03.24
3		Umstrukturierung Parken mit Freimeldung durch AG	6 Tage	Fre 08.03.24	Fre 15.03.24
4		Umstrukturierung Müllcontainer (Positionen ändern)	4 Tage	Mit 13.03.24	Mon 18.03.24
5		Baustelle einrichten (Vorabmaßnahme und Hauptmaßnahme)	15 Tage	Mon 18.03.24	Die 09.04.24
6		Baustrasse, Bauzaun, Container, Gerüste, Kranstellung	15 Tage	Mon 18.03.24	Die 09.04.24
7		Lüftungsgerät Küche - I	71 Tage	Mon 15.04.24	Fre 26.07.24
8		Rückbau Raucherplatz	1 Tag	Mon 15.04.24	Mon 15.04.24
9		Aufnahme Pflaster Fläche 1	1 Tag	Die 16.04.24	Die 16.04.24
10		Staubschutz KG	1 Tag	Mit 17.04.24	Mit 17.04.24
11		KG Innengerüst Maßnahme Küche	1 Tag	Fre 19.04.24	Fre 19.04.24
12		Lüftungsschacht, Gerüst, Dämmung und Putz und TRH-Fassade	6 Tage	Mit 17.04.24	Don 25.04.24
13		KG, UEZ, DD	7 Tage	Fre 26.04.24	Die 07.05.24
14		Kanalführung mit Isolierung	4 Tage	Mit 08.05.24	Die 14.05.24
15		BS ?	3 Tage	Mit 15.05.24	Fre 17.05.24
16		Rückbau AW, Mauerwerk TRH inkl. Dämmung	3 Tage	Fre 19.04.24	Die 23.04.24
17		Lüftungsschacht, Gründung mit Erdarbeiten	5 Tage	Mit 24.04.24	Die 30.04.24
18		Lüftungsschacht, Gründung (Belastbarkeit)	28 Tage	Don 02.05.24	Mit 12.06.24
19		Lüftungsschacht, Gerüst	2 Tage	Don 13.06.24	Fre 14.06.24
20		Lüftungsschacht Mauerwerk, Ringbalken (Herstellung 90%)	15 Tage	Mon 17.06.24	Fre 05.07.24
21		Vorbereitung TGA-Fläche unterhalb aufgeständertem Baukörper	4 Tage	Mon 15.04.24	Fre 19.04.24
22		TRH, Fensterband Abbruch / Neu (späzter im Bauablauf einordnen	10 Tage	Mon 08.07.24	Fre 19.07.24
23		Lüftungsschacht Verfugung	2 Tage	Mon 22.07.24	Die 23.07.24
24		Rückbau Gerüst	1 Tag	Mit 24.07.24	Mit 24.07.24
25		Maßnahme TGA-Steigeschacht TRH - II (Hauptmaßnahme)	79 Tage	Mit 08.05.24	Mit 28.08.24
26		DD KG	2 Tage	Mit 24.04.24	Don 25.04.24
27		BE TRH	3 Tage	Fre 26.04.24	Die 30.04.24
28		WD Türen mit Abbruch Bestandstür	10 Tage	Don 02.05.24	Don 16.05.24
29		Demontage Kanäle	5 Tage	Fre 17.05.24	Fre 24.05.24
30		Einbau Gitterostebene	15 Tage	Mon 27.05.24	Fre 14.06.24
31		Putzarbeiten Türen, BS, 4-seitig	5 Tage	Mon 17.06.24	Fre 21.06.24
32		Schacht TGA-Installationen - VIII	25 Tage	Mon 24.06.24	Fre 26.07.24
33		Einbau Türen mit OTS	10 Tage	Mon 29.07.24	Fre 09.08.24
34		Putz- und Malerarbeiten TRH (ans Ende der Maßnahme schieben)	15 Tage	Mit 08.05.24	Don 30.05.24
35		Reinigung	1 Tag	Mit 08.05.24	Mit 08.05.24
36		BE und Staubschutz begleitend	14 Tage	Fre 19.04.24	Fre 10.05.24
37		Schacht - VIII (Hauptmaßnahme)	25 Tage	Mit 21.08.24	Die 24.09.24
38		Montage Heizungstrasse + Isolierung	6 Tage	Mit 21.08.24	Mit 28.08.24
39		Montage Kältetrasse + Isolierung	6 Tage	Don 29.08.24	Don 05.09.24
40		Montage Elektrotrasse	5 Tage	Fre 06.09.24	Don 12.09.24
41		Montage Sanitär + Isolierung	8 Tage	Fre 13.09.24	Die 24.09.24
42		Dach, Stahlbau oberhalb Bestandsbereich - III (Vorabmaßnahme)	37 Tage	Mon 18.03.24	Die 14.05.24
43		Rückbau Blitzschutz und Anzeichnen der DD	2 Tage	Mon 18.03.24	Die 19.03.24
44		Anzeichnen der DD	1 Tag	Die 19.03.24	Die 19.03.24
45		Dachdurchführungen herstellen (Durchbrüche)	10 Tage	Mit 20.03.24	Don 04.04.24
46		Fallpunkte ausloten	1 Tag	Fre 05.04.24	Fre 05.04.24
47		Dachdurchführungen Stahlbau mit Interimstahlbau im OG 4	11 Tage	Mon 08.04.24	Die 23.04.24
48		Dacharbeiten, anarbeiten an Durchführungen Stahlbau und Lüftung, Attika	7 Tage	Mit 24.04.24	Fre 03.05.24
49		Montage Stahltisch, Montage Geländer	7 Tage	Mon 06.05.24	Mit 15.05.24
50		Dach, Lüftungstechnik - IV (Hauptmaßnahme)	50 Tage	Die 21.05.24	Mon 29.07.24
51		Begleitender Stahlbau im OG 4	14 Tage	Die 21.05.24	Fre 07.06.24
52		AHD an DD anarbeiten	5 Tage	Mon 06.05.24	Mon 13.05.24
53		Anlieferung Lüftungsgeräte (Außengeräte), Stellung auf Dach	2 Tage	Mit 15.05.24	Don 16.05.24
54		Isolierung Kanal	2 Tage	Die 21.05.24	Mit 22.05.24
55		Montage Kanalsystem auf dem Dach	15 Tage	Don 23.05.24	Mit 12.06.24
56		Herstellung Isolierung + Blechmantel	15 Tage	Don 13.06.24	Mit 03.07.24
57		Verlegung Zuleitung E-Technik	5 Tage	Don 04.07.24	Mit 10.07.24
58		Verlegung Heizung + Kälte	10 Tage	Don 11.07.24	Mit 24.07.24
59		Restarbeiten Blitzschutz	3 Tage	Don 25.07.24	Mon 29.07.24
60		Aufbau Installation Technikebene OP - VII (Hauptmaßnahme)	18 Tage	Die 23.07.24	Don 15.08.24
61		Sammler/ Verteiler Kälte	10 Tage	Die 23.07.24	Mon 05.08.24
62		Sammler/ Verteiler Heizung	10 Tage	Die 23.07.24	Mon 05.08.24
63		Schaltschränke GLT	5 Tage	Die 23.07.24	Mon 29.07.24
64		Trassenbau Elektrotechnik	10 Tage	Die 30.07.24	Mon 12.08.24
65		BE und Staubschutz begleitend	20 Tage	Fre 19.07.24	Don 15.08.24
66		Demontage Lüftungszentrale, Umschluss Bettenreinigung - V (Hauptmaßnahme)	49 Tage	Die 23.07.24	Fre 27.09.24
67		OG 4, Rückbau Bettenreinigung	2 Tage	Don 25.07.24	Fre 26.07.24
68		OG 4, Rückbau Kanäle mit Abdeckelung	2 Tage	Mon 29.07.24	Die 30.07.24
69		OG 4, Rückbau Heizung	2 Tage	Mit 31.07.24	Don 01.08.24
70		OG 4, Rückbau Kälte	1 Tag	Mon 23.09.24	Mon 23.09.24
71		OG 4, Rückbau Elektrotechnik	2 Tage	Die 24.09.24	Mit 25.09.24
72		Be und Staubschutz begleitend	49 Tage	Die 23.07.24	Fre 27.09.24
73		Demontage Lüftungszentrale, Umschluss Röntgen - V (Hauptmaßnahme)	4 Tage	Don 26.09.24	Die 01.10.24
74		OG 4, Rückbau Gerät Röntgenabteilung	2 Tage	Don 26.09.24	Fre 27.09.24
75		OG 4, Rückbau Kanäle mit Abdeckelung	2 Tage	Mon 30.09.24	Die 01.10.24
76		OG 4, Rückbau Heizung	2 Tage	Mit 07.08.24	Don 08.08.24
77		OG 4, Rückbau Kälte	1 Tag	Mit 07.08.24	Mit 07.08.24
78		OG 4, Rückbau Elektrotechnik	2 Tage	Don 26.09.24	Fre 27.09.24
79		OG 4, BE und Staubschutz begleitend	5 Tage	Die 24.09.24	Mon 30.09.24
80		Demontage Lüftungszentrale, Rückbau Gerät Abluft Technik - V (Hauptmaßnahme)	6 Tage	Don 26.09.24	Mon 07.10.24
81		OG 4, Rückbau Geräte Abluft Technik	1 Tag	Mon 30.09.24	Mon 30.09.24
82		OG 4, Rückbau Kanäle	1 Tag	Die 01.10.24	Die 01.10.24
83		OG 4, Montage provisorischer Ablüfter (neu)	2 Tage	Mit 02.10.24	Fre 04.10.24
84		BE und Staubschutz begleitend	6 Tage	Don 26.09.24	Mon 07.10.24
85		Demontage Lüftungszentrale, Rückbau Kanäle Nebenräume - V (Hauptmaßnahme)	8 Tage	Mit 14.08.24	Fre 23.08.24
86		Teilrückbau, Kanäle Gerät Nebenräume alt	5 Tage	Fre 16.08.24	Don 22.08.24
87		BE und Staubschutz begleitend, Hochbau begleitend	8 Tage	Mit 14.08.24	Fre 23.08.24
88		Neubau Gerät OP 3, Umschluss Gerät OP 3 - VI	29 Tage	Fre 20.09.24	Mit 27.11.24
89		OP 3 geht ausser Betrieb	1 Tag	Fre 20.09.24	Fre 20.09.24
90		Kühlung geht ausser Betrieb	1 Tag	Mon 23.09.24	Mon 23.09.24
91		OG 4, Rückbau Lüftungsgerät alt	2 Tage	Fre 20.09.24	Mon 23.09.24
92		OG 4, Rückbau Beton - Fundament	1 Tag	Die 24.09.24	Die 24.09.24
93		Abbruchfläche spachtel + Anstrich	3 Tage	Mit 25.09.24	Fre 27.09.24
94		OG 4, Stahlbau als Gerätefundament für Gerät OP 3	2 Tage	Mon 30.09.24	Die 01.10.24
95		OG 4, Montage Lüftungsgerät	2 Tage	Mit 02.10.24	Mon 07.10.24
96		Og 4, Montage Kanäle + Isolierung	2 Tage	Die 08.10.24	Mon 21.10.24
97		OG 4, Anbindung Heizung/ Kälte/ Elektro als Provisorium	2 Tage	Mit 09.10.24	Die 22.10.24
98		OG 4, Umschluss Luftmessung	5 Tage	Mit 23.10.24	Die 05.11.24
99		OG 4, Abnahme Sachverständige, Messung	5 Tage	Mit 06.11.24	Die 12.11.24
100		OG 3, Inbetriebnahme OP 3	1 Tag	Die 12.11.24	Die 12.11.24
101		OG 4, Stahlbau, BE und Staubschutz begleitend, Stahlbau = Anpassungen	29 Tage	Fre 20.09.24	Mit 27.11.24
102		Neubau Gerät OP 3, Umschluss Nebenräume - VI (Hauptmaßnahme)	9 Tage	Mon 23.09.24	Don 10.10.24
103		OG 4, Rückbau Geräte Nebenräume	2 Tage	Die 24.09.24	Mit 25.09.24
104		OG 4, Rückbau Kanäle mit Abdeckelung	2 Tage	Don 26.09.24	Fre 27.09.24
105		OG 4, Rückbau Heizung	2 Tage	Mon 30.09.24	Die 01.10.24
106		OG 4, Rückbau Kälte	1 Tag	Mit 02.10.24	Mit 02.10.24
107		OG 4, Rückbau Elektrotechnik	2 Tage	Fre 04.10.24	Mon 07.10.24
108		OG 4, Stahlbau begleitend	8 Tage	Die 24.09.24	Die 08.10.24
109		BE und Staubschutz begleitend	9 Tage	Mon 23.09.24	Don 10.10.24
110		Neubau Gerät OP 3, TGA - Arbeiten Schnitttstelle - VI (Hauptmaßnahme)	7 Tage	Mit 25.09.24	Sam 12.10.24
111		Demontage zentrales Zu- und Abluftgerät + demontage Wärmerückgewinnung (OP 1) ohne WRG-Sommerbetrieb => zusätzliches Heizregister notwendig	6 Tage	Don 26.09.24	Fre 04.10.24
112		Herstellung (provisorische) Luftansaugung + Fortluft	2 Tage	Mon 07.10.24	Don 10.10.24
113		BE und Staubschutz begleitend	7 Tage	Mit 25.09.24	Fre 11.10.24
114		Anschluss Sozialcontainer an OP-Flur (Hauptmaßnahme)	10 Tage	Mit 06.11.24	Die 19.11.24
115		Staubschutz Folienwand (Hygienebedingungen)	1 Tag	Mit 06.11.24	Mit 06.11.24
116		Staubschutz Hygienewand (mit Tür?)	1 Tag	Don 07.11.24	Don 07.11.24
117		Ausserbetriebnahme Müllraum, Zugangstür staubdicht verschliessen	1 Tag	Don 07.11.24	Don 07.11.24
118		Erhöhung Lüftungsgefälle OP nach aussen	1 Tag	Don 07.11.24	Don 07.11.24
119		Ausbau Fenster mit Abbruch Brüstung (mit Abbruchkanten glätten allseitig)	5 Tage	Fre 08.11.24	Don 14.11.24
120		Baureinigung Baustellenbereich	1 Tag	Fre 15.11.24	Fre 15.11.24
121		Prov. Verschluss Druchbruch mit Hygienewand	2 Tage	Mon 18.11.24	Die 19.11.24
122		Hygienereinigung	1 Tag	Mon 18.11.24	Mon 18.11.24
123		Antragsstellungen Containerturm (mit Auftragsvergabe)	8 Tage	Mon 19.02.24	Don 29.02.24
124		Stellung Containerturm (mit BE einrichten)	2 Tage	Mon 07.10.24	Fre 18.10.24
125		Anschluss Medien an Container (mit Maßnahme OP 3), TGA, E-Zuleitung	5 Tage	Mit 23.10.24	Die 05.11.24
126		Zusammenschluss Sozialcontainer (Reinigung Container, mit Maßnahme OP 3)	5 Tage	Mit 23.10.24	Die 05.11.24
127		Rückbau Staubschutzwände (Hygienebedingungen, mit Maßnahme OP 3)	5 Tage	Mit 23.10.24	Die 05.11.24
128		OG 4, Aufbau Installation Technikebene OP - VII (Hauptmaßnahme)	8 Tage?	Fre 11.10.24	Fre 08.11.24
129		OG 4, Sammler/ Verteiler Kälte	2 Tage	Fre 11.10.24	Don 24.10.24
130		OG 4, Sammler/ Verteiler Heizung	8 Tage	Mon 28.10.24	Fre 08.11.24

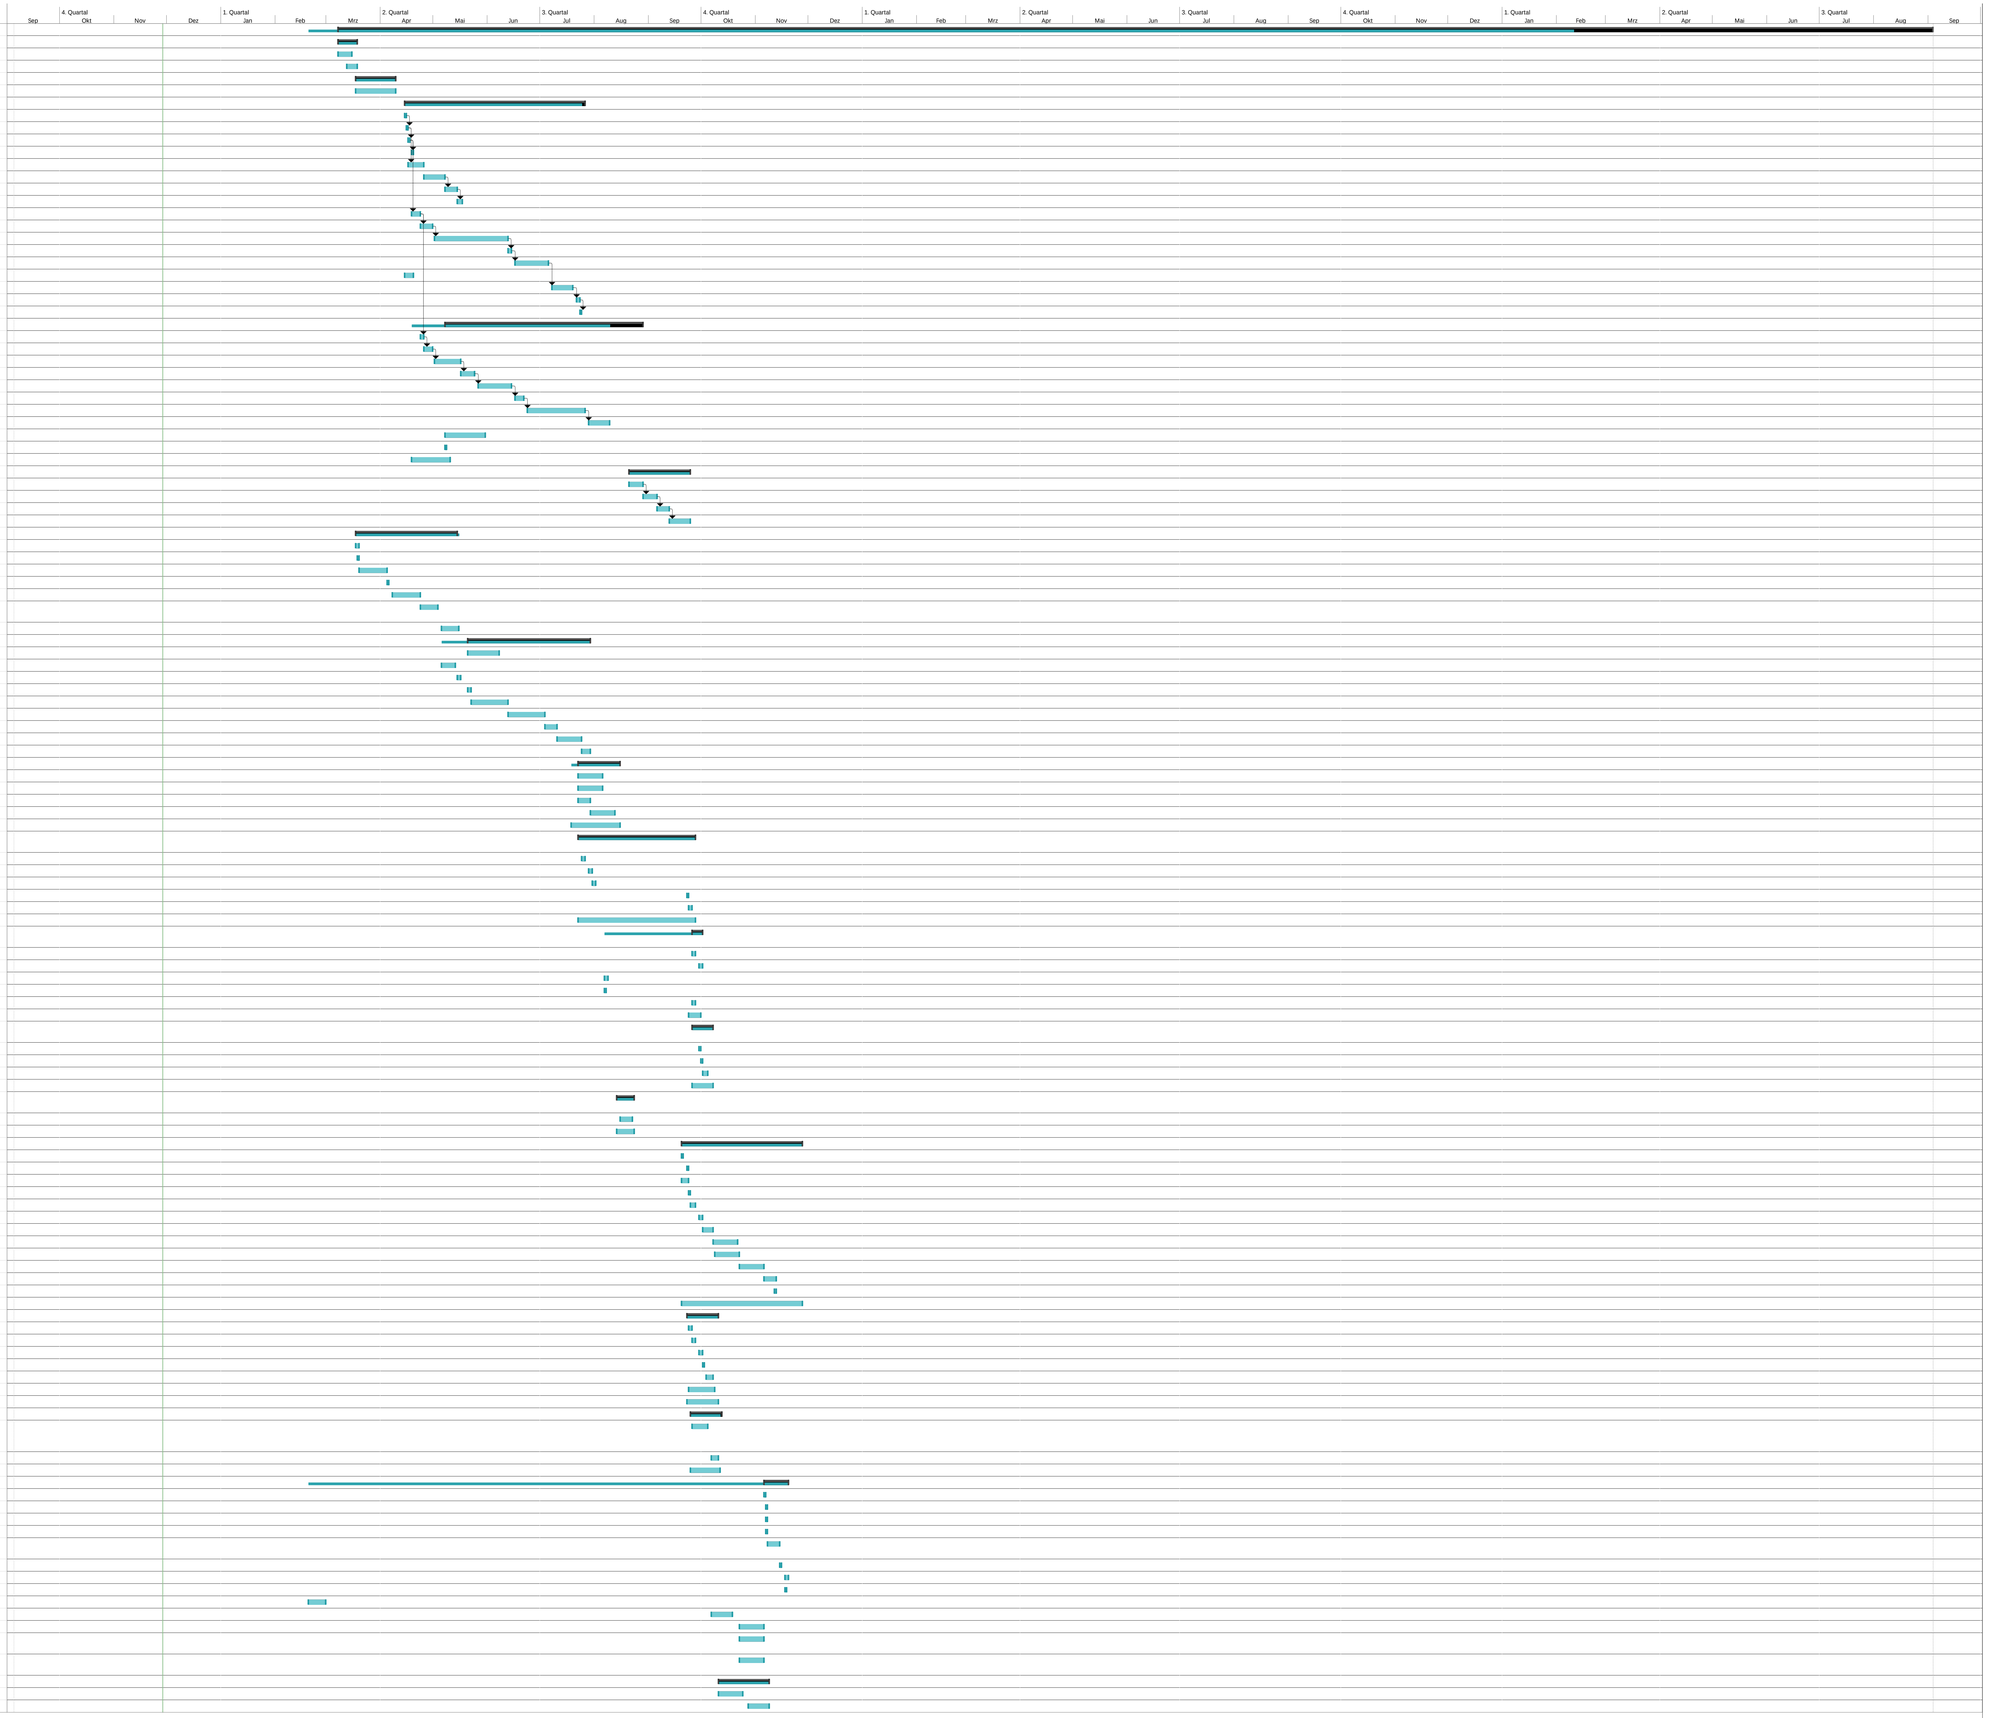

Projekt: Projekt1
Datum: Mit 29.11.23

Unterbrechung · Sammelvorgang · Inaktiver Vorgang · Inaktiver Sammelvorgang · Nur Dauer · Manueller Sammelvorgang · Nur Ende · Externer Meilenstein · In Arbeit
Meilenstein · Projektsammelvorgang · Inaktiver Meilenstein · Manueller Vorgang · Manueller Sammelrollup · Nur Anfang · Externe Vorgänge · Stichtag · Manueller Fortschritt

Nr.	Vorgangsn	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
131		OG 4, Schaltschränke GLT	3 Tage	Mon 28.10.24	Fre 01.11.24
132		OG 4, Trassenbau Elektrotechnik		Mon 28.10.24	
133		Anbau, Hochbau und TGA (Installation Technik) - IX (Anteil Vorabmaßnahme, Anteil Hauptmaßnahme)	286 Tage	Mon 15.04.24	Don 10.07.25
134		Stellung Fassadengerüst TRH - AW	4 Tage	Mon 15.04.24	Fre 19.04.24
135		TRH AW, Abbruch Brüstungen, WD für Türen mit BE, Qualitätsprüfung Wand Vorgang>	10 Tage	Mon 22.04.24	Mon 06.05.24
136		Rückbau Fassadengerüst	1 Tag	Die 07.05.24	Die 07.05.24
137		Aufnahme Pflaster	1 Tag	Mit 08.05.24	Mit 08.05.24
138		Erdarbeiten mit Verbau und Wasserhaltung	3 Tage	Fre 10.05.24	Die 14.05.24
139		Gründung als Einzelfundamente mit Stützen, Aushärtung	30 Tage	Mit 15.05.24	Mit 26.06.24
140		Teilverfüllung Baugrube	1 Tag	Don 27.06.24	Don 27.06.24
141		TGA - Verlegung Erdreich (Sanitär, Elektro)	15 Tage	Fre 28.06.24	Don 18.07.24
142		Entlüftungsrohre Raum Aufzugsschacht in Erdreich	1 Tag	Fre 19.07.24	Fre 19.07.24
143		Verfüllarbeiten Erde	1 Tag	Mon 22.07.24	Mon 22.07.24
144		Schotterfläche	1 Tag	Die 23.07.24	Die 23.07.24
145		Einmessung Gebäudeachsen Neubau	2 Tage	Mit 24.07.24	Don 25.07.24
146		Gründung/ Bodenplatte	30 Tage	Fre 26.07.24	Don 05.09.24
147		Stahlbauarbeiten Neubau mit Anschlußarbeiten an den Bestand, BS Stahlbau	40 Tage	Fre 26.07.24	Don 19.09.24
148		Geschossdecken und Dächer	50 Tage	Fre 26.07.24	Fre 04.10.24
149		Stahlbau, Brandschutz, Fassadenteil für TGA Kälteanlage	13 Tage	Mon 07.10.24	Fre 15.11.24
150		Einbringung Kälteanlage	1 Tag	Mon 18.11.24	Mon 18.11.24
151		Auftakt Fassade Hauptteil, Fassadenmontage parallel zu weiteren Arbeiten	65 Tage	Mon 18.11.24	Fre 28.02.25
152		Innenausbau, Phase 1	29 Tage	Mon 27.01.25	Don 06.03.25
153		Dämmung, FB, Estrich, Gitterrostboden, Stahlrahmen für Kälteanlage	39 Tage	Mon 27.01.25	Don 20.03.25
154		Zusammenschluss beide Geäudeteile, Hochbau und TGA	10 Tage	Fre 21.03.25	Don 03.04.25
155		Innenausbau, Phase 2	51 Tage	Fre 04.04.25	Don 19.06.25
156		Endmontagen, Restarbeiten, Reinigung und Abnahmen	15 Tage	Fre 20.06.25	Don 10.07.25
157		Dämmung unterseitig, AHD, Malerarbeiten	14 Tage	Mon 27.01.25	Don 13.02.25
158		Raumgerüst aussen	5 Tage	Fre 14.02.25	Don 20.02.25
159		Abnahmen und Rückbau Raumgerüst	5 Tage	Fre 21.02.25	Don 27.02.25
160		Kasematte und Freifläche	20 Tage	Fre 28.02.25	Don 27.03.25
161		TGA, Installation neue Technik im Anbau - IX (Hauptmaßnahme)	154 Tage	Fre 07.03.25	Mit 15.10.25
162		OG 4, OG 3, Montage Schaltschrank	5 Tage	Fre 07.03.25	Don 13.03.25
163		OG 4, OG 3, Installationen Trassen + Elektro	15 Tage	Mit 03.09.25	Die 23.09.25
164		OG 4, OG 3, Installation Lüftungstechnik	20 Tage	Mit 03.09.25	Die 30.09.25
165		OG 4, OG 3, Installation Heizungstechnik	10 Tage	Mit 03.09.25	Die 16.09.25
166		OG 3, OG 4, Installation Kälteanlage	30 Tage	Mit 03.09.25	Mit 15.10.25
167		Rückkühlgeräte im Aussenbereich (Hauptmaßnahme)	15 Tage	Mit 17.04.24	Fre 10.05.24
168		Anpassung Freifläche	2 Tage	Mit 17.04.24	Fre 19.04.24
169		Betonfundament Pufferspeicher	3 Tage	Don 18.04.24	Mon 22.04.24
170		Montage Pufferspeicher	1 Tag	Die 23.04.24	Die 23.04.24
171		Montage Rückkühlgeräte	1 Tag	Mit 24.04.24	Mit 24.04.24
172		Montage Kanäle Rückkühlgeräte	10 Tage	Don 25.04.24	Fre 10.05.24
173		Umbau TRH - X (Hauptmaßnahme)	34 Tage	Mon 05.08.24	Don 19.09.24
174		Hochbauarbeiten, WD, Wand, Putzarbeiten, Malerarbeiten begleitend	25 Tage	Mit 07.08.24	Die 10.09.24
175		Installation Hydrant	7 Tage	Mit 11.09.24	Don 19.09.24
176		Installation Elektro	5 Tage	Mit 04.09.24	Die 10.09.24
177		Installation Lüftungstechnik	5 Tage	Mit 04.09.24	Die 10.09.24
178		BE und Staubschutz begleitend, Reinigung	30 Tage	Mon 05.08.24	Fre 13.09.24
179		Umbau OP 1 mit Nebenräumen - XII, OP 1 ausser Betrieb (Hauptmaßnahme)	205 Tage	Die 26.11.24	Fre 26.09.25
180		OP 1 geht ausser Betrieb	1 Tag	Don 28.11.24	Don 28.11.24
181		OG 3, Räumung lose MT-Technik	1 Tag	Mit 27.11.24	Mit 27.11.24
182		OG 3, Staubschutzwand Typ 1 ("Folienwand")	1 Tag	Mit 27.11.24	Mit 27.11.24
183		OG 3, Staubschutzwand Typ 2 ("Hygienewand") OP 1	3 Tage	Don 28.11.24	Mon 02.12.24
184		OG 3, Zwischenreinigung, Rückbau Folienwand, Reinigung	1 Tag	Die 03.12.24	Die 03.12.24
185		OG 3, Erhöhung Luftströmung aus OP 1 , Medien freischalten	1 Tag	Mit 04.12.24	Mit 04.12.24
186		OG 3, Baustellenzugang über Fenster	1 Tag	Fre 06.12.24	Fre 06.12.24
187		OG 3, Rückbau Wände und Abhangdecken, sämtliche Bekleidungen und FB, inkl. UK, Rückbau Bodenbeläge	7 Tage	Die 10.12.24	Mit 18.12.24
188		OG 3, Rückbau Schacht Achse d/ 1, Anpassung Schachtgröße, Anpassung DD	7 Tage	Mon 24.02.25	Die 04.03.25
189		OG 3, Maßnahme Fensteröffnung schliessen kleine FE	5 Tage	Don 06.03.25	Mit 12.03.25
190		OG3, Estricharbeiten (... Schliessung OP 2 ...)	5 Tage	Mon 17.03.25	Fre 21.03.25
191		OG 2, Bauarbeiten in der Radiologie	1 Tag	Die 26.11.24	Die 26.11.24
192		BS DD (Maßnahme Radiologie)	7 Tage	Mon 24.03.25	Die 01.04.25
193		OG 4, Demontage Geräte (XII)	4 Tage	Don 10.04.25	Die 15.04.25
194		OG 4, Demontage Kanäle	4 Tage	Don 10.04.25	Die 15.04.25
195		OG 4, Verschliessen Kanäle	2 Tage	Mit 16.04.25	Don 17.04.25
196		OG3/ OG 4, Rückbau Heizung/ Kälte/ Elektro (... Schliessung OP 2 ...)	8 Tage	Mon 28.04.25	Don 08.05.25
197		Herausstemmen der BS-Klappen (+Röntgen)	10 Tage	Mon 28.04.25	Mon 12.05.25
198		OG 4/ OG 3, DD verschliessen (.... Anbau bereit für TGA - Inst. .....)	5 Tage	Die 13.05.25	Mon 19.05.25
199		OG 3/ OG 4, DD herstellen	10 Tage	Fre 23.05.25	Fre 06.06.25
200		OG 3/ OG 4, Neubau BS-Klappen	5 Tage	Die 10.06.25	Mon 16.06.25
201		OG 4, Montage Stahlträger	2 Tage	Die 17.06.25	Mit 18.06.25
202		OG 4, Montage OP-Gerät neu	7 Tage	Don 19.06.25	Fre 27.06.25
203		OG 4, Montage Kanäle Technik	15 Tage	Don 19.06.25	Mit 09.07.25
204		OG 3, Herstellung grosses Fenster	20 Tage	Die 07.01.25	Sam 01.02.25
205		OG 3, Fenster 1 neu	2 Tage	Don 13.03.25	Fre 14.03.25
206		OG 3, Ausbau Phase 1 mit WD Türen	50 Tage	Mon 21.07.25	Fre 26.09.25
207		OG 3, Montage Kanäle OP-Bereich (Anbau für TGA bezugsfertig1)	11 Tage	Mon 27.01.25	Mon 10.02.25
208		OG 3 und OG 4 Installation Kälte/ Heizung/ Sanitär/ GLT/ Strom	15 Tage	Die 11.02.25	Mon 03.03.25
209		OG 3, Installation Medizintechnik	10 Tage	Die 04.03.25	Mon 17.03.25
210		OG 3 Montage Lüftungstechnik	4 Tage	Die 18.03.25	Fre 21.03.25
211		OG 3, TGA-Medien über OG1	1 Tag	Die 26.11.24	Die 26.11.24
212		OG 3, Ausbau Phase 2	31 Tage	Mon 24.03.25	Mit 07.05.25
213		OG 3, Glas OP	10 Tage	Don 08.05.25	Mit 21.05.25
214		OG 3, Endmontagen, Restarbeiten, Reinigung und Abnahmen	15 Tage	Don 22.05.25	Fre 13.06.25
215		OG 3, TGA Inbetriebnahme + Messungen	10 Tage	Mon 16.06.25	Fre 27.06.25
216		OG 3, Medizintechnik Inbetriebnahme	10 Tage	Mon 30.06.25	Fre 11.07.25
217		Umbaumaßnahme OP-Flur, Umschlüsse Technik (Hauptmaßnahme)	71 Tage	Die 11.02.25	Don 22.05.25
218		Staubschutz	3 Tage	Die 11.02.25	Don 13.02.25
219		Bearbeitung Flurwände	20 Tage	Die 11.02.25	Mon 10.03.25
220		Rückbau AHD	5 Tage	Fre 14.02.25	Don 20.02.25
221		OP-Flur, Anpassarbeiten Wände	10 Tage	Fre 21.02.25	Don 06.03.25
222		OP-Flur - Türen	14 Tage	Fre 07.03.25	Mit 26.03.25
223		Umbau OP-Flur	10 Tage	Don 27.03.25	Mit 09.04.25
224		AHD neu inkl. Malerarbeiten	16 Tage	Don 10.04.25	Mon 05.05.25
225		Ausbauarbeiten (Maler, Boden, ...)	10 Tage	Die 06.05.25	Mon 19.05.25
226		Umbau OP 2 (Hauptmaßnahme)	94 Tage?	Don 07.08.25	Mit 17.12.25
227		OG 3, Räumung lose MT-Technik	1 Tag	Sam 01.02.25	Sam 01.02.25
228		OG 3, Staubschutzwand Typ 1 ("Folienwand")	1 Tag	Mon 03.02.25	Mon 03.02.25
229		OG 3, Staubschutzwand Typ 2 ("Hygienewand") OP 1	2 Tage	Die 04.02.25	Mit 05.02.25
230		OG 3, Zwischenreinigung, Rückbau Folienwand, Reinigung	1 Tag	Don 06.02.25	Don 06.02.25
231		OG 3, Freischaltung Medien, Erhöhung Luftströmung aus OP 2	1 Tag	Fre 07.02.25	Fre 07.02.25
232		OG 3, Baustellenzugang über Fenster	1 Tag	Mon 10.02.25	Mon 10.02.25
233		OG 3, Baustellenzugang über Fenster	1 Tag	Die 11.02.25	Die 11.02.25
234		OG 3, Rückbau Bodenbeläge	2 Tage	Mit 12.02.25	Don 13.02.25
235		OG 3, Rückbau Schächte, Anpassung DD, BS-Klappen, Anpassung Schächte	15 Tage	Fre 14.02.25	Don 06.03.25
236		OG 3, Rückbau Wände und Abhangdecken, sämtliche Bekleidung und FB, inkl. UK	10 Tage	Fre 07.03.25	Don 20.03.25
237		OG 3, Herstellung grosses Fenster	20 Tage	Fre 21.03.25	Don 17.04.25
238		OG 3, BE-Zugang Anpassung	1 Tag	Die 22.04.25	Die 22.04.25
239		OG 3, Fensteröffnung ausmauern + anputzen	5 Tage	Mit 23.04.25	Die 29.04.25
240		OG 3, Fenster 1 neu	2 Tage	Mit 30.04.25	Fre 02.05.25
241		OG3, Estricharbeiten	5 Tage	Mon 05.05.25	Fre 09.05.25
242		BS DD	3 Tage	Sam 01.02.25	Die 04.02.25
243		OG 4, Demontage Geräte (OG4)	4 Tage	Fre 21.03.25	Mit 26.03.25
244		OG 4, Demontage Kanäle	4 Tage	Don 27.03.25	Die 01.04.25
245		OG 4, Veschliessen Kanäle	2 Tage	Mit 02.04.25	Don 03.04.25
246		OG 3/ OG 4, Rückbau Heizung/ Kälte/ Elektro	8 Tage	Fre 04.04.25	Die 15.04.25
247		Herausstemmen der BS-Klappen (+Röntgen)	6 Tage	Mit 16.04.25	Don 24.04.25
248		OG 4/ OG 3, DD verschliessen	5 Tage	Fre 25.04.25	Fre 02.05.25
249		OG 3/ OG 4, DD herstellen	5 Tage	Mon 05.05.25	Fre 09.05.25
250		OG 3/ OG 4, Neubau BS-Klappen	2 Tage	Mon 12.05.25	Die 13.05.25
251		OG 4, Montage Stahlträger	5 Tage	Mit 14.05.25	Die 20.05.25
252		OG 4, Montage OP-Gerät neu	7 Tage	Mit 21.05.25	Fre 30.05.25
253		OG 4, Montage Kanäle Technik	15 Tage	Mon 02.06.25	Mon 23.06.25
254		OG 3, Ausbau Phase 1 mit WD Türen	30 Tage	Die 24.06.25	Mon 04.08.25
255		OG 3, Montage Kanäle OP-Bereich	12 Tage	Die 05.08.25	Mit 20.08.25
256		OG 3 und OG 4 Installation Kälte/ Heizung/ Sanitär/ GLT/ Strom	15 Tage	Don 21.08.25	Mit 10.09.25
257		OG 3, Installation Medizintechnik	5 Tage	Don 11.09.25	Mit 17.09.25
258		OG 3 Montage Lüftungstechnik	4 Tage	Don 18.09.25	Die 23.09.25
259		OG 3, Ausbau Phase 2	30 Tage	Mit 24.09.25	Mit 05.11.25
260		OG 3, Glas OP	10 Tage	Don 06.11.25	Mit 19.11.25
261		OG 3, Bodenbelag	5 Tage	Don 20.11.25	Mit 26.11.25

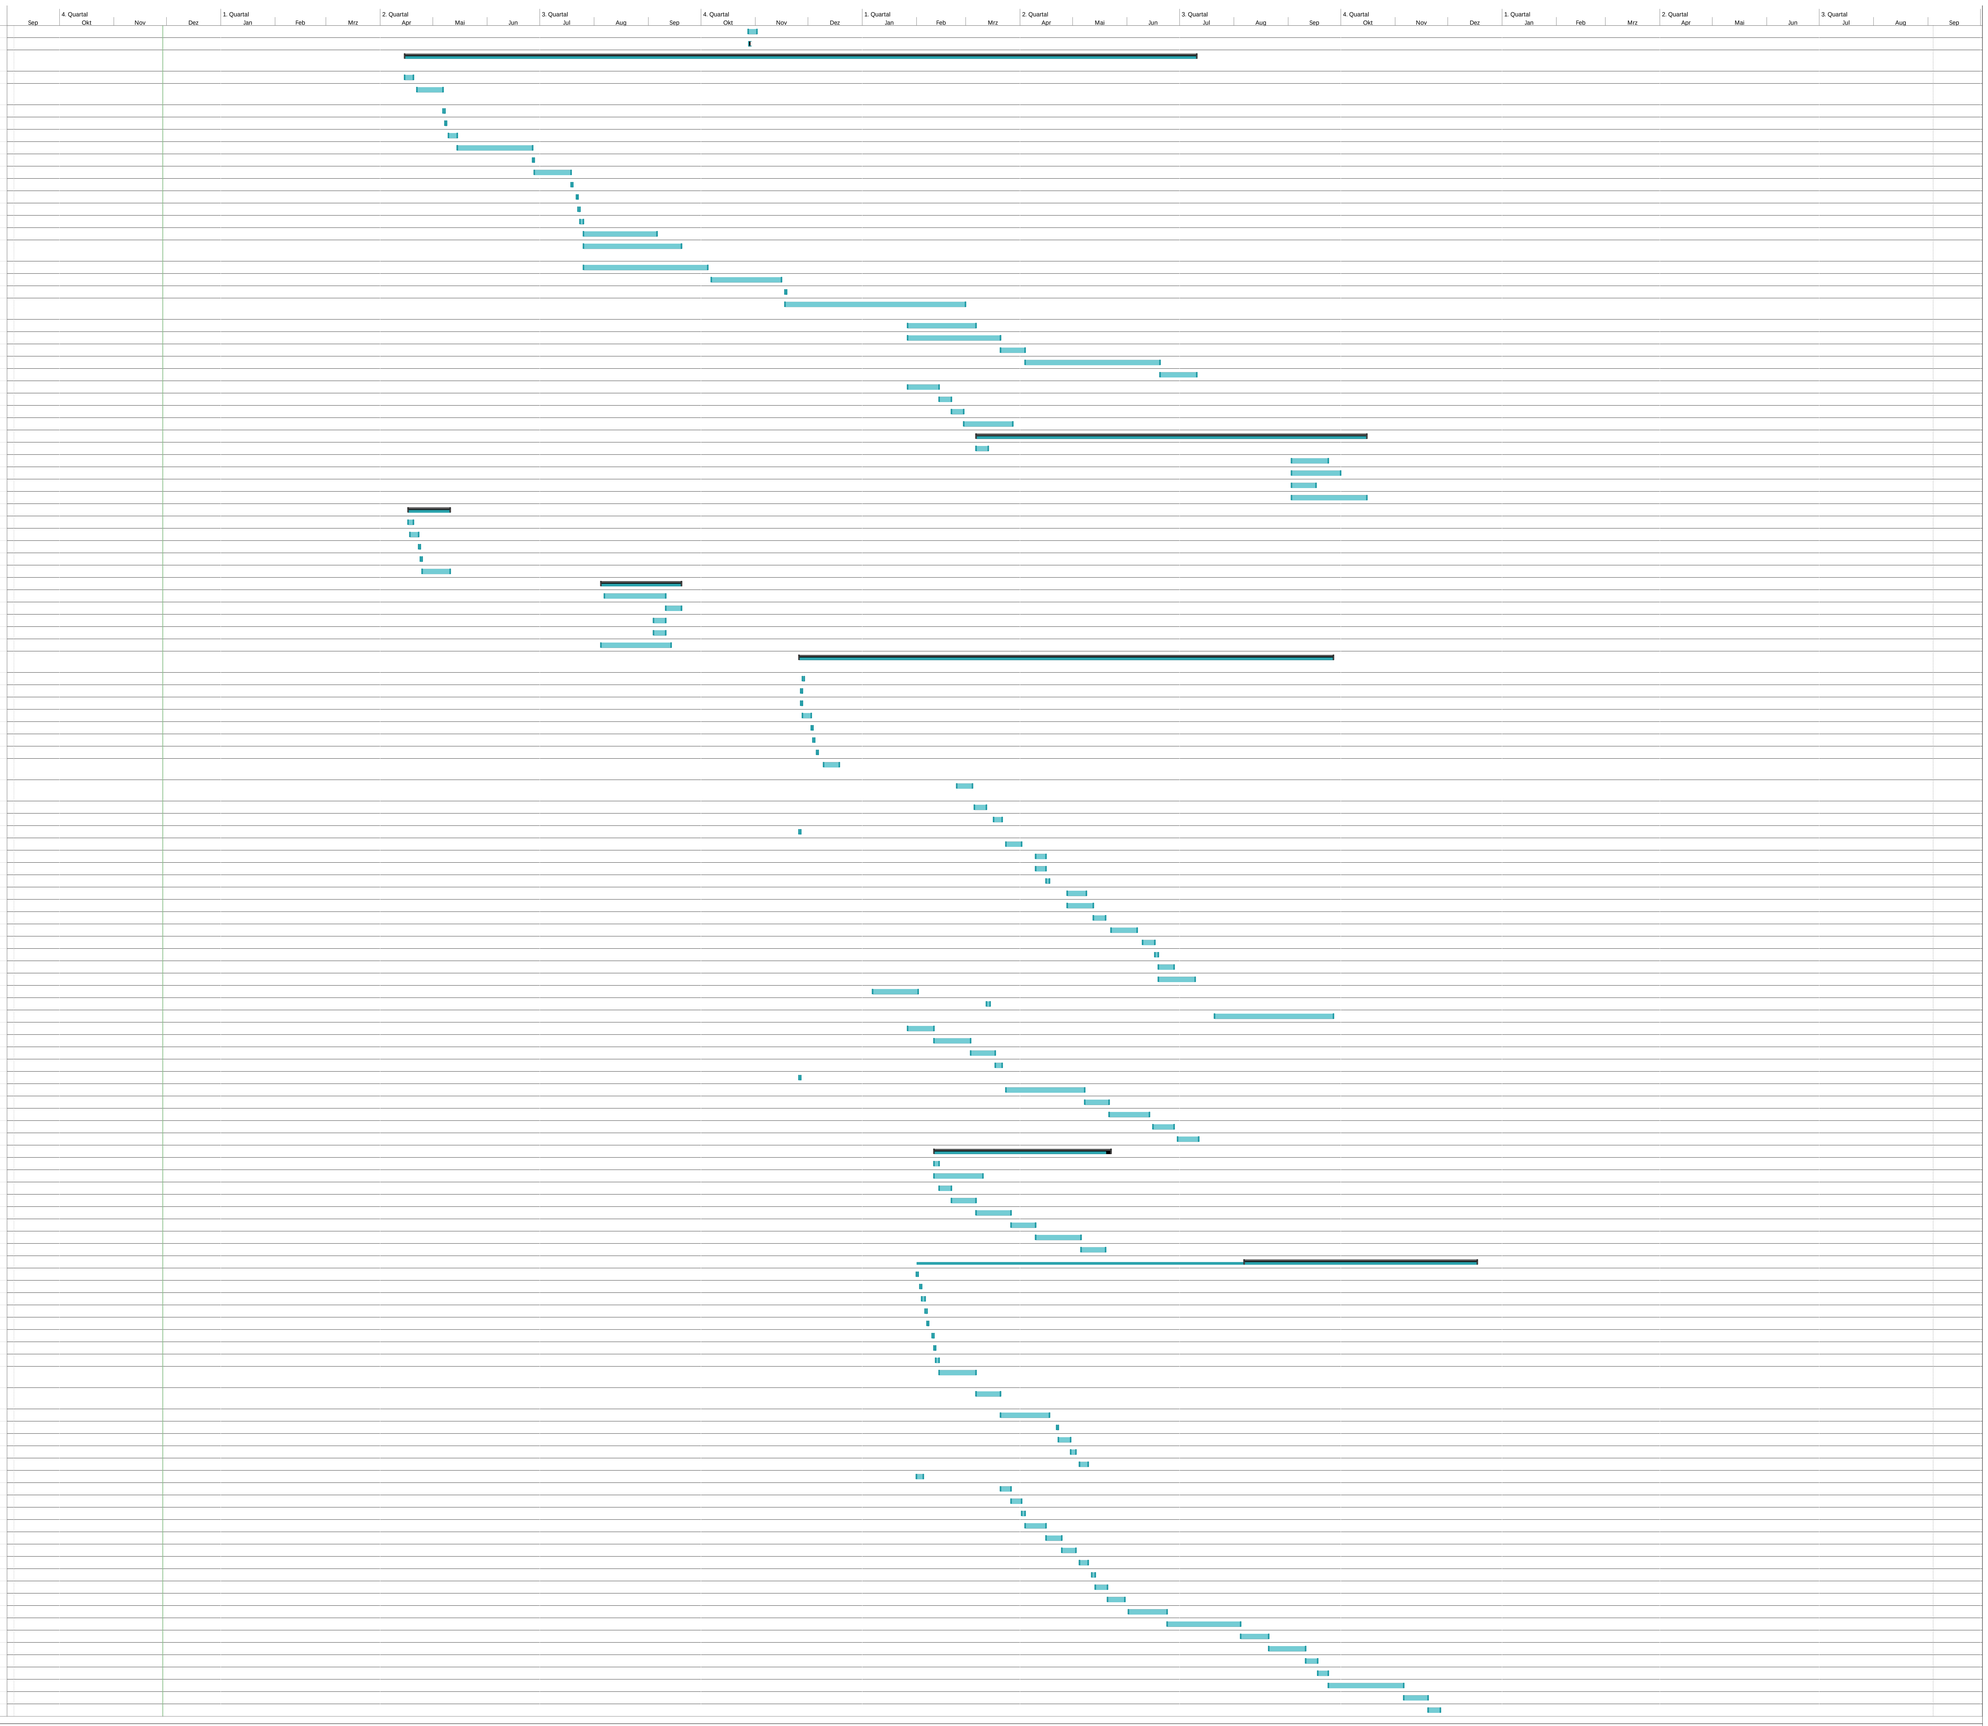

Projekt: Projekt1
Datum: Mit 29.11.23

Unterbrechung | Sammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Sammelvorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Nur Ende | Externer Meilenstein | In Arbeit
Meilenstein | Projektsammelvorgang | Inaktiver Meilenstein | Manueller Vorgang | Manueller Sammelvollup | Nur Anfang | Externe Vorgänge | Stichtag | Manueller Fortschritt

Nr.	Vorgangsn	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
262		OG 3, Endmontagen, Restarbeiten, Reinigung und Abnahmen	5 Tage	Don 27.11.25	Mit 03.12.25
263		OG 3, TGA Inbetriebnahme + Messungen	10 Tage	Don 04.12.25	Mit 17.12.25
264		OG 3, Medizintechnik Inbetriebnahme	10 Tage	Don 04.12.25	Mit 17.12.25
265		Umbau NSHV - XVII	25 Tage?	Die 01.10.24	Sam 30.11.24
268		Aufbau Notstromaggregat - XVIII	65 Tage	Die 01.07.25	Mon 29.09.25
271		Rückbau Provisorien in Technikzentrale - XIX, Restarbeiten Freifläche	23 Tage	Don 18.12.25	Sam 31.01.26
272		Rückbau Provisorien in der Technikzentrale mit Herstellung GLT und Restarbeiten	29 Tage	Don 18.12.25	Die 10.02.26
273		Restarbeiten und Abnahmen, Bauarbeiten ARGE fertig, Restarbeiten Freifläche ggf. offen, Reste Baustelleineinrichtung auflösen, Reste Umstrukturierung Parkplatz	56 Tage	Mon 03.11.25	Sam 31.01.26



Projekt: Projekt1
Datum: Mit 29.11.23

Unterbrechung · Sammelvorgang · Inaktiver Vorgang · Inaktiver Sammelvorgang · Nur Dauer · Manueller Sammelvorgang · Nur Ende · Externer Meilenstein · In Arbeit
Meilenstein · Projektsammelvorgang · Inaktiver Meilenstein · Manueller Vorgang · Manueller Sammelrollup · Nur Anfang · Externe Vorgänge · Stichtag · Manueller Fortschritt
