Baumanagement der Maßnahme - Rahmenzeitplan - GUT-DRAUF-KOMPLEX KIEZ Querxenland Seifhennersdorf
Stand: 09.07.2024

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1				
2	**Fördermittelzusage**	**1 Tag**	**Mon 03.06.24**	**Mon 03.06.24**
3	Beauftragung LPH 5-8	1 Tag?	Mon 03.06.24	Mon 03.06.24
4				
5	B-Plan 2. Auslegung	26 Tage	Mon 26.02.24	Mon 01.04.24
6	B-Plan (rechtskräftig)	17 Tage	Don 07.11.24	Fre 29.11.24
7	<Neuer Vorgang>			
8				
9	Genehmigungsplanung	47 Tage	Don 22.02.24	Fre 26.04.24
10	Baugenehmigung	1 Tag	Fre 30.08.24	Fre 30.08.24
11				
12	**Tiefbau-/ Haustechnikplanung für Medienumverlegung**	**1970 Tage**	**Die 28.03.17**	**Mon 14.10.24**
13	Vorortermin mit Medienträger	5 Tage	Die 28.03.17	Mon 03.04.17
14	Ausführungsplanung Tiefbau / Haustechnik	20 Tage	Mon 06.05.24	Fre 31.05.24
15	Ausschreibung Tiefbauleistungen Medienumverlegung	20 Tage	Mon 03.06.24	Fre 28.06.24
16	Angebotseinholung	20 Tage	Mon 01.07.24	Fre 26.07.24
17	Submission	1 Tag	Mon 29.07.24	Mon 29.07.24
18	Vergabe	5 Tage	Die 30.07.24	Mon 05.08.24
19	Vergabe Tiefbauleistungen Medienumverlegung	20 Tage	Die 06.08.24	Mon 02.09.24
20	Baubeginn Tiefbauleistungen Medienumverlegung	1 Tag	Die 03.09.24	Die 03.09.24
21	Ausführung Medienumverlegung	25 Tage	Mon 09.09.24	Fre 11.10.24
22	Ausführung Medienumverlegung abgeschlossen	1 Tag	Mon 14.10.24	Mon 14.10.24
23				
24	**Hochbauplanung bis Vergabe Bauhauptleistung**	**345 Tage**	**Die 04.06.24**	**Mon 13.10.25**
25	Ausführungsplanung Hochbau	80 Tage	Die 04.06.24	Mon 23.09.24
26	Ausschreibung Bauhauptleistung	20 Tage	Fre 26.07.24	Don 22.08.24
27	Angebotseinholung	10 Tage	Fre 23.08.24	Don 05.09.24
28	Submission	5 Tage	Fre 06.09.24	Don 12.09.24
29	Vergabe	1 Tag	Fre 13.09.24	Fre 13.09.24
30	Baubeginn	1 Tag	Mon 07.10.24	Mon 07.10.24
31				
32	**Haustechnikplanung HSL und ELT**	**345 Tage**	**Die 04.06.24**	**Mon 13.10.25**
33	Ausführungsplanung Haustechnik	90 Tage	Die 04.06.24	Mon 07.10.24
34	Ausschreibung Haustechnikgewerke	55 Tage	Mon 02.12.24	Fre 28.02.25
35	Angebotseinholung (siehe auch ab Zeile 50)	60 Tage	Mon 03.03.25	Fre 23.05.25
36	Submission	5 Tage	Mon 26.05.25	Fre 30.05.25
37	Vergabe	10 Tage	Mon 02.06.25	Fre 13.06.25
38	Baubeginn der Insatlationsgewerke	1 Tag	Mon 13.10.25	Mon 13.10.25
39				
40	**Ausschreibung und Vergabe**	**365 Tage?**	**Fre 12.07.24**	**Don 18.12.25**
41	Baustelleneinrichtung (Baustrom, Bauwasser, Kräne)	40 Tage	Fre 12.07.24	Don 05.09.24
42	Trafostation & Erschleißung	60 Tage	Fre 16.08.24	Don 07.11.24
43	Dachdecker & Klempnerarbeiten	60 Tage	Fre 31.01.25	Don 24.04.25
44	Außenfenster und Außentüren	60 Tage	Fre 31.01.25	Don 24.04.25
45	Fassadenarbeiten (WDVS)	60 Tage	Fre 31.01.25	Don 24.04.25
46	Abdichtungsarbeiten	60 Tage	Fre 31.01.25	Don 24.04.25
47	Trockenbauarbeiten	60 Tage	Fre 28.02.25	Don 22.05.25
48	Innentüren	60 Tage	Fre 28.02.25	Don 22.05.25
49	Estricharbeiten	60 Tage	Fre 28.02.25	Don 22.05.25
50	**HSL**	**60 Tage**	**Fre 28.02.25**	**Don 22.05.25**
51	Sanitärinstallation	60 Tage	Fre 28.02.25	Don 22.05.25
52	Heizungsinstallation	60 Tage	Fre 28.02.25	Don 22.05.25
53	Lüftungsinstallation	60 Tage	Fre 28.02.25	Don 22.05.25
54	**Elektroinstallation**	**60 Tage**	**Fre 28.02.25**	**Don 22.05.25**
55	Starkstromanlagen	60 Tage	Fre 28.02.25	Don 22.05.25
56	Informationstechnische Anlagen	60 Tage	Fre 28.02.25	Don 22.05.25
57	Beleuchtung	60 Tage	Fre 28.02.25	Don 22.05.25
58	Photovoltaikanlage	60 Tage	Fre 28.02.25	Don 22.05.25
59	Innenputzarbeiten	60 Tage	Fre 28.02.25	Don 22.05.25
60	Küchentechnik	30 Tage	Fre 04.07.25	Don 14.08.25
61	Bodenbelagsarbeiten	60 Tage	Fre 04.07.25	Don 25.09.25
62	Sportboden	60 Tage	Fre 04.07.25	Don 25.09.25
63	Prallwand	60 Tage	Fre 04.07.25	Don 25.09.25
64	Akustikelemente	60 Tage	Fre 04.07.25	Don 25.09.25
65	Mobile Trennwände	60 Tage	Fre 04.07.25	Don 25.09.25
66	Fliesenverlegearbeiten	60 Tage	Fre 04.07.25	Don 25.09.25
67	Möblierung	60 Tage	Fre 26.09.25	Don 18.12.25
68	Malerarbeiten	60 Tage	Fre 26.09.25	Don 18.12.25
69				
70	**Tiefbauleistungen / Bodenplatte 1. und 2. BA**	**191 Tage?**	**Mon 23.09.24**	**Mon 30.06.25**
71				
72	**Tiefbauleistungen / Bodenplatte**	**140 Tage**	**Mon 07.10.24**	**Fre 02.05.25**
73	Baustelleneinrichtung herstellen	5 Tage	Mon 07.10.24	Fre 11.10.24
74	Baufreimachung	5 Tage	Mon 07.10.24	Fre 11.10.24
75	Verbau der Baugrube herstellen	5 Tage	Mon 14.10.24	Fre 18.10.24
76	Erdaushub	35 Tage	Mon 21.10.24	Fre 06.12.24
77	Drainage herstellen	15 Tage	Mon 18.11.24	Fre 06.12.24
78	Mineralgemisch 30 cm Einbau	10 Tage	Mon 25.11.24	Fre 06.12.24
79	Mineralgemisch 1,20 cm Einbau	15 Tage	Mon 25.11.24	Fre 13.12.24
80	Stützenfundamente Halle herstellen	15 Tage	Mon 02.12.24	Fre 20.12.24
81	Weihnachtsruhe	11 Tage	Mon 23.12.24	Fre 17.01.25
82	witterungsbedingte Bauruhe ggf.	35 Tage	Mon 20.01.25	Fre 07.03.25
83	Grundleitungsbau Teil 2	10 Tage	Mon 10.03.25	Fre 21.03.25
84	Bodenplatten herstellen	30 Tage	Mon 24.03.25	Fre 02.05.25
85	Trafostation herstellen	30 Tage	Mon 10.03.25	Fre 18.04.25
86				
87	**Rohbau / Dach / Fassade 1. und 2. BA**	**180 Tage**	**Mon 21.04.25**	**Fre 16.01.26**
88				
89	**Rohbau / Dach / Fassade Halle**	**140 Tage**	**Mon 21.04.25**	**Fre 31.10.25**

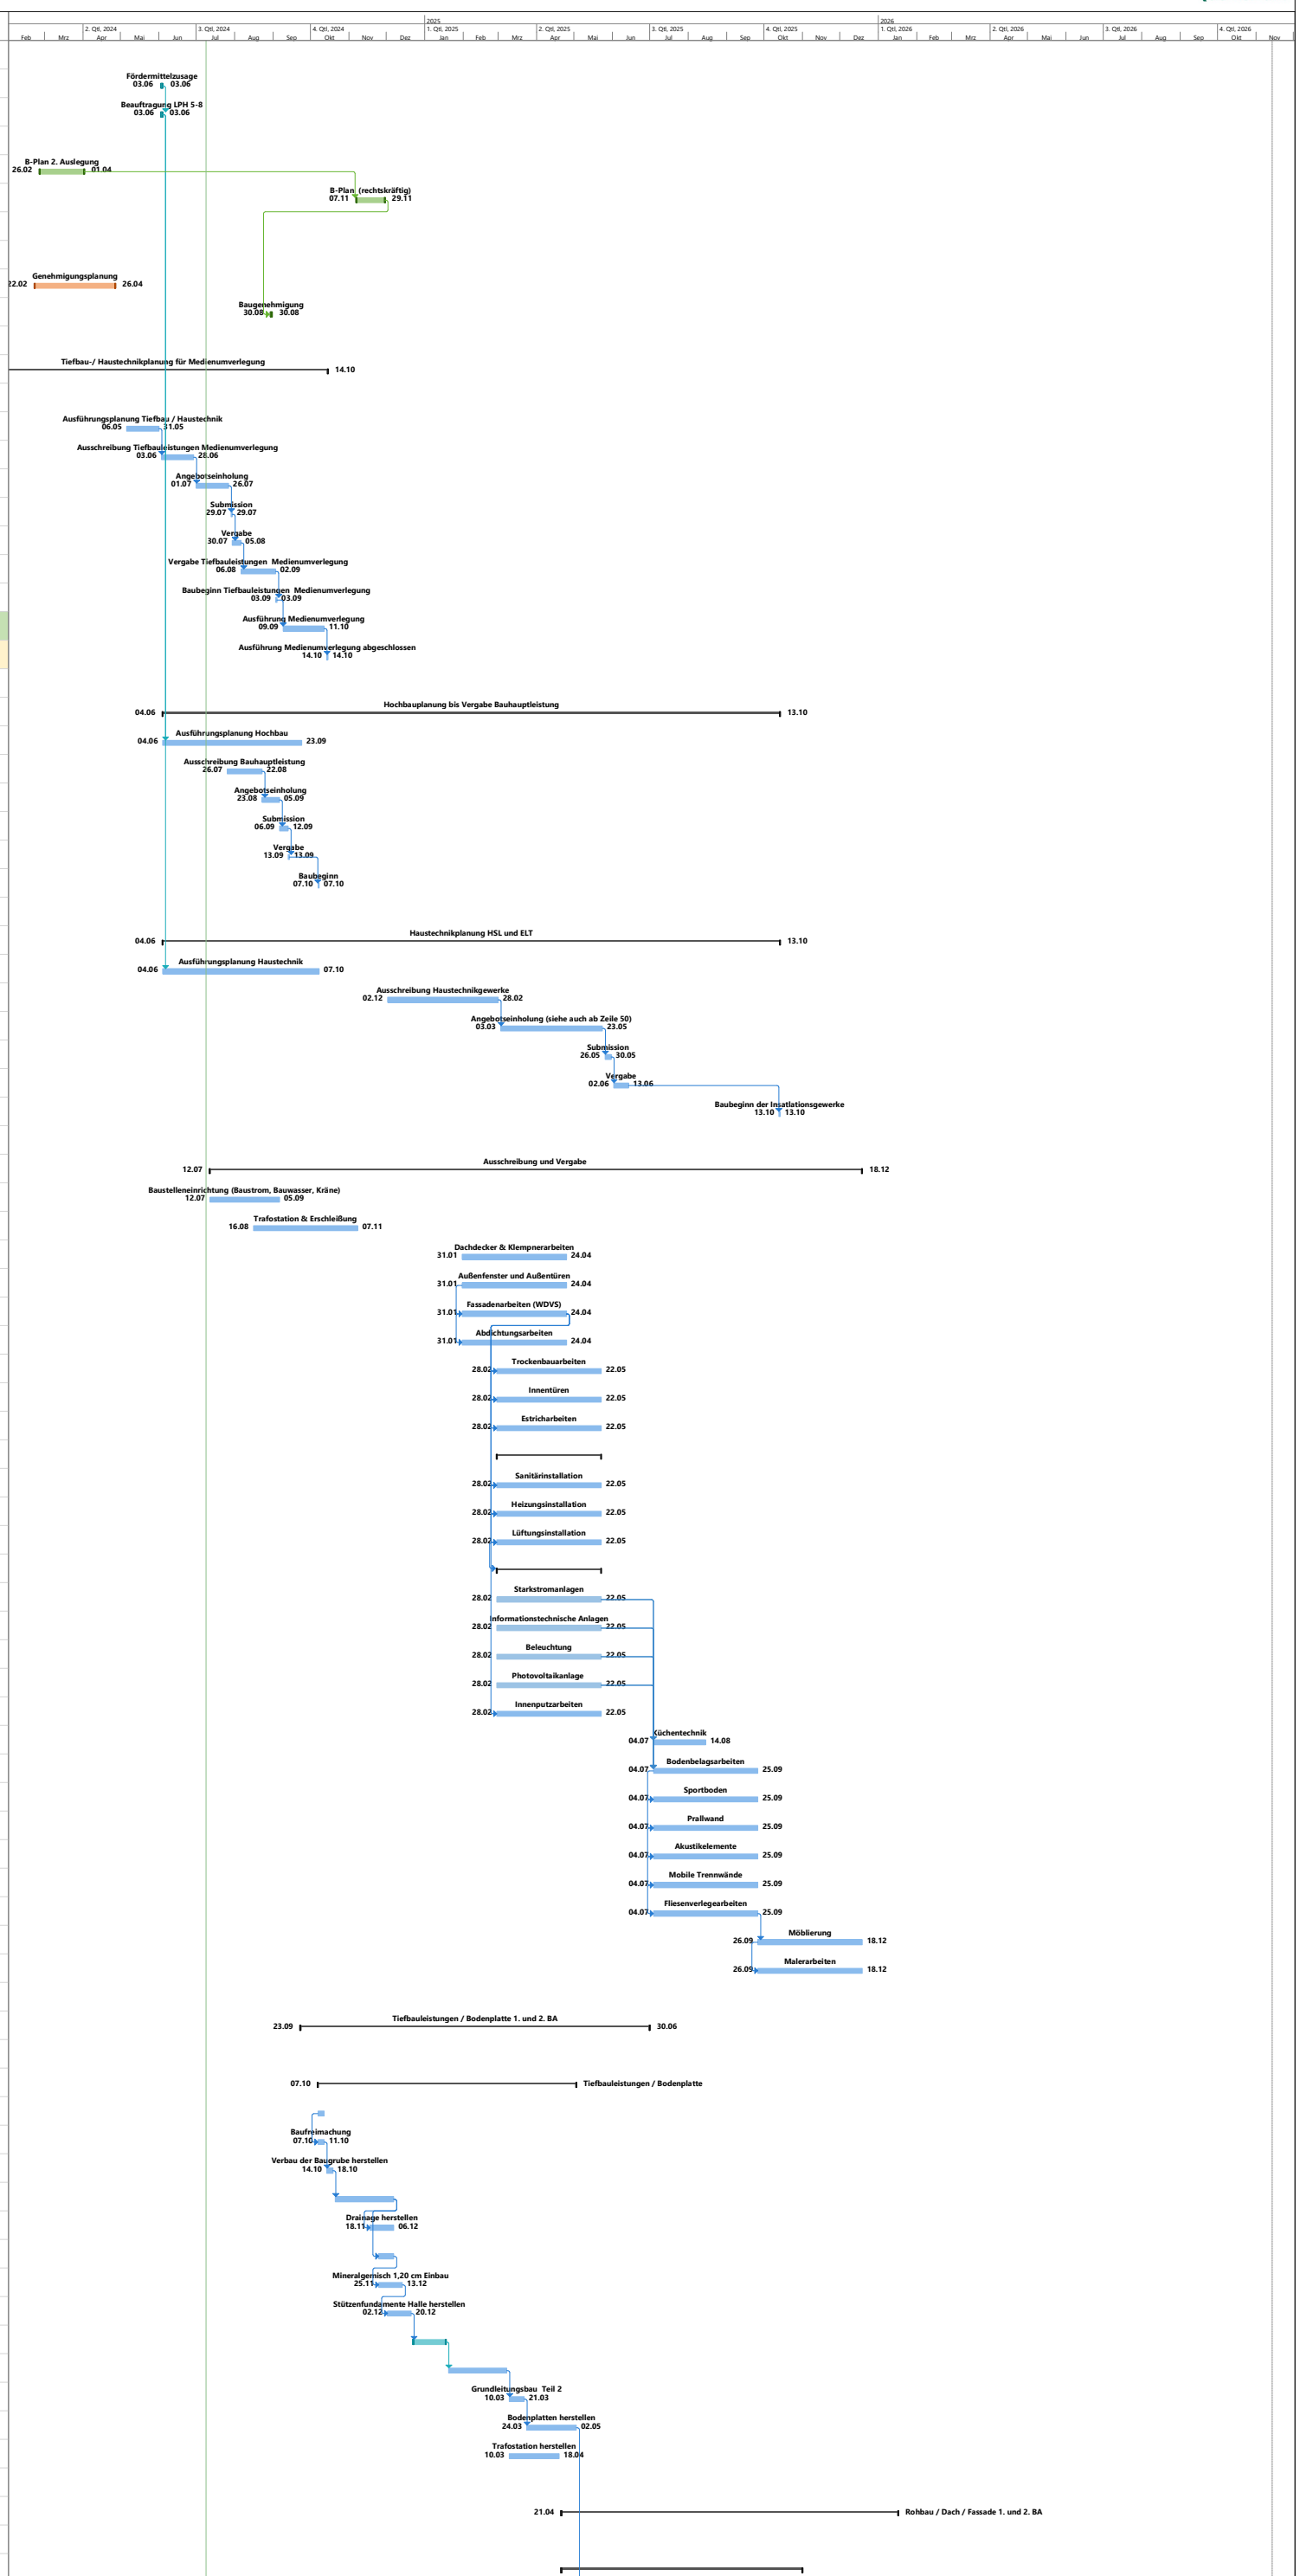

Projekt: GUT-DRAUF-KOMPLEX
Datum: Die 09.07.24

Vorgang | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Inaktiver Meilenstein | Manueller Vorgang | Manueller Sammelrollup | Nur Anfang | Externe Vorgänge | Stichtag | Manueller Fortschritt
Unterbrechung | Sammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Sammelvorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Nur Ende | Externer Meilenstein | In Arbeit

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
90	Innengerüst und Schalungsbau für Wände und Stützen	15 Tage	Mon 21.04.25	Fre 09.05.25
91	Hallenwände & Stützen betonieren	30 Tage	Mon 12.05.25	Fre 20.06.25
92	Abdichtung, Dämmung & Verfüllung Hallenbereich erdberührend	15 Tage	Mon 23.06.25	Fre 11.07.25
93	Gerüst außen herstellen	5 Tage	Mon 14.07.25	Fre 18.07.25
94	Rohbau Rampe und Halle Ortgangbereiche	20 Tage	Mon 21.07.25	Fre 15.08.25
95	Bindermontage	5 Tage	Mon 18.08.25	Fre 22.08.25
96	Dach: Trapezblech, Dämmung und Abdichtung	30 Tage	Mon 25.08.25	Fre 03.10.25
97	Glasfassade Montage	10 Tage	Mon 22.09.25	Fre 03.10.25
98	WDVS / Fassadenarbeiten	20 Tage	Mon 29.09.25	Fre 24.10.25
99	Fassadengerüst abrüsten	5 Tage	Mon 27.10.25	Fre 31.10.25
100				
101	**Rohbau / Dach / Fassade Gesellschaftsbau**	**170 Tage**	**Mon 05.05.25**	**Fre 16.01.26**
102	Rohbauarbeiten UG inkl. Decke	35 Tage	Mon 05.05.25	Fre 20.06.25
103	Rohbauarbeiten OG inkl Decke	35 Tage	Mon 23.06.25	Fre 08.08.25
104	Rohbauarbeiten Dach & Attika Treppenhauskopf	20 Tage	Mon 11.08.25	Fre 05.09.25
105	Laubengangmontage	5 Tage	Mon 08.09.25	Fre 12.09.25
106	Dachabdichtungsarbeiten	30 Tage	Mon 15.09.25	Fre 24.10.25
107	Fenstereinbau	20 Tage	Mon 06.10.25	Fre 31.10.25
108	WDVS / Fassadenarbeiten	30 Tage	Mon 20.10.25	Fre 28.11.25
109	Haustechnikagregate montage	20 Tage	Mon 27.10.25	Fre 21.11.25
110	Dachzentrale Montage	20 Tage	Mon 24.11.25	Fre 19.12.25
111	Fassadengerüst abrüsten	5 Tage	Mon 12.01.26	Fre 16.01.26
112				
113	**Innenausbau**	**260 Tage**	**Mon 22.09.25**	**Fre 09.10.26**
114	**Halle**	**255 Tage**	**Mon 29.09.25**	**Fre 09.10.26**
115	Unterputzarbeiten Wandanschlussbereiche	5 Tage	Mon 29.09.25	Fre 03.10.25
116	Abdichtungar. Boden und Wände	10 Tage	Mon 06.10.25	Fre 17.10.25
117	Höhenausgleich und Schutzschicht Boden herstellen	20 Tage	Mon 20.10.25	Fre 14.11.25
118	Elt - Grundinst	15 Tage	Mon 17.11.25	Fre 05.12.25
119	Innengerüst aufstellen	5 Tage	Mon 08.12.25	Fre 12.12.25
120	Lüftungsinst. Hallendecke	15 Tage	Mon 15.12.25	Fre 23.01.26
121	Elt - Grundinst Decke	10 Tage	Mon 26.01.26	Fre 06.02.26
122	Nachbearbeitung Sichtbetonwände	10 Tage	Mon 09.02.26	Fre 20.02.26
123	Akustikpanäle Decke Montage	10 Tage	Mon 23.02.26	Fre 06.03.26
124	Elt - Beleuchtung / RM Deckenmontage	10 Tage	Mon 09.03.26	Fre 20.03.26
125	Akustikpanäle Wände Montage	5 Tage	Mon 23.03.26	Fre 27.03.26
126	Raumtrennvorhangmontage	5 Tage	Mon 30.03.26	Fre 03.04.26
127	Innengerüst Rückbau	5 Tage	Mon 06.04.26	Fre 10.04.26
128	Prallschutzwände Montage	20 Tage	Mon 13.04.26	Fre 08.05.26
129	Innentürmontage	10 Tage	Mon 11.05.26	Fre 22.05.26
130	Auslegen der Dämmung	5 Tage	Mon 25.05.26	Fre 29.05.26
131	FBH Verlegung Halle	30 Tage	Mon 01.06.26	Fre 10.07.26
132	Sportbodenaufbau herstellen	15 Tage	Mon 13.07.26	Fre 31.07.26
133	Bodenbelagsarbeiten	10 Tage	Mon 03.08.26	Fre 14.08.26
134	Markierungsarbeiten	5 Tage	Mon 17.08.26	Fre 21.08.26
135	Elt - Boden und Wand Endmontage	15 Tage	Mon 24.08.26	Fre 11.09.26
136	Einbauten Montage	10 Tage	Mon 14.09.26	Fre 25.09.26
137	Raumausstattung - Lieferung & Einbau	10 Tage	Mon 28.09.26	Fre 09.10.26
138	**UG Sanitärbereich & HT**	**245 Tage**	**Mon 13.10.25**	**Fre 09.10.26**
139	Unterputzarbeiten	15 Tage	Mon 13.10.25	Fre 31.10.25
140	Abdichtungar. Boden und Wände	10 Tage	Mon 03.11.25	Fre 14.11.25
141	TBW & Vorwände 1 seitige Beplankung	25 Tage	Mon 17.11.25	Fre 19.12.25
142	HS - Grundinst.	25 Tage	Mon 01.12.25	Fre 23.01.26
143	Elt - Grundinst Boden + Wand	25 Tage	Mon 01.12.25	Fre 23.01.26
144	Lüftung - Grundinst.	25 Tage	Mon 01.12.25	Fre 23.01.26
145	Trockenbauwände Beplankung 2. Lage	20 Tage	Mon 26.01.26	Fre 20.02.26
146	Trockenbaudecken - Unterkonst	15 Tage	Mon 23.02.26	Fre 13.03.26
147	Auslegen der Dämmung	15 Tage	Mon 16.03.26	Fre 03.04.26
148	Fußbodenheizung Verlegung	15 Tage	Mon 30.03.26	Fre 17.04.26
149	Estricharbeiten	5 Tage	Mon 20.04.26	Fre 24.04.26
150	Estrichruhe und Estrichaufheizen	28 Tage	Mon 27.04.26	Mit 03.06.26
151	Oberputzarbeiten Wände	19 Tage	Don 21.05.26	Die 16.06.26
152	Trockenbaudecken - Beplankung	15 Tage	Mit 17.06.26	Die 07.07.26
153	Innentürmontage	10 Tage	Mit 24.06.26	Die 07.07.26
154	Aufzugmontage	10 Tage	Mon 15.06.26	Fre 26.06.26
155	Fliesenverlegearbeiten	20 Tage	Mit 08.07.26	Die 04.08.26
156	Anstricharbeiten	20 Tage	Mit 29.07.26	Die 25.08.26
157	Elt - Beleuchtung / RM Deckenmontage	15 Tage	Mit 19.08.26	Die 08.09.26
158	Lüftung Sanitär Endmontage	15 Tage	Mit 19.08.26	Die 08.09.26
159	Elt - Boden und Wand Endmontage	15 Tage	Mit 19.08.26	Die 08.09.26
160	Bodenbelagsarbeiten	15 Tage	Mit 09.09.26	Die 29.09.26
161	Raumausstattung - Lieferung & Einbau	8 Tage	Mit 30.09.26	Fre 09.10.26
162	**UG Bowlingbereich**	**228 Tage**	**Mon 20.10.25**	**Mit 23.09.26**
163	Unterputzarbeiten	10 Tage	Mon 20.10.25	Fre 31.10.25
164	Abdichtungar. Boden und Wände	5 Tage	Mon 17.11.25	Fre 21.11.25
165	TBW & Vorwände 1 seitige Beplankung	20 Tage	Mon 24.11.25	Fre 19.12.25
166	HS - Grundinst.	20 Tage	Mon 24.11.25	Fre 19.12.25
167	Elt - Grundinst Boden + Wand	20 Tage	Mon 24.11.25	Fre 19.12.25
168	Lüftung - Grundinst.	20 Tage	Mon 24.11.25	Fre 19.12.25
169	Trockenbauwände Beplankung 2. Lage	10 Tage	Mon 12.01.26	Fre 23.01.26
170	Trockenbaudecken - Unterkonst	10 Tage	Mon 26.01.26	Fre 06.02.26
171	Auslegen der Dämmung	5 Tage	Mon 09.02.26	Fre 13.02.26
172	FBH Verlegung	5 Tage	Mon 16.02.26	Fre 20.02.26
173	Estricharbeiten (Gussasphalt)	3 Tage	Mon 23.02.26	Mit 25.02.26
174	Oberputzarbeiten Wände	10 Tage	Don 05.03.26	Mit 18.03.26
175	Trockenbaudecken - Beplankung	10 Tage	Don 19.03.26	Mit 01.04.26
176	Innentürmontage	5 Tage	Don 02.04.26	Mit 08.04.26
177	Fliesenverlegearbeiten	10 Tage	Don 09.04.26	Mit 22.04.26
178	Anstricharbeiten	10 Tage	Don 23.04.26	Mit 06.05.26

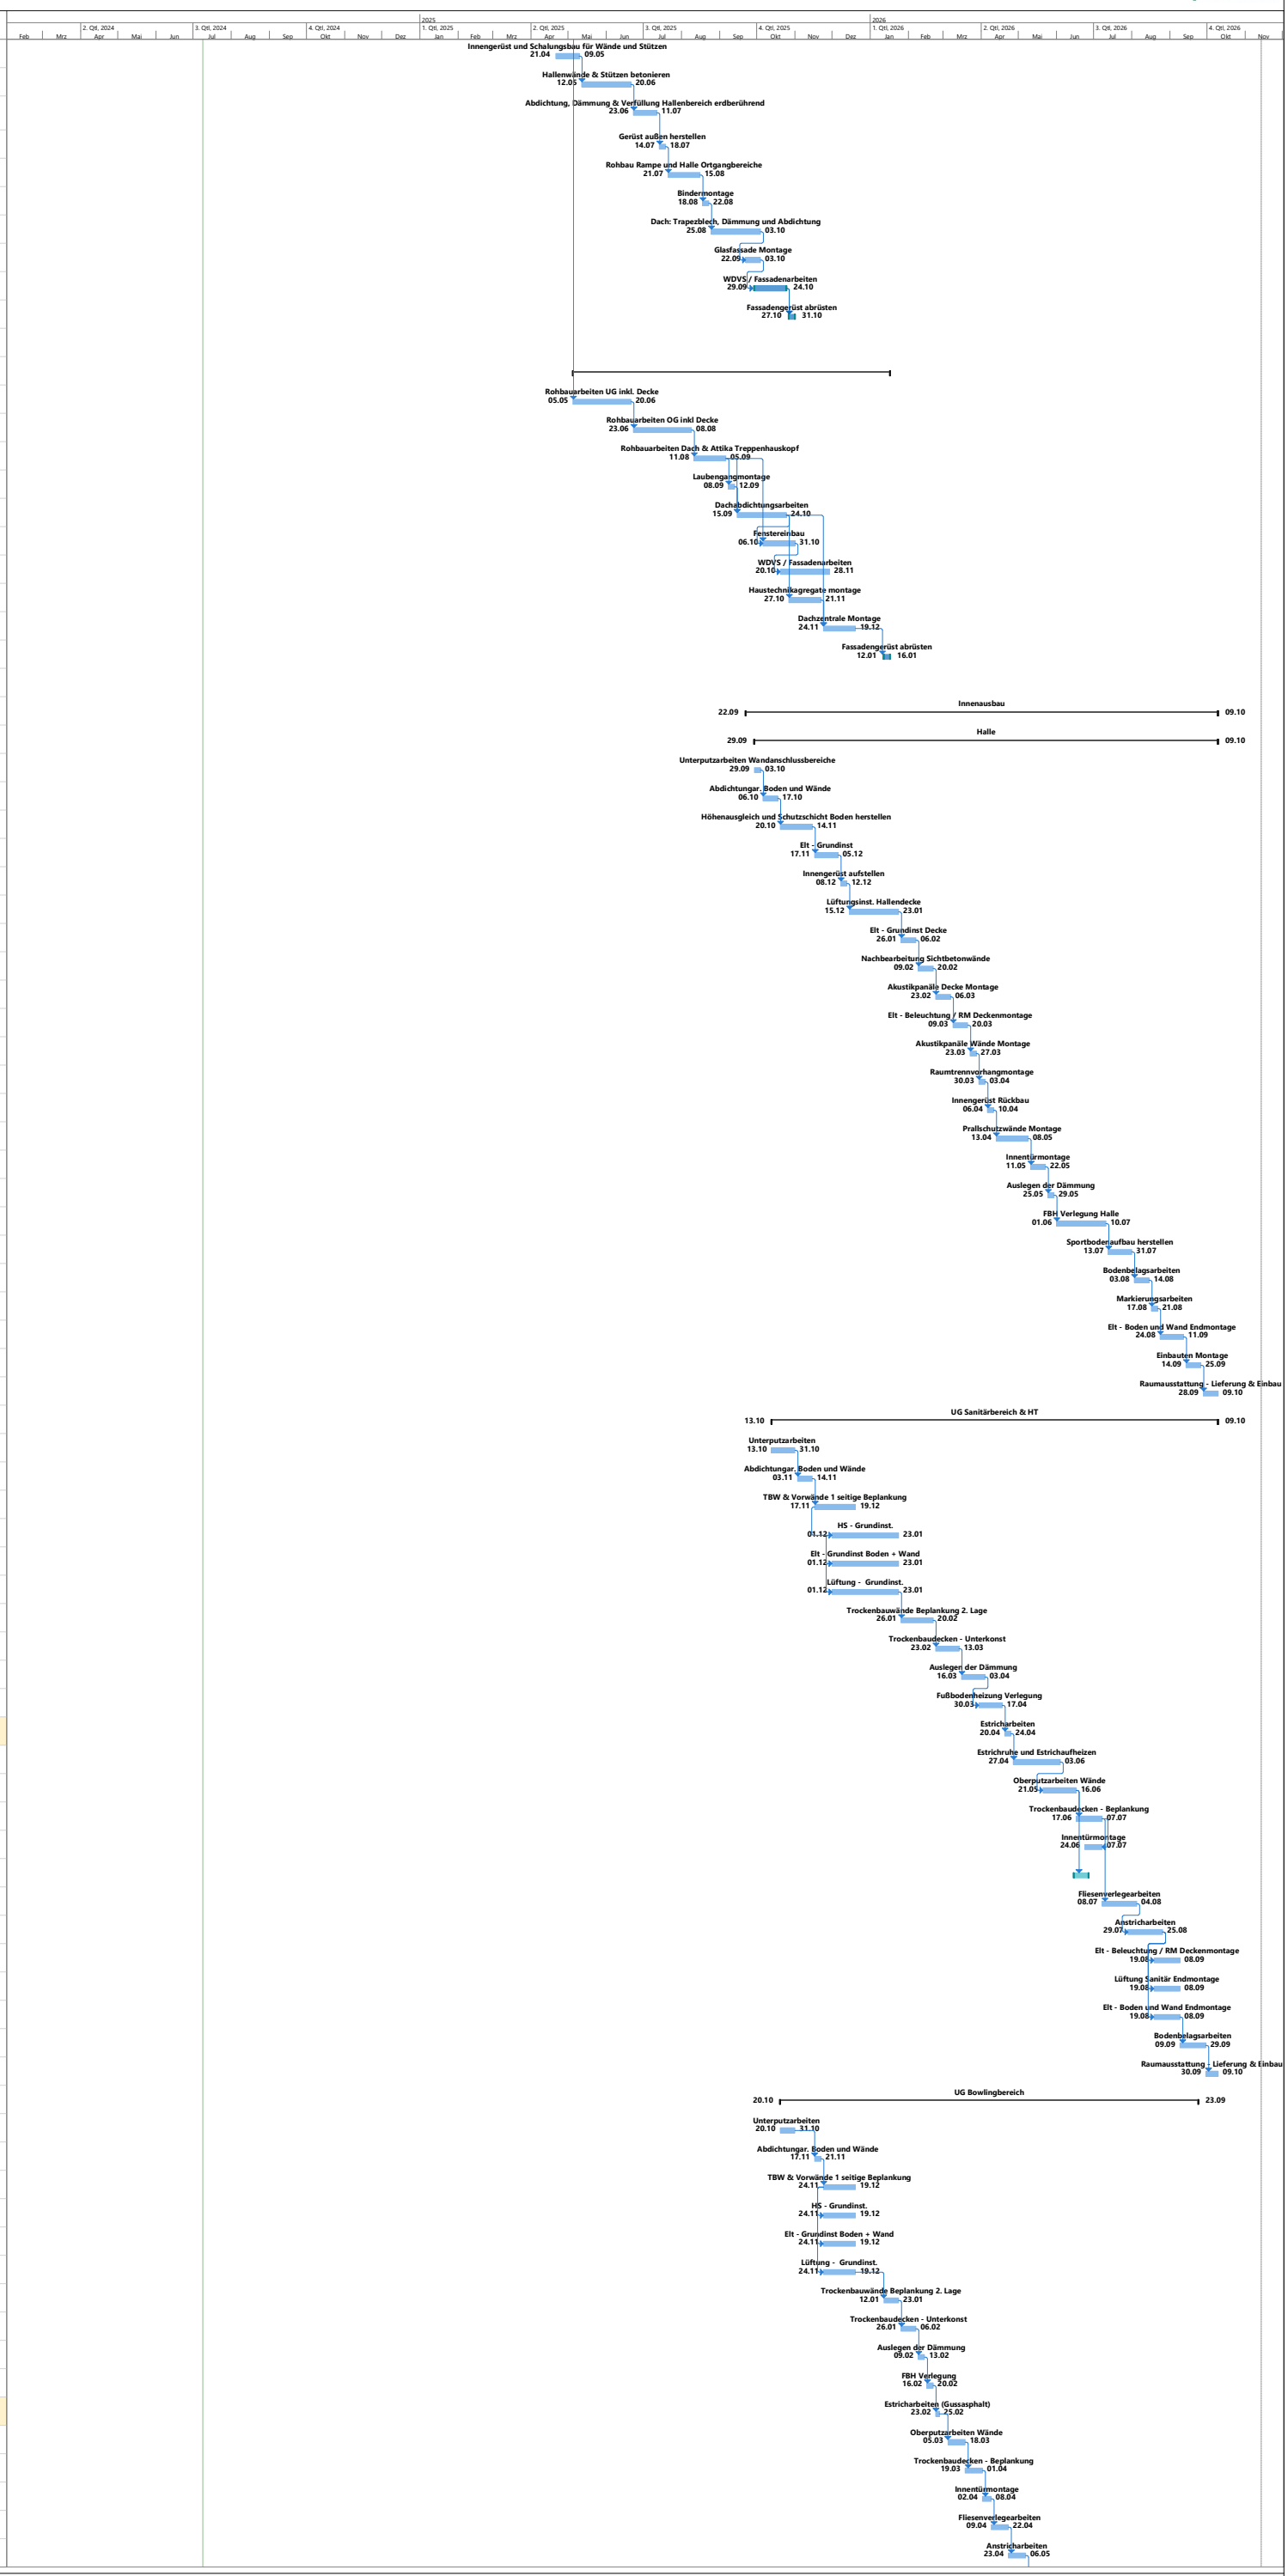

Baumanagement der Maßnahme - Rahmenzeitplan - GUT-DRAUF-KOMPLEX KIEZ Querxenland Seifhennersdorf
Stand: 09.07.2024

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
179	Elt - Beleuchtung / RM Deckenmontage	10 Tage	Don 07.05.26	Mit 20.05.26
180	Lüftung Endmontage	10 Tage	Don 21.05.26	Mit 03.06.26
181	Elt - Boden und Wand Endmontage	10 Tage	Don 04.06.26	Mit 17.06.26
182	Bowlingbahn Montage	30 Tage	Don 18.06.26	Mit 29.07.26
183	Bodenbelagsarbeiten (Sockelleisten)	5 Tage	Don 30.07.26	Mit 05.08.26
184	Raumausstattung - Lieferung & Einbau	15 Tage	Don 06.08.26	Mit 26.08.26
185	Funktionsprüfung und Nacharbeiten	20 Tage	Don 27.08.26	Mit 23.09.26
186	<Neuer Vorgang>			
187	**OG Küchenbereich**	**252 Tage**	**Mon 29.09.25**	**Die 06.10.26**
188	Unterputzarbeiten	10 Tage	Mon 27.10.25	Fre 07.11.25
189	Abdichtungar. Boden und Wände Küche	10 Tage	Mon 10.11.25	Fre 21.11.25
190	TBW & Vorwände 1 seitige Beplankung	25 Tage	Mon 24.11.25	Fre 16.01.26
191	Lüftung - Grundinst.	20 Tage	Mon 19.01.26	Fre 13.02.26
192	HS - Grundinst. + Bodeneinläufe	20 Tage	Mon 16.02.26	Fre 13.03.26
193	Elt - Grundinst Boden + Wand	20 Tage	Mon 16.02.26	Fre 13.03.26
194	Trockenbauwände Beplankung 2. Lage	10 Tage	Mon 16.03.26	Fre 27.03.26
195	Trockenbaudecken - Unterkonst	10 Tage	Mon 30.03.26	Fre 10.04.26
196	Auslegen der Dämmung	20 Tage	Mon 13.04.26	Fre 08.05.26
197	FBH Verlegung	10 Tage	Mon 11.05.26	Fre 22.05.26
198	Estricharbeiten	5 Tage	Mon 25.05.26	Fre 29.05.26
199	Estrichruhe & Aufheizen	28 Tage	Mon 01.06.26	Mit 08.07.26
200	Oberputzarbeiten Wände	10 Tage	Don 25.06.26	Mit 08.07.26
201	Trockenbaudecke - Beplankung	5 Tage	Don 09.07.26	Mit 15.07.26
202	Innentürmontage	2 Tage	Don 16.07.26	Fre 17.07.26
203	Fliesenverlegearbeiten	15 Tage	Mon 20.07.26	Fre 07.08.26
204	Anstricharbeiten	5 Tage	Mon 10.08.26	Fre 14.08.26
205	PU - Beschichtung Boden	5 Tage	Mon 17.08.26	Fre 21.08.26
206	Küchenmontage	20 Tage	Mon 24.08.26	Fre 18.09.26
207	Kühlzellenmontage	5 Tage	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26
208	Elt - Beleuchtung / RM Deckenmontage	5 Tage	Mon 28.09.26	Fre 02.10.26
209	Lüftung & Sanitär - Endmontage	5 Tage	Mon 28.09.26	Fre 02.10.26
210	Elt - Boden und Wand Endmontage	5 Tage	Mon 28.09.26	Fre 02.10.26
211	Raumausstattung - Lieferung & Einbau	5 Tage	Mon 05.10.26	Fre 09.10.26
212	**OG Mensabereich & Essenausgabe**	**260 Tage**	**Mon 22.09.25**	**Fre 09.10.26**
213	Unterputzarbeiten	15 Tage	Mon 22.09.25	Fre 10.10.25
214	Abdichtungar. Boden und Wände	5 Tage	Mon 13.10.25	Fre 17.10.25
215	Trockenbauwände & Vorwände 1 seitige Beplankung	25 Tage	Mon 20.10.25	Fre 21.11.25
216	HS - Grundinst.	20 Tage	Mon 03.11.25	Fre 28.11.25
217	Elt - Grundinst Boden + Wand	20 Tage	Mon 03.11.25	Fre 28.11.25
218	Lüftung - Grundinst.	20 Tage	Mon 03.11.25	Fre 28.11.25
219	Trockenbauwände 2. Lage	10 Tage	Mon 01.12.25	Fre 12.12.25
220	Trockenbaudecken - Unterkonst.	15 Tage	Mon 15.12.25	Fre 23.01.26
221	Auslegen der Dämmung	10 Tage	Mon 26.01.26	Fre 06.02.26
222	Fußbodenheizung Verlegung	15 Tage	Mon 09.02.26	Fre 27.02.26
223	Estricharbeiten Zement	5 Tage	Mon 02.03.26	Fre 06.03.26
224	Estricharbeiten Gussasphalt	5 Tage	Mon 23.03.26	Fre 27.03.26
225	Estrichruhe & Aufheizen	28 Tage	Mon 30.03.26	Mit 06.05.26
226	Oberputzarbeiten Wände	15 Tage	Don 07.05.26	Mit 27.05.26
227	Trockenbaudecken - Beplankung	20 Tage	Don 28.05.26	Mit 24.06.26
228	Innentürmontage & Trennwände	10 Tage	Don 25.06.26	Mit 08.07.26
229	Fliesenverlegearbeiten	15 Tage	Don 09.07.26	Mit 29.07.26
230	Anstricharbeiten	15 Tage	Don 30.07.26	Mit 19.08.26
231	PU - Beschichtung Küche und Essensausgabe	5 Tage	Don 20.08.26	Mit 26.08.26
232	Essensausgabe Montage	15 Tage	Don 27.08.26	Mit 16.09.26
233	Elt - Beleuchtung / RM Deckenmontage	15 Tage	Don 27.08.26	Mit 16.09.26
234	Lüftung & Sanitär - Endmontage	15 Tage	Don 27.08.26	Mit 16.09.26
235	Elt - Boden und Wand Endmontage	15 Tage	Don 27.08.26	Mit 16.09.26
236	Bodenbelagsarbeiten Einpflege	5 Tage	Don 17.09.26	Mit 23.09.26
237	Raumausstattung - Lieferung & Einbau	12 Tage	Don 24.09.26	Fre 09.10.26
238	**Tiefbau & Außenanlagen**	**536 Tage**	**Mon 09.09.24**	**Mon 02.11.26**
239	Medienumverlegung	25 Tage	Mon 09.09.24	Fre 11.10.24
240	BA 1 Parkplatz Süd & Viebigstr.	85 Tage	Mon 03.02.25	Fre 30.05.25
241	BA 2 Unfahrung West; SW,RW;TW	65 Tage	Mon 02.06.25	Fre 29.08.25
242	BA 3 Gewege oberhalb der Rezeption	22 Tage	Mon 01.09.25	Die 30.09.25
243	BA 4 Gewege unter der Rezeption + Zufahrten	44 Tage	Die 01.10.24	Fre 29.11.24
244	BA 5 Parkplatz Süd (Bereich Baustelleneinrichtung)	65 Tage	Mon 02.03.26	Fre 29.05.26
245	Regenrückhaltung Süd / RW SÜD	65 Tage	Mon 02.03.26	Fre 29.05.26
246	Straßenbau von Viebigstr. - Anlieferungsbereich	65 Tage	Mon 02.03.26	Fre 29.05.26
247	Straßenbau vor Kläranlage & Parkflächen	22 Tage	Mon 01.06.26	Die 30.06.26
248	Ostseite; RW-Kanal, Winkelstützwand, Gewege	87 Tage	Mon 02.03.26	Die 30.06.26
249	Medienanschluss (TW, Gas, Elt, Wärme)	87 Tage	Mon 02.03.26	Die 30.06.26
250	Nordseite, Parkplatz Zufahrt	64 Tage	Mit 01.07.26	Sam 26.09.26
251	Zäune & Tore nach Baufortschritt	246 Tage	Mit 01.10.25	Mit 30.09.26
252	Pflanzungen nach Baufortschritt	291 Tage	Mon 01.09.25	Mon 02.11.26
253				
254	**Fertigstellung**	**54 Tage**	**Die 01.09.26**	**Fre 13.11.26**
255	Justage der HSL Anlagen	10 Tage	Die 01.09.26	Mon 14.09.26
256	Justage der ELT Anlagen	10 Tage	Die 15.09.26	Mon 28.09.26
257	Grundreinigung	5 Tage	Mon 05.10.26	Fre 09.10.26
258	Nacharbeiten der Gewerke	10 Tage	Mon 12.10.26	Fre 23.10.26
259	Sachverständigenabnahmen	3 Tage	Mon 26.10.26	Mit 28.10.26
260	Endabnahmen der Prüfing.	2 Tage	Don 29.10.26	Fre 30.10.26
261	Bauaufsichtliche Abnahme	1 Tag	Mon 02.11.26	Mon 02.11.26
262	Endabnahmen der Gewerke	2 Tage	Die 03.11.26	Mit 04.11.26
263	Endreinigung	5 Tage	Don 05.11.26	Mit 11.11.26
264	Übergabe an den Bauherrn	1 Tag	Don 12.11.26	Don 12.11.26
265	Nutzungsaufnahme	1 Tag	Fre 13.11.26	Fre 13.11.26
266				

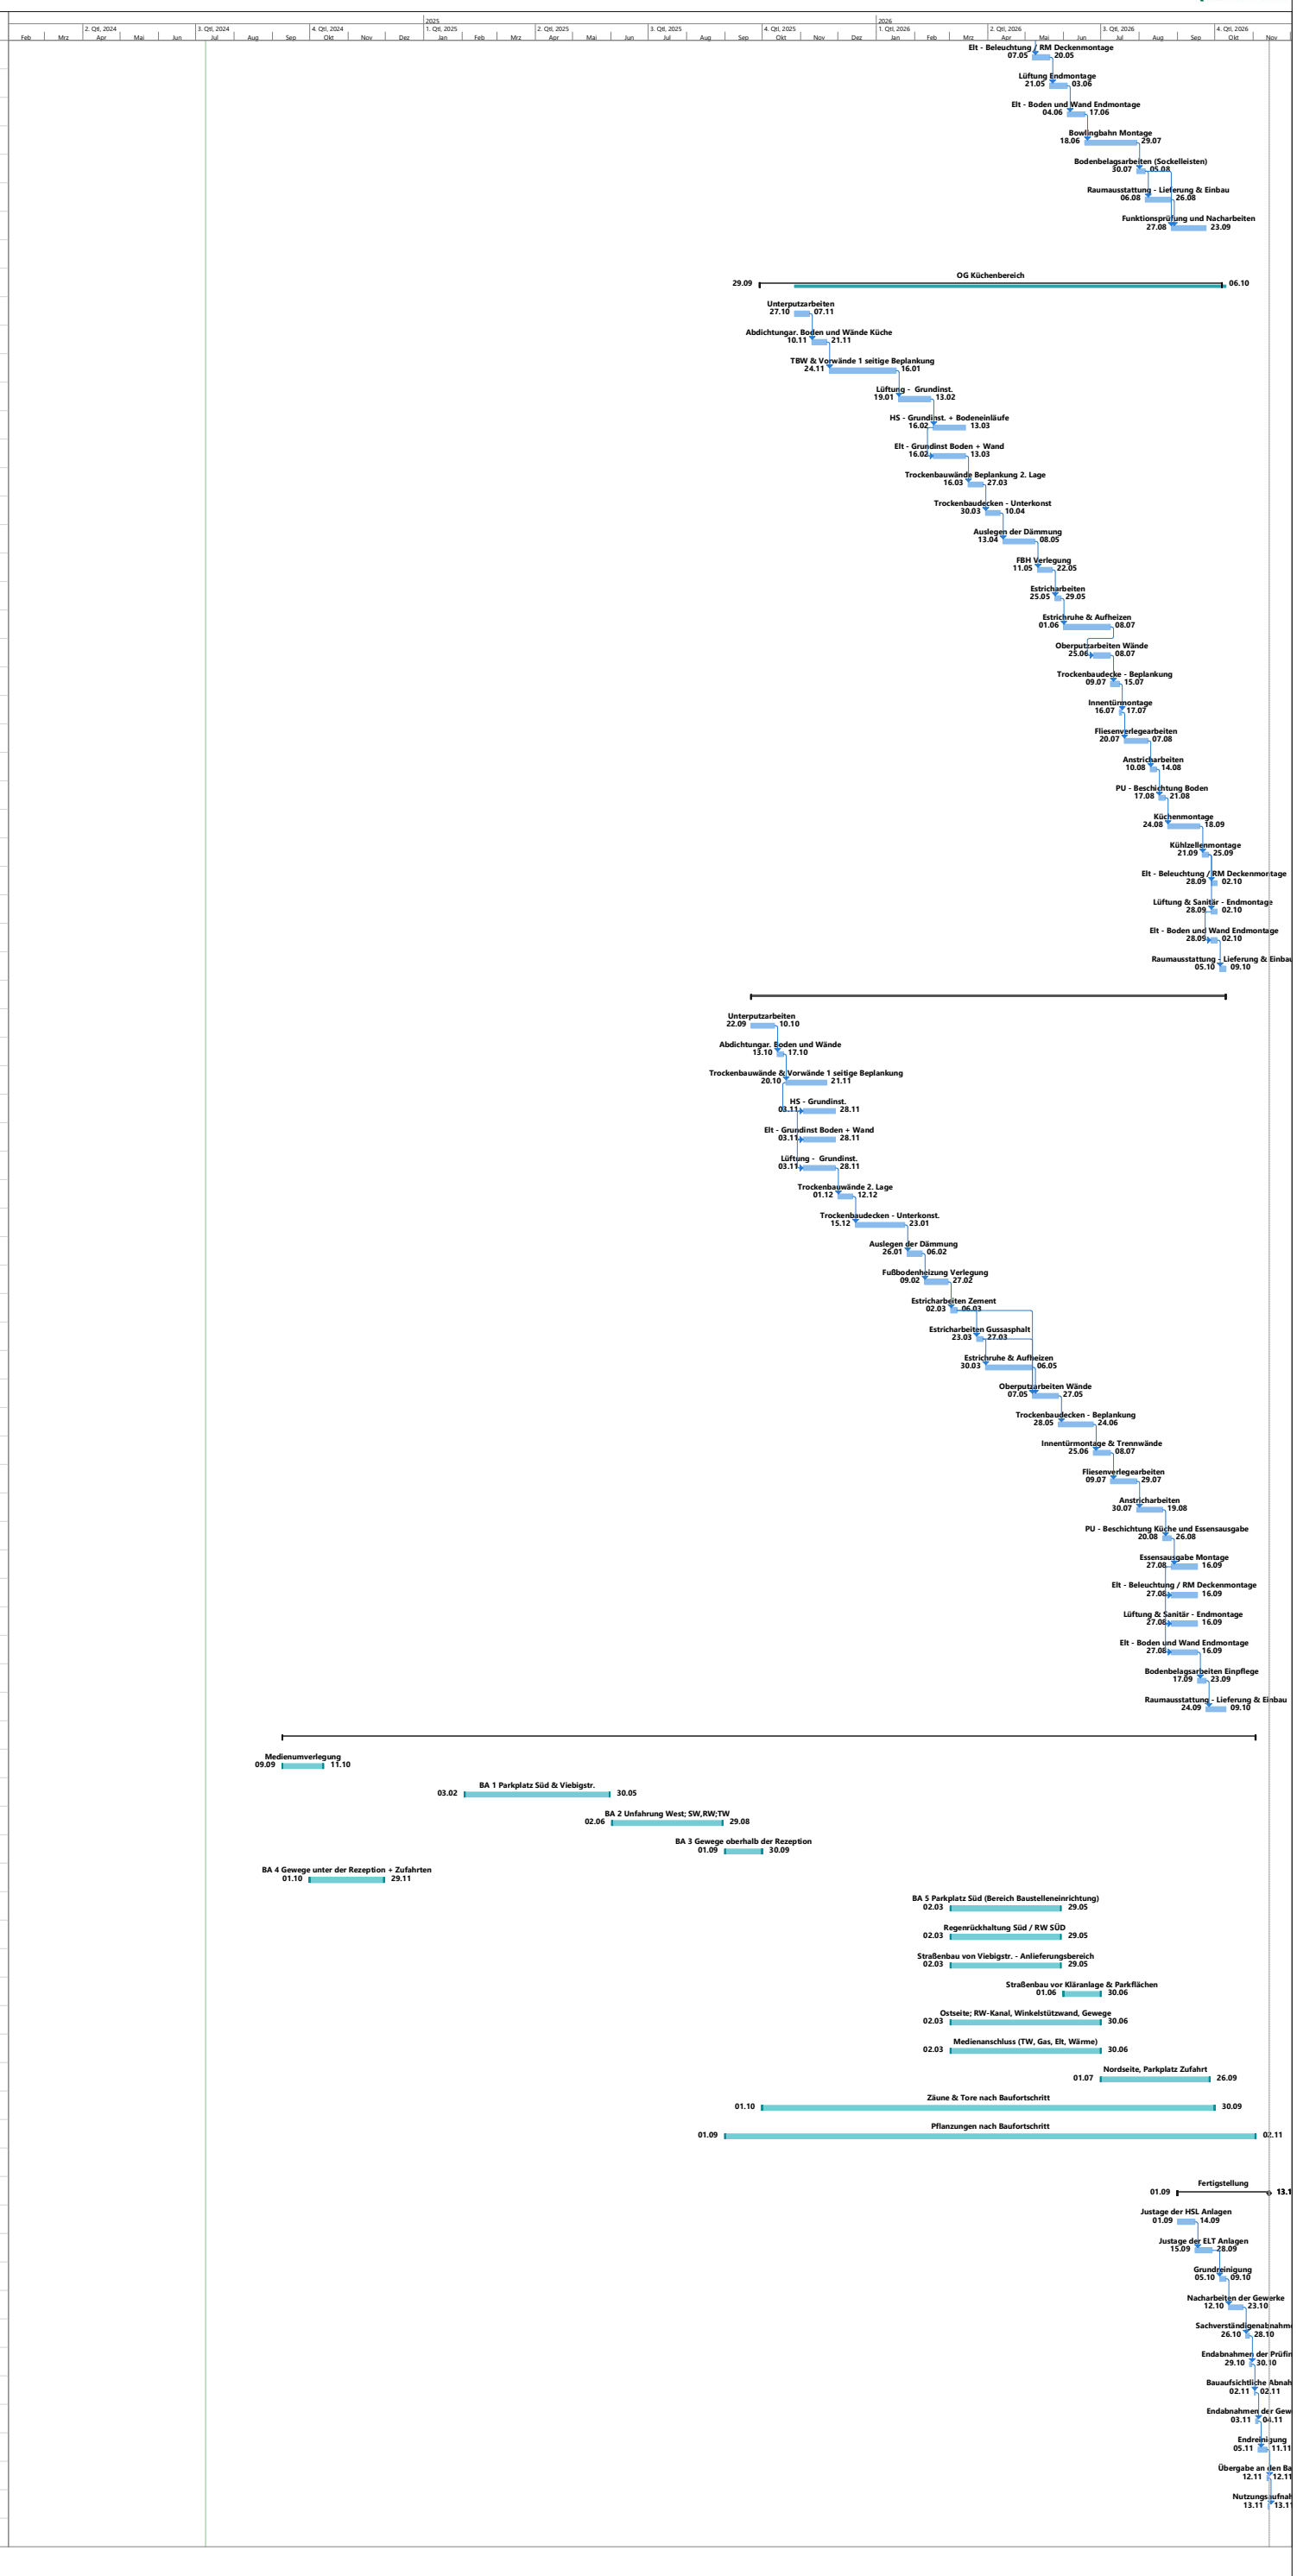

Projekt: GUT-DRAUF-KOMPLEX
Datum: Die 09.07.24

Vorgang | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Inaktiver Meilenstein | Manueller Vorgang | Manueller Sammelrollup | Nur Anfang | Externe Vorgänge | Stichtag | Manueller Fortschritt
Unterbrechung | Sammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Sammelvorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Nur Ende | Externer Meilenstein | In Arbeit
