234.01.03 - Papenburg - Vorbereitende Maßnahmen - Vorabzug Bauablaufplan zur Abstimmung

Druckdatum: 01.07.24
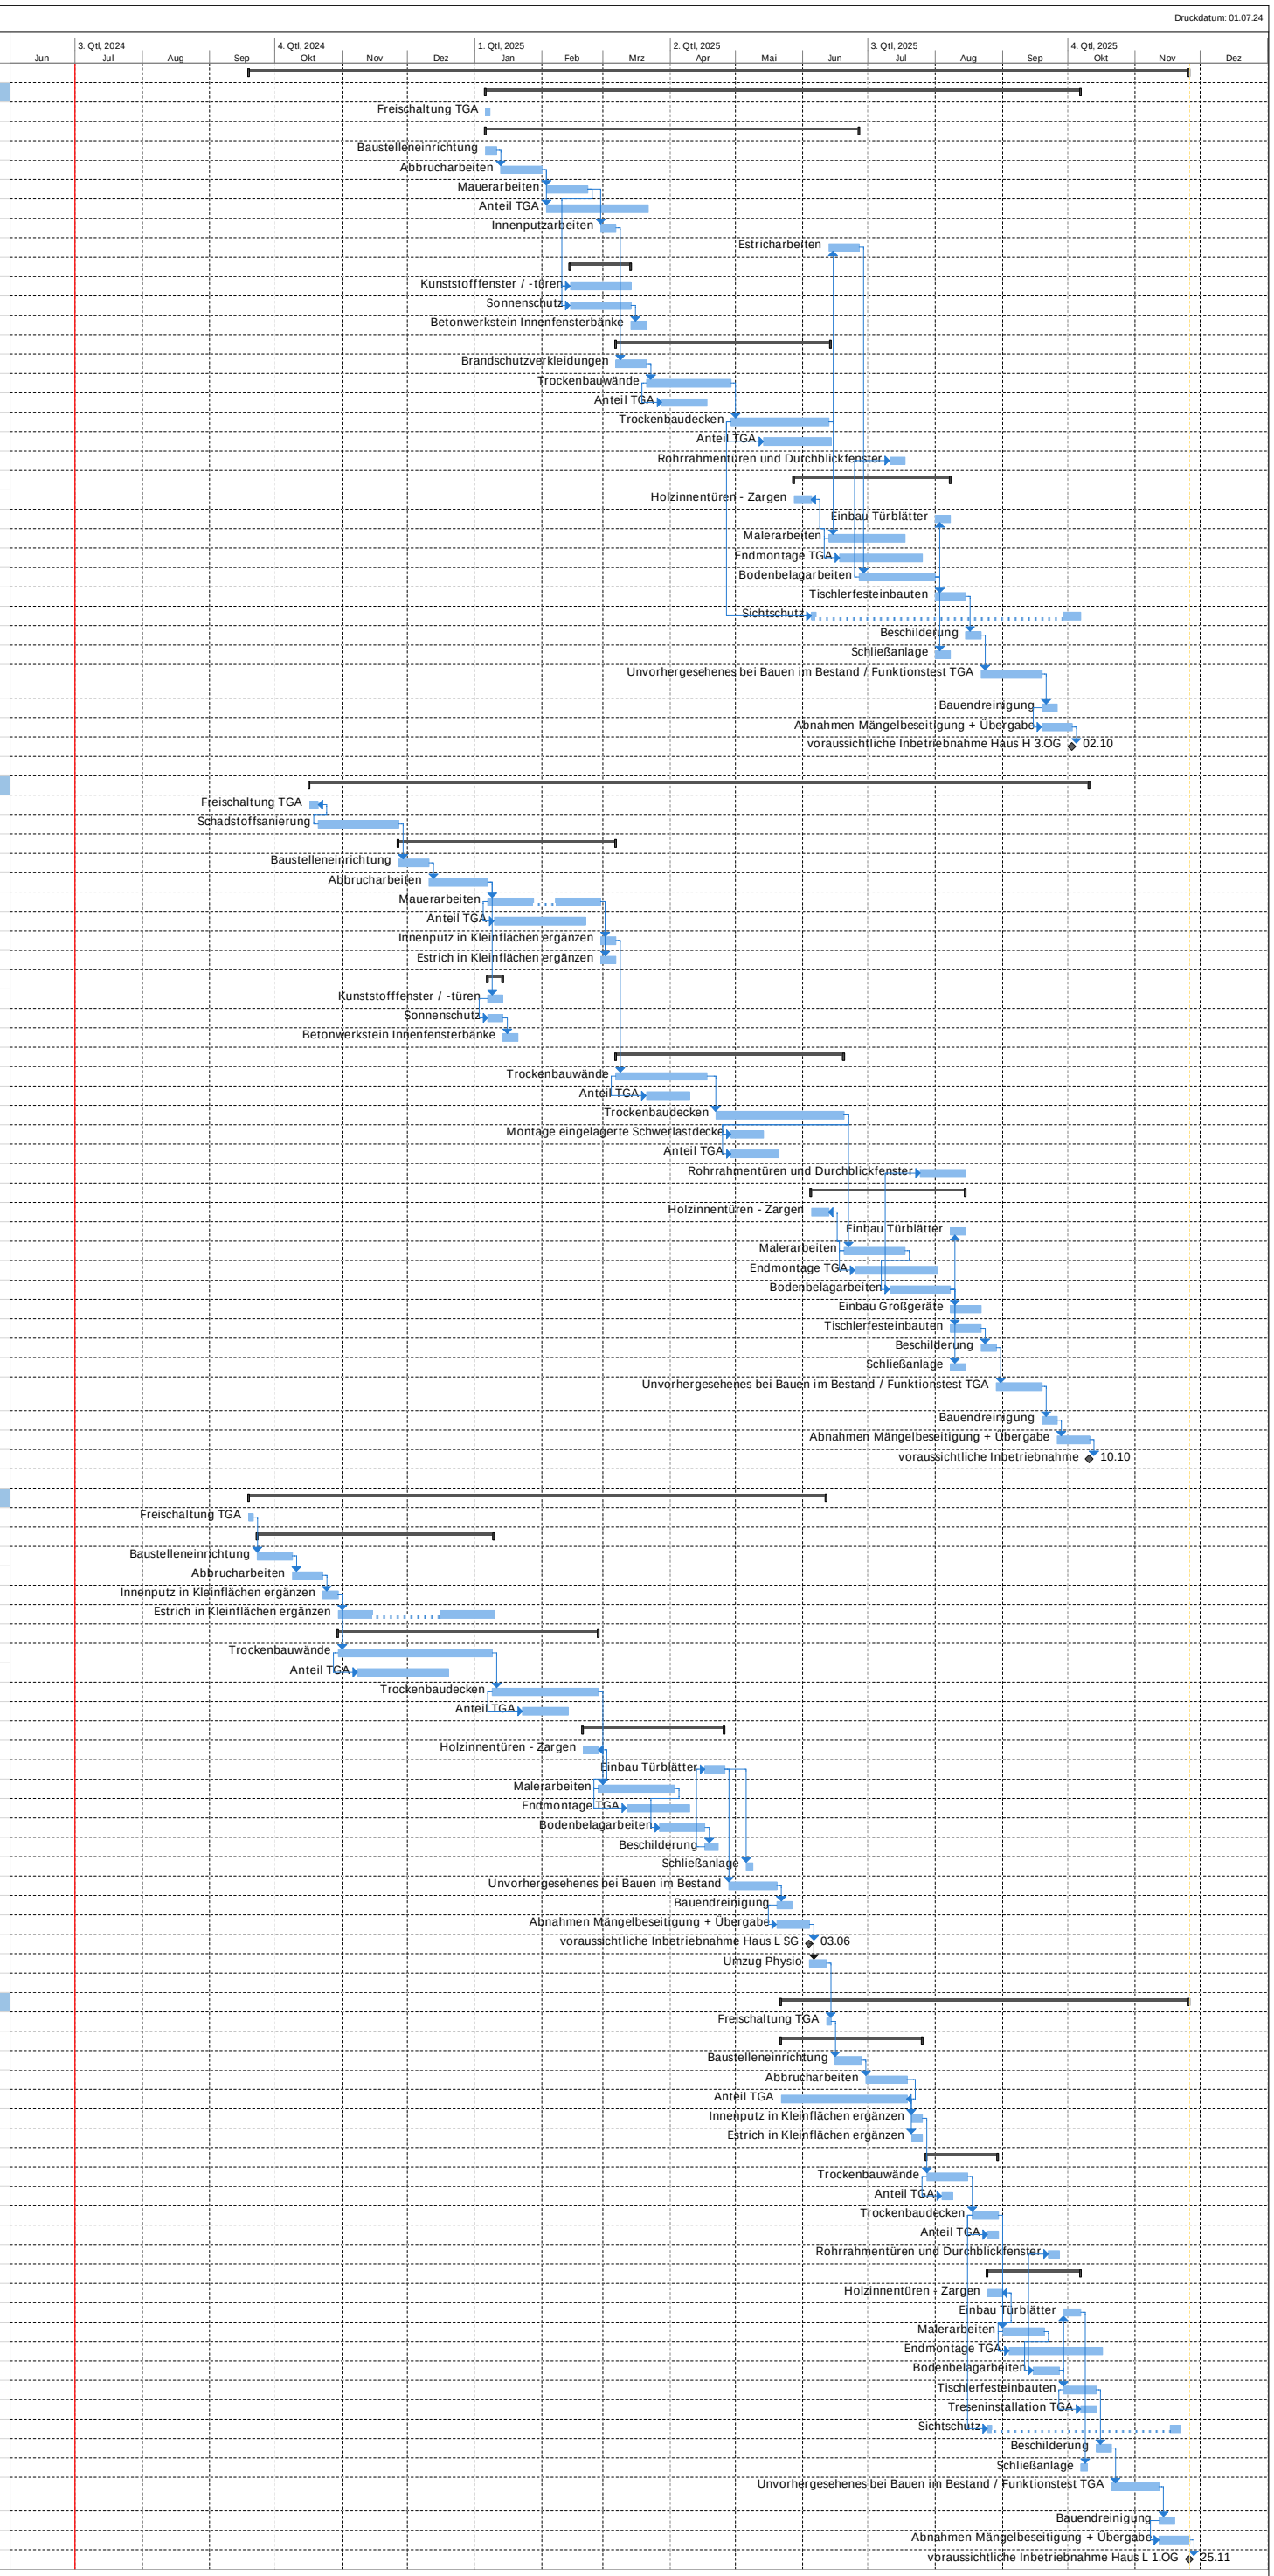
Nr.	Vorgan	Vorgangsname	Anfang	Ende
1		Vorbereitende Maßnahmen	19.09.24	25.11.25
2		Umbau Haus H 3.OG + Brandschutz	06.01.25	06.10.25
3		Freischaltung TGA	06.01.25	07.01.25
4		Rohbauarbeiten	06.01.25	26.06.25
5		Baustelleneinrichtung	06.01.25	10.01.25
6		Abbrucharbeiten	13.01.25	31.01.25
7		Mauerarbeiten	03.02.25	21.02.25
8		Anteil TGA	03.02.25	21.03.25
9		Innenputzarbeiten	28.02.25	06.03.25
10		Estricharbeiten	13.06.25	26.06.25
11		Fenster und Sonnenschutz	14.02.25	13.03.25
12		Kunststofffenster / -türen	14.02.25	13.03.25
13		Sonnenschutz	14.02.25	13.03.25
14		Betonwerkstein Innenfensterbänke	14.03.25	20.03.25
15		Trockenbauarbeiten	07.03.25	13.06.25
16		Brandschutzverkleidungen	07.03.25	20.03.25
17		Trockenbauwände	21.03.25	28.04.25
18		Anteil TGA	28.03.25	17.04.25
19		Trockenbaudecken	29.04.25	12.06.25
20		Anteil TGA	14.05.25	13.06.25
21		Rohrrahmentüren und Durchblickfenster	11.07.25	17.07.25
22		Holzinnentüren	28.05.25	07.08.25
23		Holzinnentüren - Zargen	28.05.25	05.06.25
24		Einbau Türblätter	01.08.25	07.08.25
25		Malerarbeiten	13.06.25	17.07.25
26		Endmontage TGA	18.06.25	25.07.25
27		Bodenbelagarbeiten	27.06.25	31.07.25
28		Tischlerfesteinbauten	01.08.25	14.08.25
29		Sichtschutz	05.06.25	06.10.25
30		Beschilderung	15.08.25	21.08.25
31		Schließanlage	01.08.25	07.08.25
32		Unvorhergesehenes bei Bauen im Bestand / Funktionstest TGA	22.08.25	18.09.25
33		Bauendreinigung	19.09.25	25.09.25
34		Abnahmen Mängelbeseitigung + Übergabe	19.09.25	02.10.25
35		voraussichtliche Inbetriebnahme Haus H 3.OG	02.10.25	02.10.25
36				
37		Umbau Haus H EG Radiologie	17.10.24	10.10.25
38		Freischaltung TGA	17.10.24	21.10.24
39		Schadstoffsanierung	21.10.24	26.11.24
40		Rohbauarbeiten	27.11.24	06.03.25
41		Baustelleneinrichtung	27.11.24	10.12.24
42		Abbrucharbeiten	11.12.24	06.01.25
43		Mauerarbeiten	07.01.25	27.02.25
44		Anteil TGA	10.01.25	20.02.25
45		Innenputz in Kleinflächen ergänzen	28.02.25	06.03.25
46		Estrich in Kleinflächen ergänzen	28.02.25	06.03.25
47		Fenster und Sonnenschutz	07.01.25	13.01.25
48		Kunststofffenster / -türen	07.01.25	13.01.25
49		Sonnenschutz	07.01.25	13.01.25
50		Betonwerkstein Innenfensterbänke	14.01.25	20.01.25
51		Trockenbauarbeiten	07.03.25	19.06.25
52		Trockenbauwände	07.03.25	17.04.25
53		Anteil TGA	21.03.25	09.04.25
54		Trockenbaudecken	22.04.25	19.06.25
55		Montage eingelagerte Schwerlastdecke	29.04.25	13.05.25
56		Anteil TGA	29.04.25	20.05.25
57		Rohrrahmentüren und Durchblickfenster	25.07.25	14.08.25
58		Holzinnentüren	05.06.25	14.08.25
59		Holzinnentüren - Zargen	05.06.25	13.06.25
60		Einbau Türblätter	08.08.25	14.08.25
61		Malerarbeiten	20.06.25	17.07.25
62		Endmontage TGA	25.06.25	01.08.25
63		Bodenbelagarbeiten	11.07.25	07.08.25
64		Einbau Großgeräte	08.08.25	21.08.25
65		Tischlerfesteinbauten	08.08.25	21.08.25
66		Beschilderung	22.08.25	28.08.25
67		Schließanlage	08.08.25	14.08.25
68		Unvorhergesehenes bei Bauen im Bestand / Funktionstest TGA	29.08.25	18.09.25
69		Bauendreinigung	19.09.25	25.09.25
70		Abnahmen Mängelbeseitigung + Übergabe	26.09.25	10.10.25
71		voraussichtliche Inbetriebnahme	10.10.25	10.10.25
72				
73		Haus L PARC SG	19.09.24	11.06.25
74		Freischaltung TGA	19.09.24	20.09.24
75		Rohbauarbeiten	23.09.24	09.01.25
76		Baustelleneinrichtung	23.09.24	08.10.24
77		Abbrucharbeiten	09.10.24	22.10.24
78		Innenputz in Kleinflächen ergänzen	23.10.24	29.10.24
79		Estrich in Kleinflächen ergänzen	30.10.24	09.01.25
80		Trockenbauarbeiten	30.10.24	26.02.25
81		Trockenbauwände	30.10.24	08.01.25
82		Anteil TGA	08.11.24	19.12.24
83		Trockenbaudecken	09.01.25	26.02.25
84		Anteil TGA	23.01.25	12.02.25
85		Holzinnentüren	20.02.25	25.04.25
86		Holzinnentüren - Zargen	20.02.25	27.02.25
87		Einbau Türblätter	17.04.25	25.04.25
88		Malerarbeiten	27.02.25	02.04.25
89		Endmontage TGA	12.03.25	09.04.25
90		Bodenbelagarbeiten	27.03.25	16.04.25
91		Beschilderung	17.04.25	22.04.25
92		Schließanlage	06.05.25	08.05.25
93		Unvorhergesehenes bei Bauen im Bestand	28.04.25	19.05.25
94		Bauendreinigung	20.05.25	26.05.25
95		Abnahmen Mängelbeseitigung + Übergabe	20.05.25	03.06.25
96		voraussichtliche Inbetriebnahme Haus L SG	03.06.25	03.06.25
97		Umzug Physio	04.06.25	11.06.25
98				
99		Haus L PARC 1. OG	22.05.25	25.11.25
100		Freischaltung TGA	12.06.25	13.06.25
101		Rohbauarbeiten	22.05.25	25.07.25
102		Baustelleneinrichtung	16.06.25	27.06.25
103		Abbrucharbeiten	30.06.25	18.07.25
104		Anteil TGA	22.05.25	18.07.25
105		Innenputz in Kleinflächen ergänzen	21.07.25	25.07.25
106		Estrich in Kleinflächen ergänzen	21.07.25	25.07.25
107		Trockenbauarbeiten	28.07.25	29.08.25
108		Trockenbauwände	28.07.25	15.08.25
109		Anteil TGA	04.08.25	08.08.25
110		Trockenbaudecken	18.08.25	29.08.25
111		Anteil TGA	25.08.25	29.08.25
112		Rohrrahmentüren und Durchblickfenster	22.09.25	26.09.25
113		Holzinnentüren	25.08.25	06.10.25
114		Holzinnentüren - Zargen	25.08.25	01.09.25
115		Einbau Türblätter	29.09.25	06.10.25
116		Malerarbeiten	01.09.25	19.09.25
117		Endmontage TGA	04.09.25	16.10.25
118		Bodenbelagarbeiten	15.09.25	26.09.25
119		Tischlerfesteinbauten	29.09.25	13.10.25
120		Treseninstallation TGA	07.10.25	13.10.25
121		Sichtschutz	25.08.25	21.11.25
122		Beschilderung	14.10.25	20.10.25
123		Schließanlage	07.10.25	09.10.25
124		Unvorhergesehenes bei Bauen im Bestand / Funktionstest TGA	21.10.25	11.11.25
125		Bauendreinigung	12.11.25	18.11.25
126		Abnahmen Mängelbeseitigung + Übergabe	12.11.25	25.11.25
127		voraussichtliche Inbetriebnahme Haus L 1.OG	25.11.25	25.11.25
