Bauzeitenplan

Straßenmeisterei Heinzebank

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	**Straßenmeisterei Heinzebank**	588kt	Mo, 18.03.24	Fr, 24.10.25
2	**Vorbereitung Gelände (AG)**			
1.1	**L000-01 - Herrichten BE-Fläche (Leistung AG)**	26wt	Mo, 18.03.24	Fr, 26.04.24
1.2	**L300-01 - Allg. BE**	379wt	Di, 02.04.24	Do, 02.10.25
1.3	**L400-01 - Baustrom**	375wt	Mo, 08.04.24	Do, 02.10.25
1.4	**L300-02 - Rohbauarbeiten**	92wt	Mo, 15.04.24	Fr, 23.08.24
3	Ist-Bauzeit ohne Berücksichtigung (Vorbehalt)	105wt	Mo, 15.04.24	Mi, 11.09.24
1.5	**L300-03 - Gerüstarbeiten 09/24**	181wt	Mo, 02.09.24	Fr, 23.05.25
1.5.1	Aufstellen Halle	10wt	Mo, 09.09.24	Fr, 20.09.24
1.5.2	Aufstellen Büro	5wt	Mo, 02.09.24	Fr, 06.09.24
1.5.3	Aufstellen Innenbereich Sozial	5wt	Mo, 09.09.24	Fr, 13.09.24
1.5.4	Aufstellen Innenbereich Technik	5wt	Mo, 16.09.24	Fr, 20.09.24
1.5.5	Vorhalten alle Abschnitte	181wt	Mo, 02.09.24	Fr, 23.05.25
1.6	**L300-04 - Stahlbauarbeiten**	133wt	Di, 02.04.24	Mi, 09.10.24
1.6.1	Werkplanung/Bestellung	71wt	Di, 02.04.24	Fr, 12.07.24
1.6.2	Vorlage Statik bei AG zur Weiterleitung an Prüfer	1wt	Mo, 29.04.24	Mo, 29.04.24
1.6.3	Stellen Hauptrahmen komplett, mit Pfetten	15wt	Mo, 15.07.24	Fr, 02.08.24
1.6.4	Giebelstützen	5wt	Mo, 05.08.24	Fr, 09.08.24
1.6.5	Stellen Nebenrahmen	10wt	Mo, 12.08.24	Fr, 23.08.24
1.6.6	Wandpfetten, Attika-Stützen, UK Fassade	13wt	Mo, 02.09.24	Mi, 18.09.24
1.6.7	Hallendeckung Trapezblech inkl. Netzen	14wt	Do, 19.09.24	Mi, 09.10.24
1.7	**L300-05 - Dachabdichtung/-entwässerung**	122wt	Mi, 04.09.24	Fr, 28.02.25
1.7.1	Dampfsperre und Dachvorst Büro	27wt	Mi, 04.09.24	Fr, 11.10.24
1.7.2	Abdichtung Dach Büro	9wt	Mo, 11.11.24	Fr, 22.11.24
1.7.3	Dampfsperre Attika Halle	43wt	Mo, 14.10.24	Fr, 13.12.24
1.7.4	Montage Lichtbänder, Oberlichter	5wt	Mo, 16.12.24	Fr, 20.12.24
1.7.5	Abdichtung Halle	40wt	Mo, 06.01.25	Fr, 28.02.25
1.7.6	Attika (entsprechend Witterung)	10wt	Mo, 17.02.25	Fr, 28.02.25
1.8	**L300-06 - Metallbauarbeiten (Fassade)**	129wt	Mo, 22.07.24	Fr, 24.01.25
1.8.1	Erstellung Werk- und Montageplanung, Statik	45wt	Mo, 22.07.24	Fr, 20.09.24
1.8.2	Vorlage Werk- und Montageplanung, Statik	1wt	Fr, 20.09.24	Fr, 20.09.24
1.8.3	Bestellung	26wt	Mo, 23.09.24	Fr, 01.11.24
1.8.4	Montage Fassade über Büro	10wt	Mo, 04.11.24	Fr, 15.11.24
1.8.5	Montage Sandwichelemente	41wt	Mo, 18.11.24	Fr, 17.01.25
1.8.6	Montage Projektfenster, Schwenkfenster	15wt	Mo, 06.01.25	Fr, 24.01.25
1.8.7	Einbau Sektionaltore	15wt	Mo, 06.01.25	Fr, 24.01.25
1.9	**L300-07 - Kunststofffenster**	294wt	Mo, 17.06.24	Fr, 15.08.25
1.9.1	Planung/Fertigung	79wt	Mo, 17.06.24	Fr, 04.10.24
1.9.2	Montage inkl. Fensterbänke außen	13wt	Mo, 07.10.24	Mi, 23.10.24
1.9.3	Komplettierung, Einstellung (Abnahme)	10wt	Mo, 04.08.25	Fr, 15.08.25
1.10	**L300-08 - Fenster/Türen Aluminium**	112wt	Mo, 17.06.24	Fr, 22.11.24
1.10.1	Planung/Fertigung	98wt	Mo, 17.06.24	Fr, 01.11.24
1.10.2	Montage Außentüren Büro; PR-Fassade	9wt	Mo, 11.11.24	Fr, 22.11.24
1.11	**L300-09 - Putzarbeiten (WDVS)**	139wt	Mo, 23.09.24	Fr, 11.04.25
1.11.1	Dämmung/Armierung/Putz hallenseitig	29wt	Mo, 11.11.24	Fr, 20.12.24
1.11.2	Dämmung/Armierung Büro	42wt	Mo, 23.09.24	Fr, 22.11.24
1.11.3	Armierung/Putz Büro/Technik außen (>5°C)	45wt	Mo, 06.01.25	Fr, 07.03.25
1.11.4	Restarbeiten (>5°C) (Absprache BB v. 18.09.2024)	25wt	Mo, 10.03.25	Fr, 11.04.25
1.12	**L300-10 - Innenputz**	40wt	Mo, 03.02.25	Fr, 28.03.25
1.12.1	Innenputz Sozial	15wt	Mo, 03.02.25	Fr, 21.02.25
1.12.2	Innenputz Technik (>5°C)	10wt	Mo, 17.03.25	Fr, 28.03.25
1.13	**L300-11 - Trockenbauarbeiten (Büro und Technik)**	120wt	Mo, 24.02.25	Fr, 15.08.25
1.13.1	Wände/Vorwände einseitig anlegen, abdecken Büro	15wt	Mo, 24.02.25	Fr, 14.03.25
1.13.2	Wände/Vorwände schließen und spachteln	14wt	Mo, 19.05.25	Fr, 06.06.25
1.13.3	Decken Büro, UK Raster	14wt	Mo, 02.06.25	Fr, 20.06.25
1.13.4	Deckenplatten einlegen (nach Abtönmung laufend mit Fachinstallation)	20wt	Mo, 21.07.25	Fr, 15.08.25
1.13.5	Decken Technik OSB/Dämmung, Verkleidung Remise	20wt	Mo, 23.06.25	Fr, 18.07.25
1.14	**L300-12 - Estricharbeiten**	103kt	Mo, 17.03.25	Fr, 27.06.25
1.14.1	Dämmung	5wt	Mo, 17.03.25	Fr, 21.03.25
1.14.2	Estrich (beschleunigt WZ-Wert herabgesetzt)	8wt	Mo, 14.04.25	Fr, 25.04.25
1.14.3	Abbinden bis Aufheizmöglichkeit (beschleunigt)	12kt	Mo, 28.04.25	Fr, 09.05.25
1.14.4	Trocknung/Einreichen Belegreife (Warkwort)	23wt	Mo, 26.05.25	Fr, 27.06.25
1.15	**L300-13 - Innentüren**	135wt	Mo, 17.03.25	Fr, 26.09.25
1.15.1	Planung, Fertigung	47wt	Mo, 17.03.25	Fr, 23.05.25
1.15.2	Montage Zargen	9wt	Mo, 26.05.25	Fr, 06.06.25
1.15.3	Türblattmontage, Einstellen OTS inkl. Sachkunde	10wt	Mo, 15.09.25	Fr, 26.09.25
1.15.4	Planung	15wt	Mo, 17.03.25	Fr, 04.04.25
1.15.5	Beistellung und Fertigung	32wt	Mo, 07.04.25	Fr, 23.05.25
1.15.6	Einbau	9wt	Mo, 26.05.25	Fr, 06.06.25
1.16	**L300-14 - Schlosserarbeiten**	150wt	Mo, 27.01.25	Fr, 29.08.25
1.16.1	Planung/Fertigung	86wt	Mo, 27.01.25	Fr, 30.05.25
1.16.2	Stahltreppe Halle (nach Asphalt in Halle)	9wt	Mo, 02.06.25	Fr, 13.06.25
1.16.3	Geländer Halle/Sozial	10wt	Mo, 18.08.25	Fr, 29.08.25
1.16.4	Gitterroste	10wt	Mo, 04.08.25	Fr, 15.08.25
1.17	**L300-15 - Bodenbelagarbeiten**	84wt	Mo, 02.06.25	Fr, 26.09.25
1.17.1	Bemusterung/Beistellung	54wt	Mo, 02.06.25	Fr, 15.08.25
1.17.2	Verlegung OG, EG	30wt	Mo, 18.08.25	Fr, 26.09.25
1.18	**L300-16 - Fliesenarbeiten**	95wt	Mo, 31.03.25	Fr, 15.08.25
1.18.1	Fliesen Waschhalle (Boden/Wand), witterungsabhängig	37wt	Mo, 31.03.25	Fr, 23.05.25
1.18.2	Fliesenarbeiten Büro (Boden/Wand)	20wt	Mo, 30.06.25	Fr, 25.07.25
1.18.3	Treppenhaus/Treppe Büro	15wt	Mo, 28.07.25	Fr, 15.08.25
1.19	**L300-17 - Maler- und Lackierarbeiten**	112wt	Mo, 05.05.25	Fr, 10.10.25
1.19.1	Wandbeschichtung Technik	15wt	Mo, 05.05.25	Fr, 23.05.25
1.19.2	Deckenbeschichtung Technik	9wt	Mo, 26.05.25	Fr, 06.06.25
1.19.3	Wandbeschichtung Büro	34wt	Di, 10.06.25	Fr, 25.07.25
1.19.4	Bodenbeschichtung Technik	10wt	Mo, 28.07.25	Fr, 08.08.25
1.19.5	Beschichtung Zargen, Stahltüren, Geländer	20wt	Mo, 01.09.25	Fr, 26.09.25
1.19.6	Ausbessern, Finish	14wt	Mo, 22.09.25	Fr, 10.10.25
1.20	**L300-18 - Garderobenschränke**	69wt	Mo, 30.06.25	Do, 02.10.25
1.20.1	Beistellung/Fertigung	60wt	Mo, 30.06.25	Fr, 19.09.25
1.20.2	Lieferung/Montage	9wt	Mo, 22.09.25	Do, 02.10.25
1.21	**L400-02 - Hebebühne Waschhalle (Leistung AG)**	176wt	Mo, 04.11.24	Fr, 18.07.25
1.21.1	Planung/Fertigung (Auftrag6.31.07.2024)	122wt	Mo, 04.11.24	Mi, 30.04.25
1.21.2	Abruf Hebebühne (Lieferfrist ca. 8 Wo.)	1wt	Di, 29.04.25	Di, 29.04.25
1.21.3	Montage (nach HLSEL?-Installation auf Fliese)	10wt	Mo, 30.06.25	Fr, 11.07.25
1.21.4	Sachverständigenabnahme	5wt	Mo, 14.07.25	Fr, 18.07.25
1.22	**L400-03 - Laufkatze (Leistung AG)**	185wt	Mo, 06.01.25	Fr, 26.09.25
1.22.1	Beistellung/Fertigung	165wt	Mo, 06.01.25	Fr, 29.08.25
1.22.2	Montage	20wt	Mo, 01.09.25	Fr, 26.09.25
1.23	**L400-04 - Elektroinstallation (gem. Abstimmung vom 30.10.2024)**	254kt	Mo, 21.10.24	Fr, 24.10.25
1.23.1	Sozial EG Schlitzen, Bohren, Trassenbau, Kabelzug	43kt	Mo, 21.10.24	Fr, 20.12.24
1.23.2	Halle/Werkstatt/Technik Trassenbau und Kabelzug	32kt	Mo, 24.03.25	Fr, 09.05.25
1.23.3	Installation TB, OG	20kt	Mo, 24.02.25	Fr, 21.03.25
1.23.4	Installation TB, EG	20kt	Mo, 24.02.25	Fr, 21.03.25
1.23.5	Feininstallation EG und OG	39kt	Mo, 18.06.25	Do, 07.08.25
1.23.6	Feininstallation Halle/Werkstatt/Technik	23kt	Mo, 12.05.25	Fr, 13.06.25
1.23.7	Sachverständigenabnahmen	15kt	Mo, 06.10.25	Fr, 24.10.25
1.24	**L400-05 - Sanitär-/Heizungs-/ Lüftungsinstall. (gem. Abstimmung vom 30.10.2024)**	288kt	Mo, 02.09.24	Fr, 24.10.25
1.24.1	Sanitär- und Heizungsinstallation	283kt	Mo, 02.09.24	Fr, 17.10.25
1.24.1.1	Dachentlüfte/Innenentw. Sozial	15kt	Mo, 02.09.24	Fr, 20.09.24
1.24.1.2	Dachentlüfte/Innenentw. Halle	14kt	Do, 10.10.24	Di, 29.10.24
1.24.1.3	Schlitzen, Bohren	20kt	Mo, 02.09.24	Fr, 27.09.24
1.24.1.4	Rohrinstallation (Sozial)	72kt	Mo, 09.12.24	Fr, 21.03.25
1.24.1.5	Rohrinstallation (Halle/Werkst)	21kt	Di, 01.04.25	Fr, 02.05.25
1.24.1.6	Fußo-Heizung (Büro EG+OG)	15kt	Mo, 24.03.25	Fr, 11.04.25
1.24.1.7	Aufheizen	10kt	Mo, 12.05.25	Fr, 23.05.25
1.24.1.8	Komplettierung	117kt	Mo, 05.05.25	Fr, 17.10.25
1.24.1.9	Winterheizung (Installation ab KW 43/24)	124kt	Mo, 21.10.24	Do, 17.04.25
1.24.2	Lüftungsinstallation	240kt	Mo, 11.11.24	Fr, 24.10.25
1.24.2.1	Dachdurchführungen Sozial	14kt	Mo, 11.11.24	Fr, 29.11.24
1.24.2.2	Leitungen, Kanäle	142kt	Mo, 02.12.24	Fr, 27.06.25
1.24.2.3	Lüftungsanlage auf Dach	20kt	Mo, 03.03.25	Fr, 28.03.25
1.24.2.4	Komplettierung	79kt	Mo, 30.06.25	Fr, 17.10.25
1.24.2.5	Sachverständigenabnahmen	15kt	Mo, 06.10.25	Fr, 24.10.25
1.25	**L400-06 - HD-Reiniger (Abnahme HSP)**	30kt	Mo, 28.07.25	Fr, 05.09.25
1.25.1	Beistellung/Fertigung	25kt	Mo, 28.07.25	Fr, 29.08.25
1.25.2	Montage	5kt	Mo, 01.09.25	Fr, 05.09.25
1.26	**L000-01 - Außenanlage (keine Zuarbeit LRA)**	129wt	Mo, 31.03.25	Do, 02.10.25
4	**Selchhalle (AG)**	110wt	Mo, 24.03.25	Fr, 29.08.25
5	**Reinigung (AG)**			
6	**Schlußanlage/Beschilderung (AG)**			
7	**Inbetriebnahme**	1wt	Mo, 03.11.25	Mo, 03.11.25

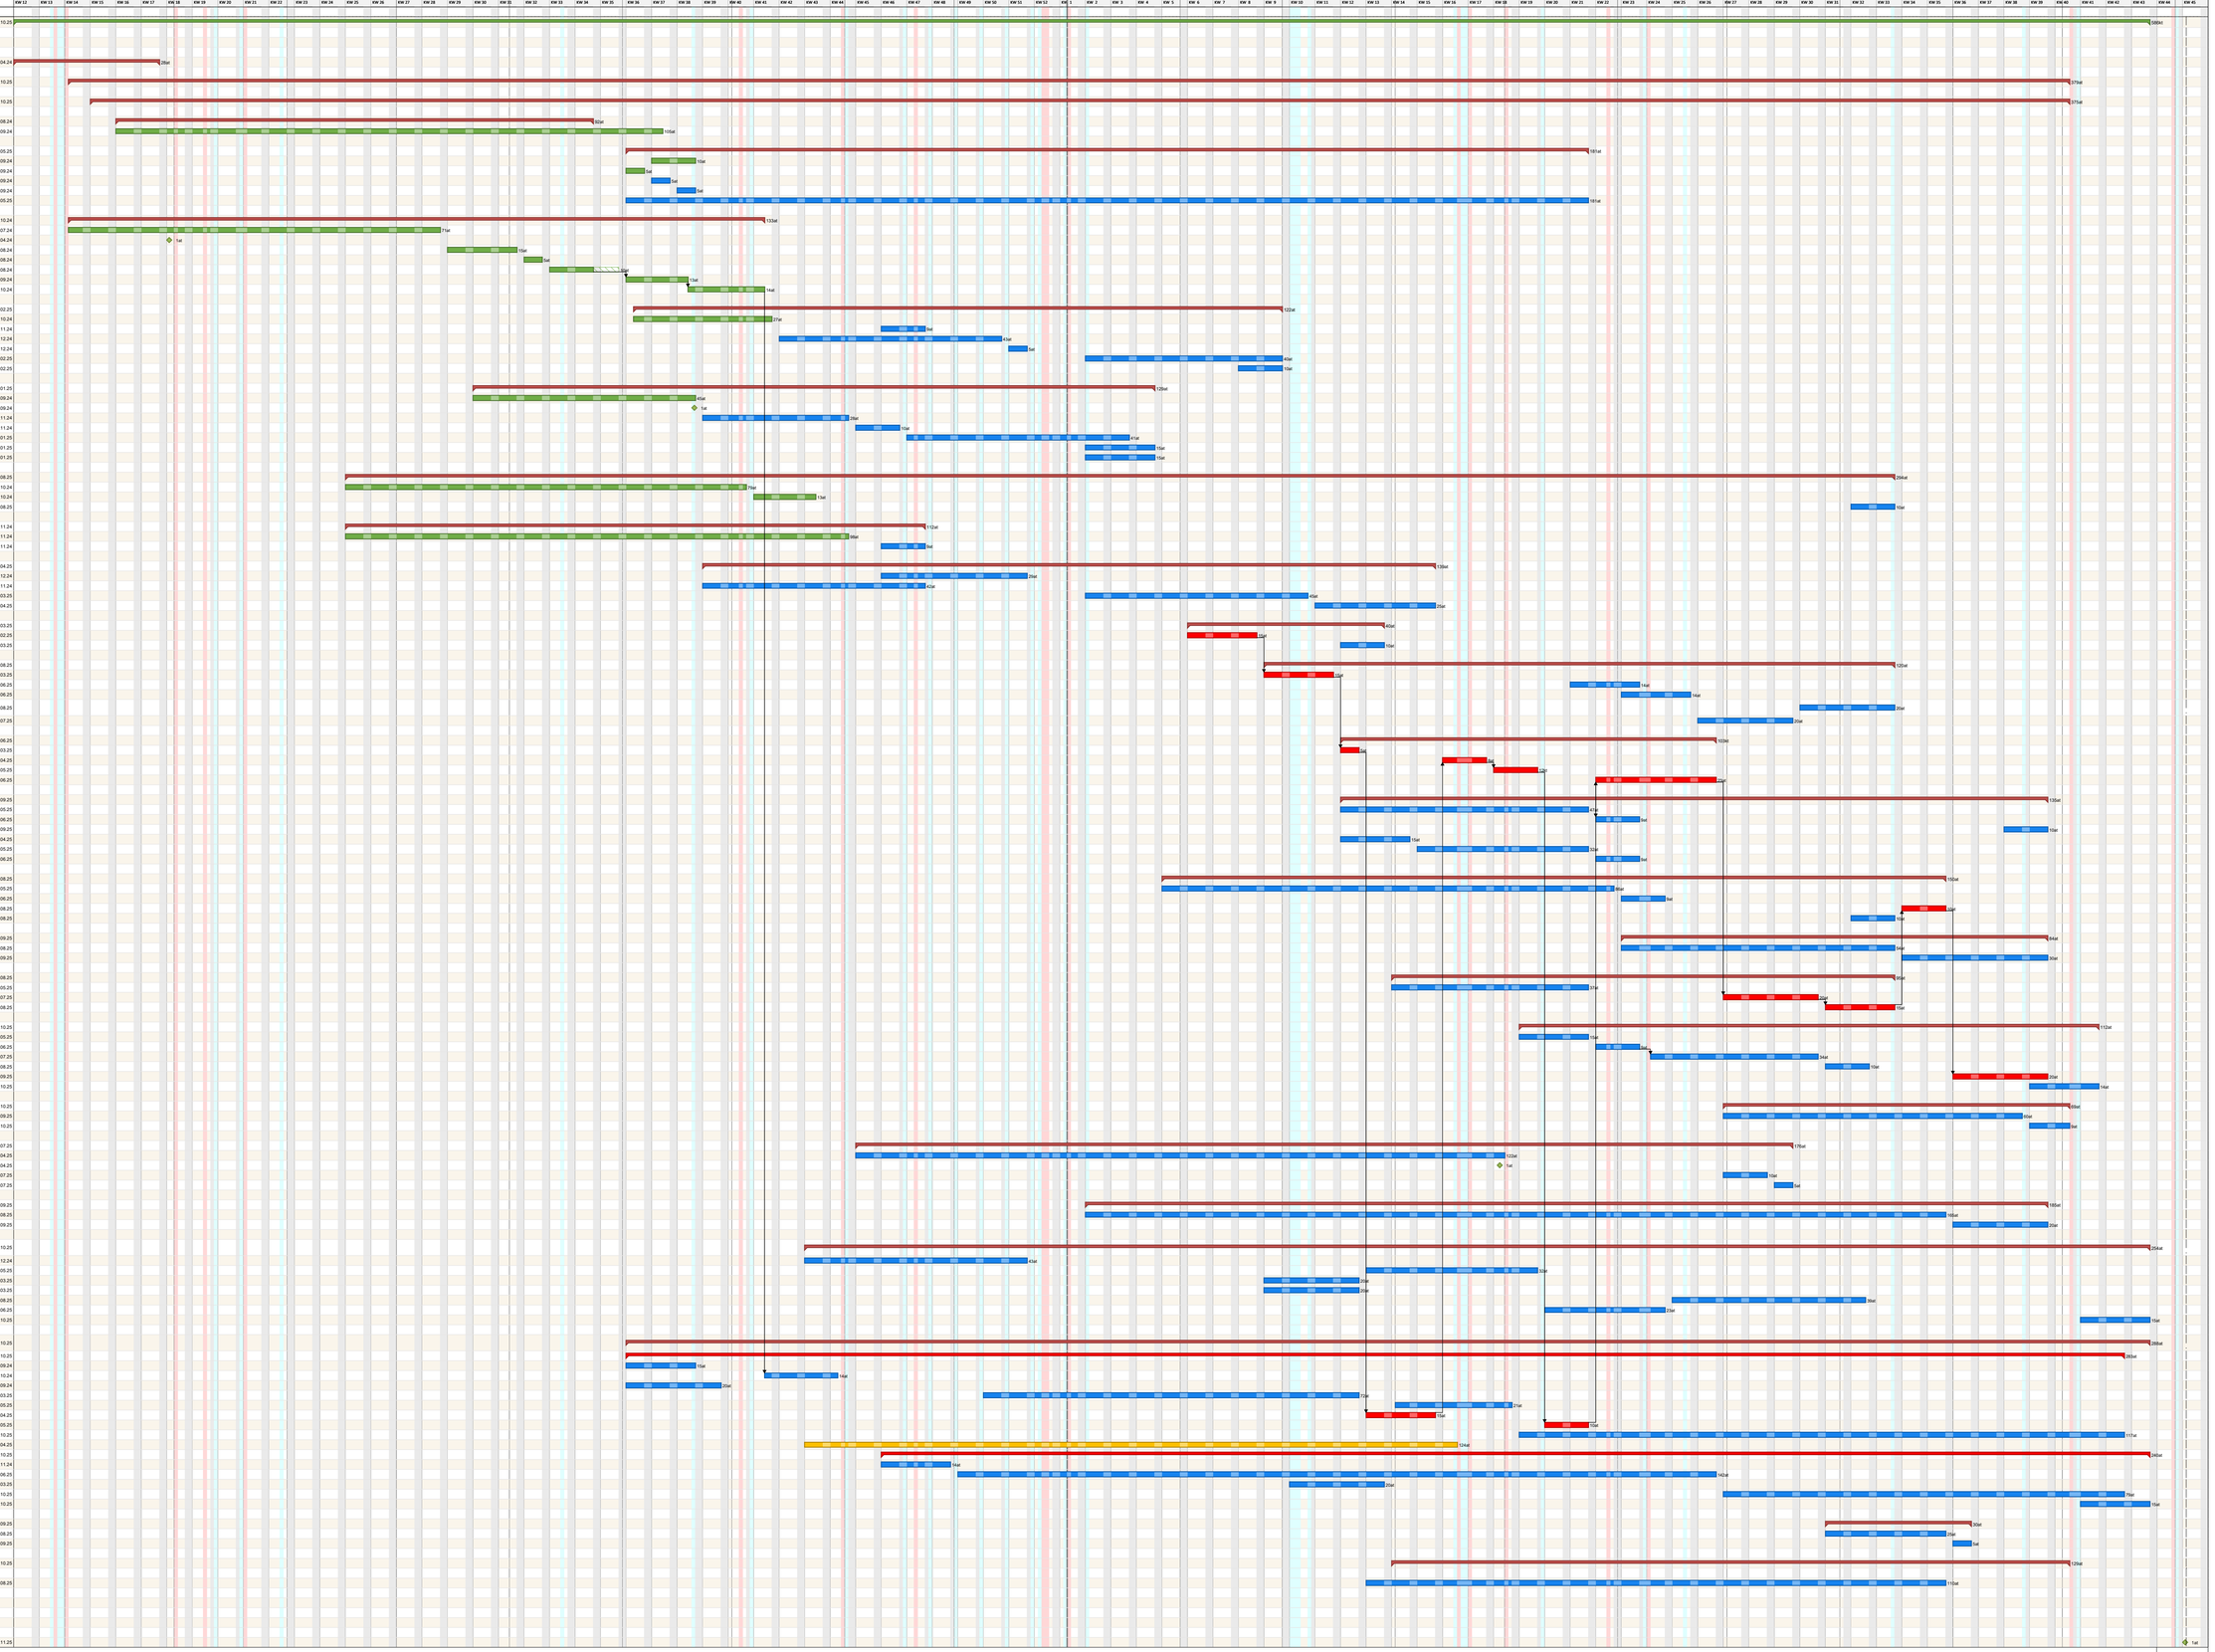

Projektzeitrahmen von Mo, 18.03.24 bis So, 30.11.25
Kalender: Sachsen (angepaßt)
Druckdatum: 18.11.2024 10:18
Bearbeiter: uar

Kritischer Weg | Istmtag | Kritischer Weg | Heutetag

Neundorfer Straße 2
Burkt
Tel. +49 3681 448860
Fax +49 3681 448832
