Termin- und Ablaufplan

Ersatzneubau Freibad Norden-Norddeich
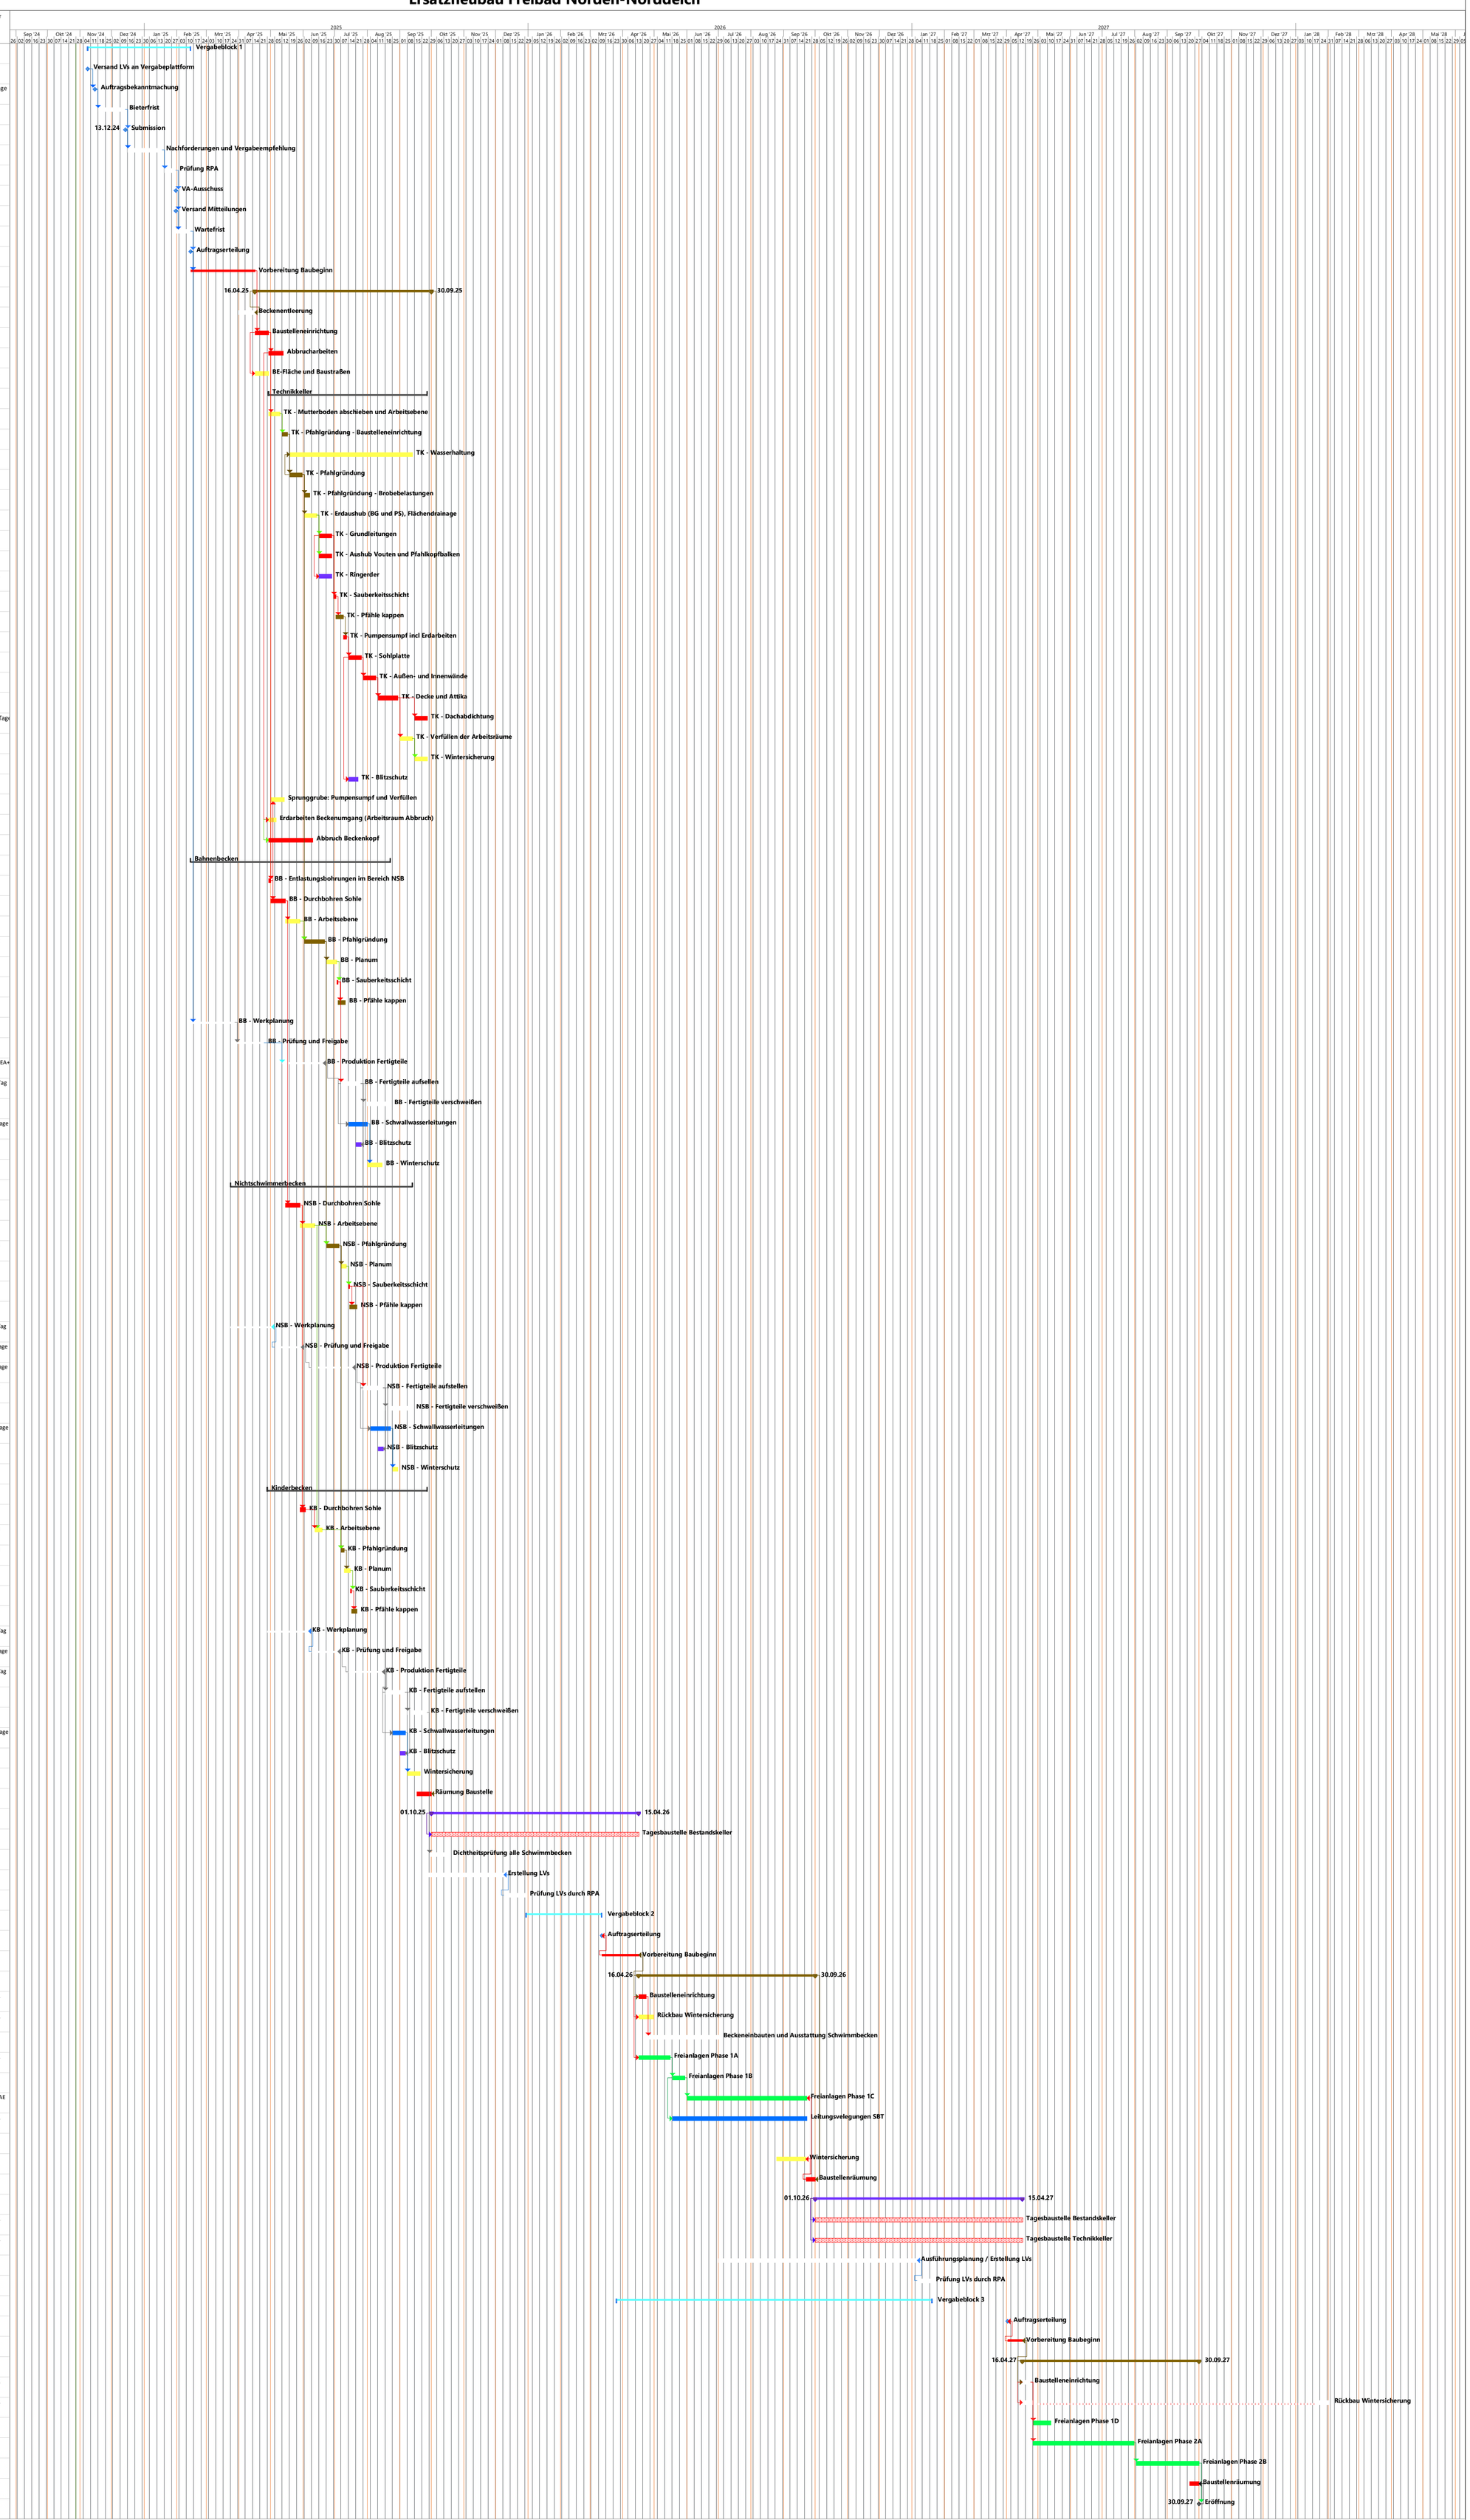
Nr.	Vor	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1		Vergabeblock 1	60 Tage	Fre 08.11.24	Don 13.02.25	
2		Versand LVs an Vergabeplattform	0 Tage	Fre 08.11.24	Fre 08.11.24	
3		Auftragsbekanntmachung	0 Tage	Fre 15.11.24	Fre 15.11.24	2EA+5 Tage
4		Bieterfrist	20 Tage	Mon 18.11.24	Fre 13.12.24	3
5		Submission	0 Tage	Fre 13.12.24	Fre 13.12.24	4
6		Nachforderungen und Vergabeempfehlung	15 Tage	Mon 16.12.24	Fre 17.01.25	5
7		Prüfung RPA	9 Tage	Mon 20.01.25	Don 30.01.25	6
8		VA-Ausschuss	0 Tage	Don 30.01.25	Don 30.01.25	7
9		Versand Mitteilungen	0 Tage	Don 30.01.25	Don 30.01.25	8
10		Wartefrist	10 Tage	Fre 31.01.25	Don 13.02.25	9
11		Auftragserteilung	0 Tage	Don 13.02.25	Don 13.02.25	10
12		Vorbereitung Baubeginn	43 Tage	Fre 14.02.25	Die 15.04.25	11
13		Bauphase 2025	120 Tage	Mit 16.04.25	Die 30.09.25	
14		Beckenentleerung	12 Tage	Mon 31.03.25	Mit 16.04.25	13AE
15		Baustelleneinrichtung	9 Tage	Mit 16.04.25	Mon 28.04.25	12
16		Abbrucharbeiten	10 Tage	Die 29.04.25	Mon 12.05.25	15
17		BE-Fläche und Baustraßen	9 Tage	Mit 16.04.25	Mon 28.04.25	15AA
18		**Technikkeller**	**109 Tage**	**Die 29.04.25**	**Fre 26.09.25**	
19		TK - Mutterboden abschieben und Arbeitsebene	9 Tage	Die 29.04.25	Fre 09.05.25	15
20		TK - Pfahlgründung - Baustelleneinrichtung	5 Tage	Mon 12.05.25	Fre 16.05.25	19
21		TK - Wasserhaltung	85 Tage	Mon 19.05.25	Fre 12.09.25	22AA
22		TK - Pfahlgründung	10 Tage	Mon 19.05.25	Fre 30.05.25	20
23		TK - Pfahlgründung - Brobebelastungen	5 Tage	Mon 02.06.25	Fre 06.06.25	22
24		TK - Erdaushub (BG und PS), Flächendrainage	10 Tage	Mon 02.06.25	Fre 13.06.25	22
25		TK - Grundleitungen	10 Tage	Mon 16.06.25	Fre 27.06.25	24
26		TK - Aushub Vouten und Pfahlkopfbalken	10 Tage	Mon 16.06.25	Fre 27.06.25	24
27		TK - Ringerder	10 Tage	Mon 16.06.25	Fre 27.06.25	25AA
28		TK - Sauberkeitsschicht	2 Tage	Mon 30.06.25	Die 01.07.25	25
29		TK - Pfähle kappen	5 Tage	Mit 02.07.25	Die 08.07.25	28
30		TK - Pumpensumpf incl Erdarbeiten	3 Tage	Mit 09.07.25	Fre 11.07.25	29
31		TK - Sohlplatte	10 Tage	Mon 14.07.25	Fre 25.07.25	30
32		TK - Außen- und Innenwände	10 Tage	Mon 28.07.25	Fre 08.08.25	31
33		TK - Decke und Attika	15 Tage	Mon 11.08.25	Fre 29.08.25	32
34		TK - Dachabdichtung	10 Tage	Mon 15.09.25	Fre 26.09.25	i3EA+10 Tage
35		TK - Verfüllen der Arbeitsräume	10 Tage	Mon 01.09.25	Fre 12.09.25	33
36		TK - Wintersicherung	10 Tage	Mon 15.09.25	Fre 26.09.25	35
37		TK - Blitzschutz	7 Tage	Mon 14.07.25	Die 22.07.25	31AA
38		Sprunggrube: Pumpensumpf und Verfüllen	9 Tage	Don 01.05.25	Die 13.05.25	42
39		Erdarbeiten Beckenumgang (Arbeitsraum Abbruch)	5 Tage	Die 29.04.25	Mon 05.05.25	16AA
40		Abbruch Beckenkopf	30 Tage	Die 29.04.25	Mon 09.06.25	39AA
41		**Bahnenbecken**	**136 Tage?**	**Fre 14.02.25**	**Fre 22.08.25**	
42		BB - Entlastungsbohrungen im Bereich NSB	2 Tage	Die 29.04.25	Mit 30.04.25	15
43		BB - Durchbohren Sohle	10 Tage	Don 01.05.25	Mit 14.05.25	42
44		BB - Arbeitsebene	10 Tage	Don 15.05.25	Mit 28.05.25	43
45		BB - Pfahlgründung	15 Tage	Mon 02.06.25	Fre 20.06.25	44;22
46		BB - Planum	8 Tage	Mon 23.06.25	Mit 02.07.25	45
47		BB - Sauberkeitsschicht	1 Tag?	Don 03.07.25	Don 03.07.25	46
48		BB - Pfähle kappen	5 Tage	Fre 04.07.25	Don 10.07.25	47
49		BB - Werkplanung	30 Tage	Fre 14.02.25	Don 27.03.25	11
50		BB - Prüfung und Freigabe	20 Tage	Fre 28.03.25	Don 24.04.25	49
51		BB - Produktion Fertigteile	29 Tage	Mon 12.05.25	Fre 20.06.25	1 Tage;50EA+
52		BB - Fertigteile aufsellen	15 Tage	Mon 07.07.25	Fre 25.07.25	47EA+1 Tag
53		BB - Fertigteile verschweißen	20 Tage	Mon 28.07.25	Fre 22.08.25	52
54		BB - Schwallwasserleitungen	14 Tage	Mon 14.07.25	Don 31.07.25	52AA+5 Tage
55		BB - Blitzschutz	5 Tage	Mon 21.07.25	Fre 25.07.25	52EE
56		BB - Winterschutz	10 Tage	Fre 01.08.25	Don 14.08.25	54
57		**Nichtschwimmerbecken**	**125 Tage**	**Mon 24.03.25**	**Fre 12.09.25**	
58		NSB - Durchbohren Sohle	10 Tage	Don 15.05.25	Mit 28.05.25	43
59		NSB - Arbeitsebene	10 Tage	Don 29.05.25	Mit 11.06.25	58
60		NSB - Pfahlgründung	10 Tage	Mon 23.06.25	Fre 04.07.25	59;45
61		NSB - Planum	5 Tage	Mon 07.07.25	Fre 11.07.25	60
62		NSB - Sauberkeitsschicht	1 Tag	Mon 14.07.25	Mon 14.07.25	61
63		NSB - Pfähle kappen	5 Tage	Die 15.07.25	Mon 21.07.25	62
64		NSB - Werkplanung	29 Tage	Mon 24.03.25	Fre 02.05.25	65AE-1 Tag
65		NSB - Prüfung und Freigabe	19 Tage	Mon 05.05.25	Fre 30.05.25	66AE-6 Tage
66		NSB - Produktion Fertigteile	29 Tage	Mon 09.06.25	Fre 18.07.25	67AE-6 Tage
67		NSB - Fertigteile aufstellen	15 Tage	Mon 28.07.25	Fre 15.08.25	62;52
68		NSB - Fertigteile verschweißen	20 Tage	Mon 18.08.25	Fre 12.09.25	67
69		NSB - Schwallwasserleitungen	15 Tage	Mon 04.08.25	Fre 22.08.25	67AA+5 Tage
70		NSB - Blitzschutz	5 Tage	Mon 11.08.25	Fre 15.08.25	67EE
71		NSB - Winterschutz	5 Tage	Mon 25.08.25	Fre 29.08.25	69
72		**Kinderbecken**	**110 Tage**	**Mon 28.04.25**	**Fre 26.09.25**	
73		KB - Durchbohren Sohle	3 Tage	Don 29.05.25	Mon 02.06.25	58
74		KB - Arbeitsebene	5 Tage	Don 12.06.25	Mit 18.06.25	59;73
75		KB - Pfahlgründung	3 Tage	Mon 07.07.25	Mit 09.07.25	74;60
76		KB - Planum	4 Tage	Don 10.07.25	Die 15.07.25	75
77		KB - Sauberkeitsschicht	1 Tag	Mit 16.07.25	Mit 16.07.25	76
78		KB - Pfähle kappen	3 Tage	Don 17.07.25	Mon 21.07.25	77
79		KB - Werkplanung	29 Tage	Mon 28.04.25	Fre 06.06.25	80AE-1 Tag
80		KB - Prüfung und Freigabe	19 Tage	Mon 09.06.25	Fre 04.07.25	81AE-6 Tage
81		KB - Produktion Fertigteile	24 Tage	Mon 14.07.25	Fre 15.08.25	82AE-1 Tag
82		KB - Fertigteile aufstellen	15 Tage	Mon 18.08.25	Fre 05.09.25	67
83		KB - Fertigteile verschweißen	15 Tage	Mon 08.09.25	Fre 26.09.25	82
84		KB - Schwallwasserleitungen	10 Tage	Mon 25.08.25	Fre 05.09.25	82AA+5 Tage
85		KB - Blitzschutz	5 Tage	Mon 01.09.25	Fre 05.09.25	82EE
86		Wintersicherung	10 Tage	Mon 08.09.25	Fre 19.09.25	84
87		Räumung Baustelle	10 Tage	Mit 17.09.25	Die 30.09.25	13EE
88		Winterphase 2025/2026	141 Tage	Mit 01.10.25	Mit 15.04.26	
89		Tagesbaustelle Bestandskeller	141 Tage	Mit 01.10.25	Mit 15.04.26	88AA
90		Dichtheitsprüfung alle Schwimmbecken	15 Tage	Mon 29.09.25	Fre 17.10.25	83
91		Erstellung LVs	55 Tage	Die 23.09.25	Die 09.12.25	92AE
92		Prüfung LVs durch RPA	15 Tage	Die 09.12.25	Die 30.12.25	94AE
93		Vergabeblock 2	52 Tage	Die 30.12.25	Don 12.03.26	
103		Auftragserteilung	0 Tage	Don 12.03.26	Don 12.03.26	104AE
104		Vorbereitung Baubeginn	25 Tage	Don 12.03.26	Don 16.04.26	105AE
105		Bauphase 2026	120 Tage	Don 16.04.26	Mit 30.09.26	
106		Baustelleneinrichtung	5 Tage	Don 16.04.26	Mit 22.04.26	105AA
107		Rückbau Wintersicherung	10 Tage	Don 16.04.26	Mit 29.04.26	106AA
108		Beckeneinbauten und Ausstattung Schwimmbecken	50 Tage	Don 23.04.26	Mit 01.07.26	106
109		Freianlagen Phase 1A	22 Tage	Don 16.04.26	Fre 15.05.26	106AA
110		Freianlagen Phase 1B	10 Tage	Mon 18.05.26	Fre 29.05.26	109
111		Freianlagen Phase 1C	82 Tage	Mon 01.06.26	Die 22.09.26	110;115AE
112		Leitungsvelegungen SBT	92 Tage	Mon 18.05.26	Die 22.09.26	110AA
113		Elektro + Blitzschutz	78 Tage	Die 21.03.23	Don 06.07.23	
114		Wintersicherung	20 Tage	Die 25.08.26	Die 22.09.26	115AE
115		Baustellenräumung	7 Tage	Die 22.09.26	Mit 30.09.26	105EE
116		Winterphase 2026/2027	141 Tage	Don 01.10.26	Don 15.04.27	
117		Tagesbaustelle Bestandskeller	141 Tage	Don 01.10.26	Don 15.04.27	116AA
118		Tagesbaustelle Technikkeller	141 Tage	Don 01.10.26	Don 15.04.27	116AA
119		Ausführungsplanung / Erstellung LVs	135 Tage	Mit 01.07.26	Mit 06.01.27	120AE
120		Prüfung LVs durch RPA	10 Tage	Mit 06.01.27	Mit 20.01.27	122AE
121		Vergabeblock 3	214 Tage	Don 26.03.26	Mit 20.01.27	
131		Auftragserteilung	0 Tage	Mon 08.06.26	Fre 02.04.27	132AE
132		Vorbereitung Baubeginn	10 Tage	Fre 02.04.27	Fre 16.04.27	133AE
133		Bauphase 2027	120 Tage	Fre 16.04.27	Don 30.09.27	
134		Baustelleneinrichtung	6 Tage	Fre 16.04.27	Fre 23.04.27	133AA
135		Rückbau Wintersicherung	20 Tage	Fre 16.04.27	Mit 02.02.28	134AA
136		Freianlagen Phase 1D	13 Tage	Mon 26.04.27	Mit 12.05.27	134
137		Freianlagen Phase 2A	70 Tage	Mon 26.04.27	Fre 30.07.27	134
138		Freianlagen Phase 2B	44 Tage	Mon 02.08.27	Don 30.09.27	137
139		Baustellenräumung	7 Tage	Mit 22.09.27	Don 30.09.27	140EE
140		Eröffnung	0 Tage	Don 30.09.27	Don 30.09.27	138
