Stadt Harzgerode

Neubau Lehrschwimmbad

Rahmenterminplan Ausführung - Version 14.11.24 - spn

Nr.	VE	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
0		**Neubau Lehrschwimmbad**	**817 t?**	**Mon 17.04.23**	**Don 02.07.26**
1					
2		**Planung der PLANUNG**	**574 t?**	**Mon 17.04.23**	**Fre 11.07.25**
3		**LP 1 + 2 Grundlagenermittlung, Vorplanung**	**55 t**	**Mon 17.04.23**	**Fre 30.06.23**
11		**LP 3 Entwurfsplanung**	**105 t**	**Mon 03.07.23**	**Fre 24.11.23**
18		**LP 4 Genehmigungsplanung**	**90 t?**	**Mon 27.11.23**	**Fre 29.03.24**
25		**Baugenehmigungsverfahren BOA**	**80 t**	**Fre 09.02.24**	**Fre 31.05.24**
29		**Genehmigungsverfahren Fördermittel**	**140 t**	**Mon 05.02.24**	**Fre 16.08.24**
37		**LP 5 Ausführungsplanung (Achtung/ Risiko: Beginn vorfristig mit Freigabe Entwurf!)**	**90 t?**	**Mon 06.05.24**	**Fre 06.09.24**
66		**LP 6 Vorbereitung der Vergabe**	**50 t**	**Don 25.07.24**	**Mit 02.10.24**
87		**LP 7 Mitwirkung bei der Vergabe**	**159 t**	**Mon 18.11.24**	**Fre 11.07.25**
170		**Planung der AUSFÜHRUNG**	**412 t**	**Mon 04.11.24**	**Don 02.07.26**
171		**Vorbereitende Arbeiten**	**65 t**	**Mon 04.11.24**	**Mon 17.02.25**
172		Busch- und Baumrodung	65 t	Mon 04.11.24	Mon 17.02.25
173		**Baufeldfreimachung, Absteckung, Erdbau, Wasserhaltung**	**340 t**	**Mon 17.02.25**	**Mon 22.06.26**
174	VE 01	Bustelleneinrichtung inkl. Vorhaltung	340 t	Mon 17.02.25	Mon 22.06.26
175	VE 02	Baustelleinrichtung Rohbau	6 t	Mon 03.03.25	Mon 10.03.25
176	VE 02	Baufeldfreimachung + Absteckung	10 t	Mon 03.03.25	Fre 14.03.25
177	VE 02	Erster Spatenstich	0 t	Fre 14.03.25	Fre 14.03.25
178	VE 02	Erdbau	5 t	Mon 17.03.25	Fre 21.03.25
179	VE 02	Wasserhaltung	30 t	Mon 17.03.25	Fre 25.04.25
180	**VE 02**	**Rohbau**	**100 t**	**Mon 17.03.25**	**Fre 01.08.25**
181	VE 02	Verbau KG	5 t	Mon 17.03.25	Fre 21.03.25
182	VE 02	Gründung KG als Weiße-Wanne (inkl. Grundleitungen)	20 t	Mon 24.03.25	Fre 18.04.25
183	VE 02	Dampfsperre KG	5 t	Mon 07.04.25	Fre 11.04.25
184	VE 02	Wände KG	15 t	Mon 21.04.25	Fre 09.05.25
185	VE 02	Auffüllung bis UK EG	5 t	Mon 12.05.25	Fre 16.05.25
186	VE 02	Decke KG	10 t	Mon 19.05.25	Fre 30.05.25
187	VE 02	Gründung nicht KG (inkl. Grundleitungen)	10 t	Mon 19.05.25	Fre 30.05.25
188	VE 02	Außenwände	30 t	Mon 02.06.25	Fre 11.07.25
189	VE 02	Innenwände	30 t	Mon 02.06.25	Fre 11.07.25
190	VE 02	Decken	15 t	Mon 14.07.25	Fre 01.08.25
191		Richtfest	0 t	Fre 15.08.25	Fre 15.08.25
192	**VE 06**	**Holzbau**	**20 t**	**Mon 11.08.25**	**Fre 05.09.25**
193	VE 06	Holz Dachbinder	10 t	Mon 11.08.25	Fre 22.08.25
194	VE 06	Dachdeckung	10 t	Mon 25.08.25	Fre 05.09.25
195	**VE 04**	**Gerüstbau**	**174 t**	**Mon 11.08.25**	**Fre 24.04.26**
196	VE 04	Fassdengerüst/Dachfanggerüst inkl. Vorhaltezeit	65 t	Mon 11.08.25	Fre 07.11.25
197	VE 04	Gitterträger Einbringöffnung	5 t	Mon 01.09.25	Fre 05.09.25
198	VE 04	Raumgerüst inkl. Vorhaltezeit	60 t	Mon 17.11.25	Mon 23.02.26
199	VE 04	zusätzliche Innengerüste inkl. Vorhaltezeit	84 t	Mon 15.12.25	Fre 24.04.26
200	**VE 07**	**Dachdecker**	**20 t**	**Mon 25.08.25**	**Fre 19.09.25**
201	VE 07	Dampfsperre/Notabdichtung/Notüberlauf	10 t	Mon 25.08.25	Fre 05.09.25
202	VE 07	Dämmung	10 t	Mon 08.09.25	Fre 19.09.25
203	VE 07	finale Abdichtung	10 t	Mon 08.09.25	Fre 19.09.25
204	**VE 08**	**Metallbauer**	**134 t**	**Mon 11.08.25**	**Fre 27.02.26**
205	VE 08	Fenster (ohne Einbringöffnung)	10 t	Mon 11.08.25	Fre 22.08.25
206	VE 08	Fenster Einbringöffnung	5 t	Mon 29.09.25	Fre 03.10.25
207	VE 08	Sonnenschutz	35 t	Mon 18.08.25	Fre 03.10.25
208	VE 08	Systemtrennwand Alu/Glas	15 t	Mon 09.02.26	Fre 27.02.26
209	**VE 19**	**Edelstahlschwimmbecken**	**50 t**	**Mon 08.09.25**	**Fre 14.11.25**
210	**VE 18**	**Schwimmbadtechnik**	**50 t**	**Mon 08.09.25**	**Fre 14.11.25**
211		**Fassadenbau, Unterkonstruktionen, Dämmungen, WDVS**	**55 t**	**Mon 18.08.25**	**Fre 31.10.25**
212	VE 11	Fassade Teilfläche - WDVS Fassadenverkleidung	55 t	Mon 18.08.25	Fre 31.10.25
213	VE 06	Fassade Teilfläche - Holz-Fassadenverkleidung	55 t	Mon 18.08.25	Fre 31.10.25
214		**Gebäudehülle dicht**	**0 t**	**Fre 31.10.25**	**Fre 31.10.25**
215		**nichttechnischer Ausbau**	**225 t**	**Mon 04.08.25**	**Mon 29.06.26**
216	VE 10	Trockenbauarbeiten	174 t	Mon 08.09.25	Fre 22.05.26
217	VE 09	Estrich	15 t	Mon 17.11.25	Fre 05.12.25
218	VE 03	Innenputzarbeiten	50 t	Mon 01.12.25	Mon 23.02.26
219	VE 11	Malerarbeiten	199 t	Mon 04.08.25	Fre 22.05.26
220	VE 13	Fliesenbauarbeiten	50 t	Mon 09.02.26	Fre 17.04.26
221	VE 14	Bodenbelag	83 t	Mit 07.01.26	Fre 01.05.26
222	VE 11	Bodenbeschichtung	83 t	Mit 07.01.26	Fre 01.05.26
223	VE 12	Tischler	20 t	Mon 20.04.26	Fre 15.05.26
224	**VE 05**	**Stahlbau- u. Schlosser**	**80 t**	**Mon 25.08.25**	**Fre 12.12.25**
225	VE 05	Dachbühne	15 t	Mon 08.09.25	Fre 26.09.25
226	VE 05	Schlosser-, Stahlbauleistung	30 t	Mon 29.09.25	Fre 07.11.25
227	VE 05	Außentüren	15 t	Mon 25.08.25	Fre 12.09.25
228	VE 05	Innentüren	10 t	Mon 01.12.25	Fre 12.12.25
229	VE 12	Beschilderung	10 t	Mon 23.03.26	Fre 03.04.26
230	VE 12	Schließanlage	10 t	Die 24.03.26	Mon 06.04.26
231	VE 15	Baureinigung	165 t	Mon 08.09.25	Mon 11.05.26
232	VE 15	Feinreinigung	30 t	Die 19.05.26	Mon 29.06.26
233		**TGA**	**170 t**	**Mon 08.09.25**	**Mon 18.05.26**
234	VE 16	Heizung	150 t	Mon 08.09.25	Mon 20.04.26
235	VE 17	Lüftung	150 t	Mon 06.10.25	Mon 18.05.26
236	VE 17	MSR	150 t	Mon 06.10.25	Mon 18.05.26
237	VE 16	Sanitär	150 t	Mon 06.10.25	Mon 18.05.26
238	VE 20	Elektroinstallationen	160 t	Mon 08.09.25	Mon 04.05.26
239		**Freianlagenbau**	**218 t**	**Mon 18.08.25**	**Don 02.07.26**
240		Anbindung SW	10 t	Mon 18.08.25	Fre 29.08.25
241		Außenanlagen	30 t	Fre 15.05.26	Don 25.06.26
242		**Technische Zustandsfeststellungen und Mängelbeseitigungen**	**40 t**	**Die 05.05.26**	**Mon 29.06.26**
243		**Inbetriebnahmen und Probebetrieb, Abnahmen**	**31 t**	**Die 19.05.26**	**Die 30.06.26**
244		**Übergabe an Nutzer**	**0 t**	**Die 30.06.26**	**Die 30.06.26**

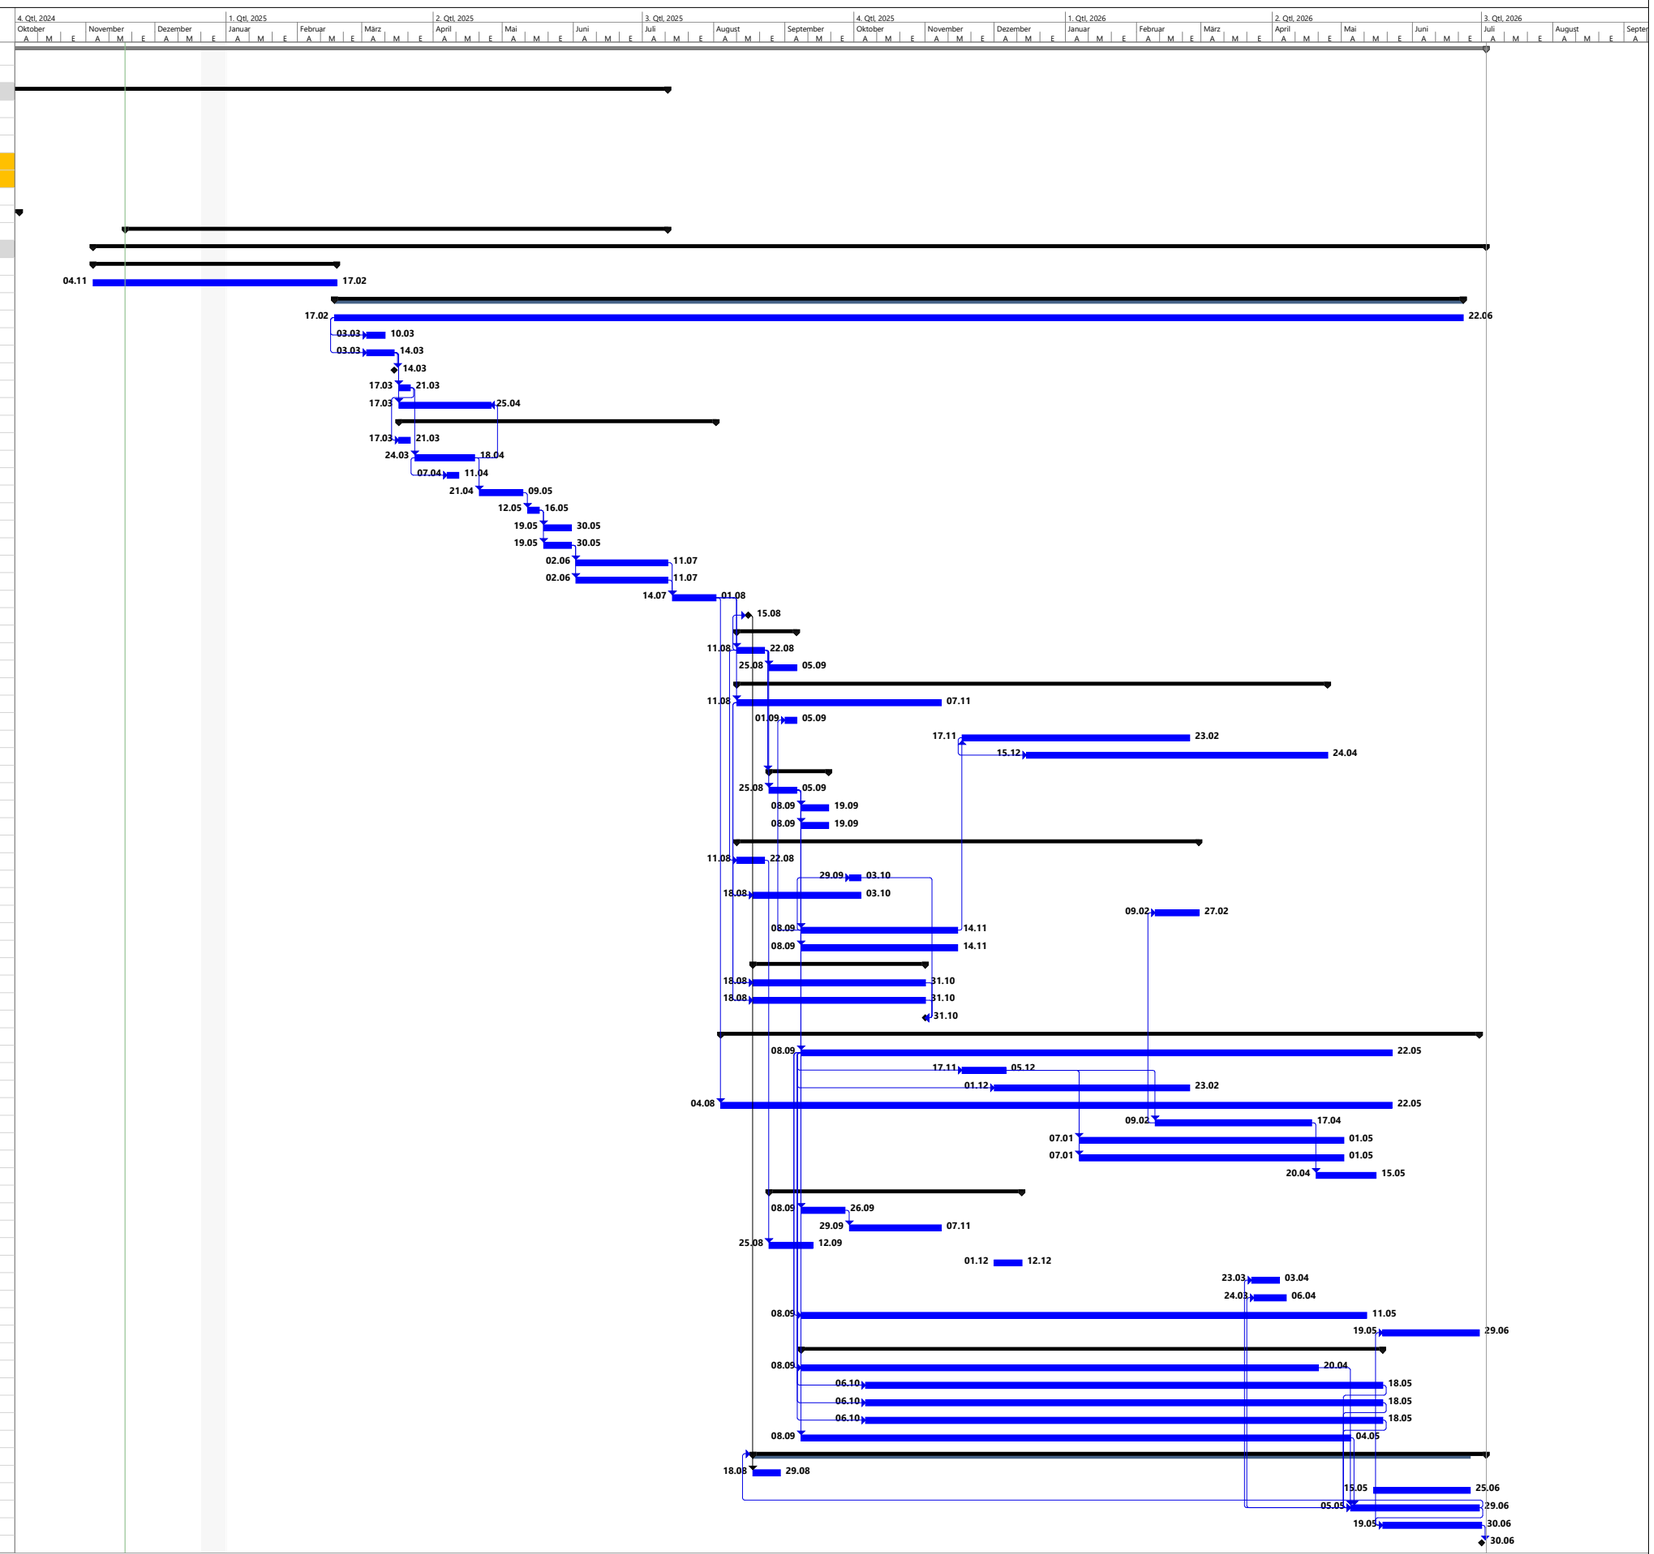

Stand: 14.11.24
