Neubau Grundschule Döbeln Ost
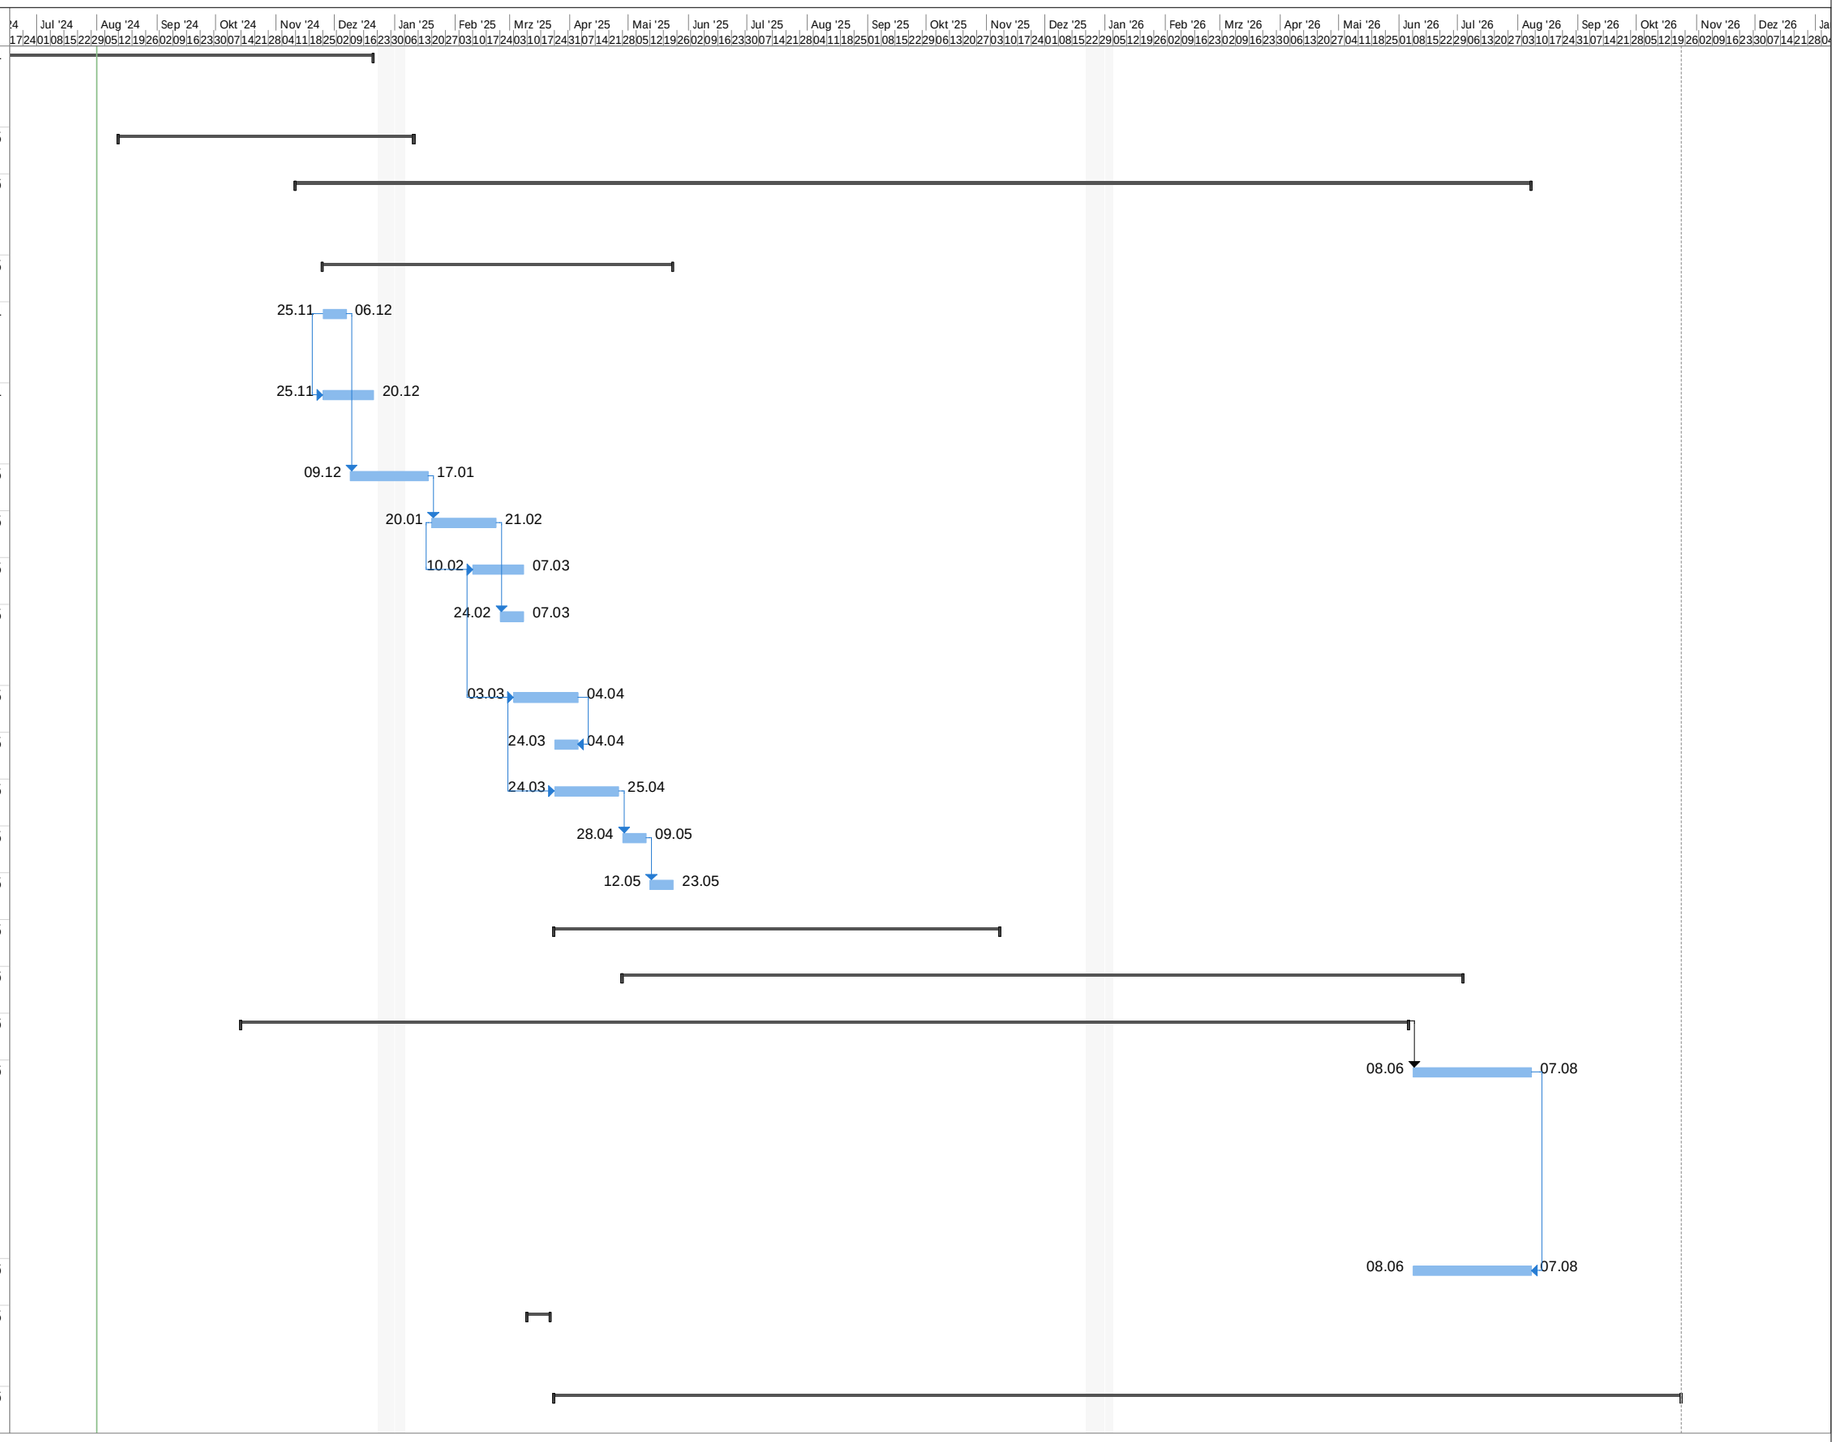
Nr.	Vorgang	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1		Vorbereitende Arbeiten, Medienanbindungen	291 Tage	Fre 10.11.23	Fre 20.12.24
21		Erdarbeiten Baugrube	100 Tage	Mon 12.08.24	Fre 10.01.25
26		Baustelleneinrichtung allgemein	435 Tage	Mon 11.11.24	Fre 07.08.26
30		Rohbau	120 Tage	Mon 25.11.24	Fre 23.05.25
31		Baustelleneinrichtung Gewerk	2 Wochen	Mon 25.11.24	Fre 06.12.24
32		Fundamentbalken, Aufzugsunterfahrt	4 Wochen	Mon 25.11.24	Fre 20.12.24
33		Bodenplatte	4 Wochen	Mon 09.12.24	Fre 17.01.25
34		Wände EG	5 Wochen	Mon 20.01.25	Fre 21.02.25
35		Decke EG	4 Wochen	Mon 10.02.25	Fre 07.03.25
36		Sockelabdichtung, Dämmung im Erdreich	2 Wochen	Mon 24.02.25	Fre 07.03.25
37		Wände OG	5 Wochen	Mon 03.03.25	Fre 04.04.25
38		Gerätesockel Technik	2 Wochen	Mon 24.03.25	Fre 04.04.25
39		Decke OG	5 Wochen	Mon 24.03.25	Fre 25.04.25
40		Attiken	2 Wochen	Mon 28.04.25	Fre 09.05.25
41		Beräumung, Auschalen	2 Wochen	Mon 12.05.25	Fre 23.05.25
42		Gerüstbau	165 Tage	Mon 24.03.25	Fre 07.11.25
45		Gebäudehülle	300 Tage	Mon 28.04.25	Fre 03.07.26
57		Innenausbau	410 Tage	Mon 14.10.24	Fre 05.06.26
124		Nacharbeiten, Komplettierung, Inbetriebnahmen, Mangelbeseitigung, Abnahmen	9 Wochen	Mon 08.06.26	Fre 07.08.26
125		Möblierung, Ausstattung	9 Wochen	Mon 08.06.26	Fre 07.08.26
126		Erdarbeiten, Rest aus Los Erschließung / Erdarbeiten	10 Tage	Mon 10.03.25	Fre 21.03.25
128		Außenanlagen	405 Tage	Mon 24.03.25	Fre 23.10.26
