Nr.		Vorgangsnr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger
1			Neubau Jugendherberge Markkleebarg	1204 Tage	Fre 20.05.22	Don 31.12.26		
2			Projektbeginn	0 Tage	Fre 20.05.22	Fre 20.05.22		4
3			Planungsphase	528 Tage	Fre 20.05.22	Die 28.05.24		
4			LP 1 + 2 - Vorplanung	3,8 Monate	Fre 20.05.22	Fre 02.09.22	2	5
5			LP 3 - Entwurfsplanung	4,75 Monate	Mon 05.09.22	Fre 13.01.23	4	6;8EA+5 Tage
6			Übergabe LP 3 + Zuwendungsunterlagen	0 Tage	Die 17.01.23	Die 17.01.23	5	7EA+1 Tag
7			Bearbeitungszeit FöMi	65 Tage	Mon 22.05.23	Fre 18.08.23	6EA+1 Tag	
8			Integrationsplanung LP 3 /besondere Planungsleistungen	50 Tage	Mon 23.01.23	Fre 31.03.23	5EA+5 Tage	9
9			LP 4 - Genehmigungsplanung	1 Monat	Mon 03.04.23	Fre 28.04.23	8	10EA+7 Tage
10			Einreichung Bauantrag	0 Tage	Die 09.05.23	Die 09.05.23	9EA+7 Tage	11;13
11			Bearbeitungszeit Bauantrag	3,5 Monate	Mit 10.05.23	Die 15.08.23	10	
12			Baugenehmigung	0 Tage	Fre 06.10.23	Fre 06.10.23		19
13			LP 5 - Ausführungsplanung	5 Monate	Mit 10.05.23	Die 26.09.23	10	14EA-35 Tage
14			LP 6 + 7 - Vergabe	10,5 Monate	Mit 09.08.23	Die 28.05.24	13EA-35 Tage	
15			Versand LV BE	0 Tage	Fre 06.10.23	Fre 06.10.23		
16			Versand LV Rohbau	0 Tage	Mon 30.10.23	Mon 30.10.23		
17			Bauphase	600 Tage	Mon 05.02.24	Fre 22.05.26		
18			Bauzeit	600 Tage	Mon 05.02.24	Fre 22.05.26		18D
19			Baubeginn	0 Tage	Mon 05.02.24	Mon 05.02.24	12	20
20			Los 301 Baustelleneinrichtung + Baufeldfreimachung	4 Wochen	Mon 05.02.24	Fre 01.03.24	19	21EE;28
21			Los 302 Bauschild	5 Tage	Mon 26.02.24	Fre 01.03.24	20EE	
22			Los 408/9 Seethermieanlage	340 Tage	Mon 29.04.24	Fre 15.08.25		
23			Abschnitt 1 Horizontalbohrung	20 Tage	Mon 29.04.24	Fre 24.05.24	32EE-20 Tage	24
24			Abschnitt 2 Verteilerschacht	20 Tage	Mon 26.05.25	Fre 20.06.25	23	25
25			Abschnitt 3 Seewasser Wärmetauscher	40 Tage	Mon 23.06.25	Fre 15.08.25	24	26
26			Funktionsprüfung Wärmeerzeuger	10 Tage	Mon 18.08.25	Fre 29.08.25	77;25	
27			Los 303 Erdi / Rohbauarbeiten, Kampfmittelsondierung	389 Tage	Mon 04.03.24	Don 28.08.25		
28			Aushub Baugrube	6 Wochen	Mon 04.03.24	Fre 12.04.24	20	
29			Grundleitungen, Fundamenterder (BA1)	1 Woche	Mon 25.03.24	Fre 29.03.24		
30			Grundleitungen, Fundamenterder (BA 2)	1 Woche	Mon 08.04.24	Fre 12.04.24		
31			Grundleitungen, Fundamenterder (BA 4)	1 Woche	Mon 20.05.24	Fre 24.05.24		
32			Bodenplatte (BA 1, 2 und 4)	10 Wochen	Mon 15.04.24	Fre 21.06.24		23EE-20 Tage
33			KG (BA 1, 2, 3 und 4); Wände/Stützen/Treppen/Decke/ Abdichtung	16 Wochen	Mon 06.05.24	Fre 23.08.24		37
34			GL außerhalb des Gebäude (Nordhaus)	4,5 Wochen	Mon 27.05.24	Mit 26.06.24		35;36
35			GL außerhalb des Gebäude (Südhaus)	4,5 Wochen	Mit 26.06.24	Fre 26.07.24	34	38;37
36			Verfüllung Baugrube (Nordhaus)	2 Wochen	Mon 15.07.24	Fre 26.07.24	34	37
37			Verfüllung Baugrube (Verbinder)	2 Wochen	Mon 26.08.24	Fre 06.09.24	36;35;33	38
38			Verfüllung Baugrube (Südhaus)	2 Wochen	Mon 09.09.24	Fre 20.09.24	37;35	
39			EG (BA 1, 2 und 3); Wände/Stützen/Treppen/Decke	12 Wochen	Mon 22.07.24	Fre 11.10.24		
40			1.OG BA 1 (Nordhaus); Wände/Stützen/Treppen/Decke	8 Wochen	Mon 23.09.24	Fre 15.11.24		
41			1.OG BA 2 (Südhaus); Wände/Stützen/Treppen/Decke	7 Wochen	Mon 28.10.24	Fre 13.12.24		
42			2.OG BA 1 (Nordhaus); Wände/Stützen/Treppen/Decke	9 Wochen	Mon 11.11.24	Fre 10.01.25		54;61EA-5 Tage
43			2.OG BA 2 (Südhaus); Wände/Stützen/Treppen/Decke	9 Wochen	Mon 09.12.24	Fre 07.02.25		
44			Giebel Nord	1 Woche	Mon 13.01.25	Fre 17.01.25		
45			Giebel Süd	1 Woche	Mon 10.02.25	Fre 14.02.25		
46			Los 304 Gerüst	264 Tage	Mon 26.08.24	Don 28.08.25		
47			Aufbau	40 Tage	Mon 26.08.24	Fre 18.10.24		51
48			BA 1 (Nordhaus)	10 Tage	Mon 26.08.24	Fre 06.09.24		49
49			BA 2 (Mittelhaus)	10 Tage	Mon 09.09.24	Fre 20.09.24	48	50
50			BA 3 (Südhaus)	10 Tage	Mon 07.10.24	Fre 18.10.24	49	
51			Abbau	5 Tage	Fre 22.08.25	Don 28.08.25	47	177
52			BA 1, 2 und 3	5 Tage	Fre 22.08.25	Don 28.08.25	62;69;70;56	
53			Los 305 Zimmerer- und Holzarbeiten	30 Tage	Mon 13.01.25	Fre 21.02.25		
54			BA 1(Nordhaus); Dachstuhl	3 Wochen	Mon 13.01.25	Fre 31.01.25	42	55;57;58
55			BA 2 (Südhaus); Dachstuhl	3 Wochen	Mon 03.02.25	Fre 21.02.25	54	
56			Los 306 Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten	55 Tage	Mon 03.02.25	Fre 18.04.25		52
57			BA 1(Nordhaus); Dachabdichtung	3 Wochen	Mon 03.02.25	Fre 21.02.25	54	58;70;76EA+1 Tag
58			BA 2 (Südhaus); Dachabdichtung	3 Wochen	Mon 24.02.25	Fre 14.03.25	57;54	59
59			BA 1, 2 und 3; Dachbegrünung (ext.), Kies, PV-Anlage	5 Wochen	Mon 17.03.25	Fre 18.04.25	58	
60			Los 307 Kunststoff-Fensterelemente	40 Tage	Mon 06.01.25	Fre 28.02.25		70
61			BA 1, 2 und 3; KG	10 Tage	Mon 06.01.25	Fre 17.01.25	42EA-5 Tage	62
62			BA 1, 2 und 3; EG	10 Tage	Mon 20.01.25	Fre 31.01.25	61	63;65AA;52
63			BA 1 und 3; 1.OG	10 Tage	Mon 03.02.25	Fre 14.02.25	62	64
64			BA 1 und 3; 2.OG	10 Tage	Mon 17.02.25	Fre 28.02.25	63	67;68
65			Los 308 Alu-Fensterelemente/ Alu-Rlt-Türen Innen u. Außen	20 Tage	Mon 20.01.25	Fre 14.02.25	62AA	66
66			Los 314 Brandschutzschiebetor	3 Tage	Mon 17.02.25	Mit 19.02.25	65	
67			Los 310 Wärmedämm-Verbundsysteme	10 Wochen	Mon 03.03.25	Fre 09.05.25	64	
68			Los 311 Vorgehängte hinterlüftete Fassaden	20 Wochen	Mon 03.03.25	Fre 18.07.25	64	
69			Los 312 Trockenbau	106 Tage	Mon 03.03.25	Mon 28.07.25		52
70			BA 1, 2 und 3; KG und EG Ständerwerk einseitig beplankt	5 Tage	Mon 03.03.25	Fre 07.03.25	60;57	71;52
71			BA 1 und 3; 1.OG Ständerwerk einseitig beplankt	3 Wochen	Mon 10.03.25	Fre 28.03.25	70	72
72			BA 1 und 3; 2.OG Ständerwerk einseitig beplankt	3 Wochen	Mon 31.03.25	Fre 18.04.25	71	
73			BA 1 und 3; 2.OG TB-Wände+Decken Schließen + Finish	3 Wochen	Die 29.04.25	Mon 19.05.25	78	
74			BA 1 und 3; 1.OG TB-Wände+Decken Schließen + Finish	3 Wochen	Die 20.05.25	Mon 09.06.25	79	
75			BA 1, 2 und 3; KG und EG TB-Wände+Decken Schließen + Finish	2 Wochen	Die 15.07.25	Mon 28.07.25	80	
76			Trassenbau HLSE	40 Tage	Die 25.02.25	Mon 21.04.25	57EA+1 Tag	78EA-20 Tage;81EA-20 Tage
77			Los 402/3 Rohrinstallation HLS	80 Tage	Die 25.03.25	Mon 14.07.25		87;26
78			BA 1 und 3 2. OG	25 Tage	Die 25.03.25	Mon 28.04.25	76EA-20 Tage	79EA-10 Tage;73
79			BA 1 und 3 1. OG	25 Tage	Die 15.04.25	Mon 19.05.25	78EA-10 Tage	80EA-10 Tage;74
80			BA 1,2 und 3; KG und EG	50 Tage	Die 06.05.25	Mon 14.07.25	79EA-10 Tage	75
81			Los 404 Rohrinstallation ELT	80 Tage	Die 25.03.25	Mon 14.07.25		87
82			BA 1 und 3 2. OG	25 Tage	Die 25.03.25	Mon 28.04.25	76EA-20 Tage	83EA-10 Tage
83			BA 1 und 3 1. OG	25 Tage	Die 15.04.25	Mon 19.05.25	82EA-10 Tage	84EA-10 Tage
84			BA 1,2 und 3; KG und EG	50 Tage	Die 06.05.25	Mon 14.07.25	83EA-10 Tage	

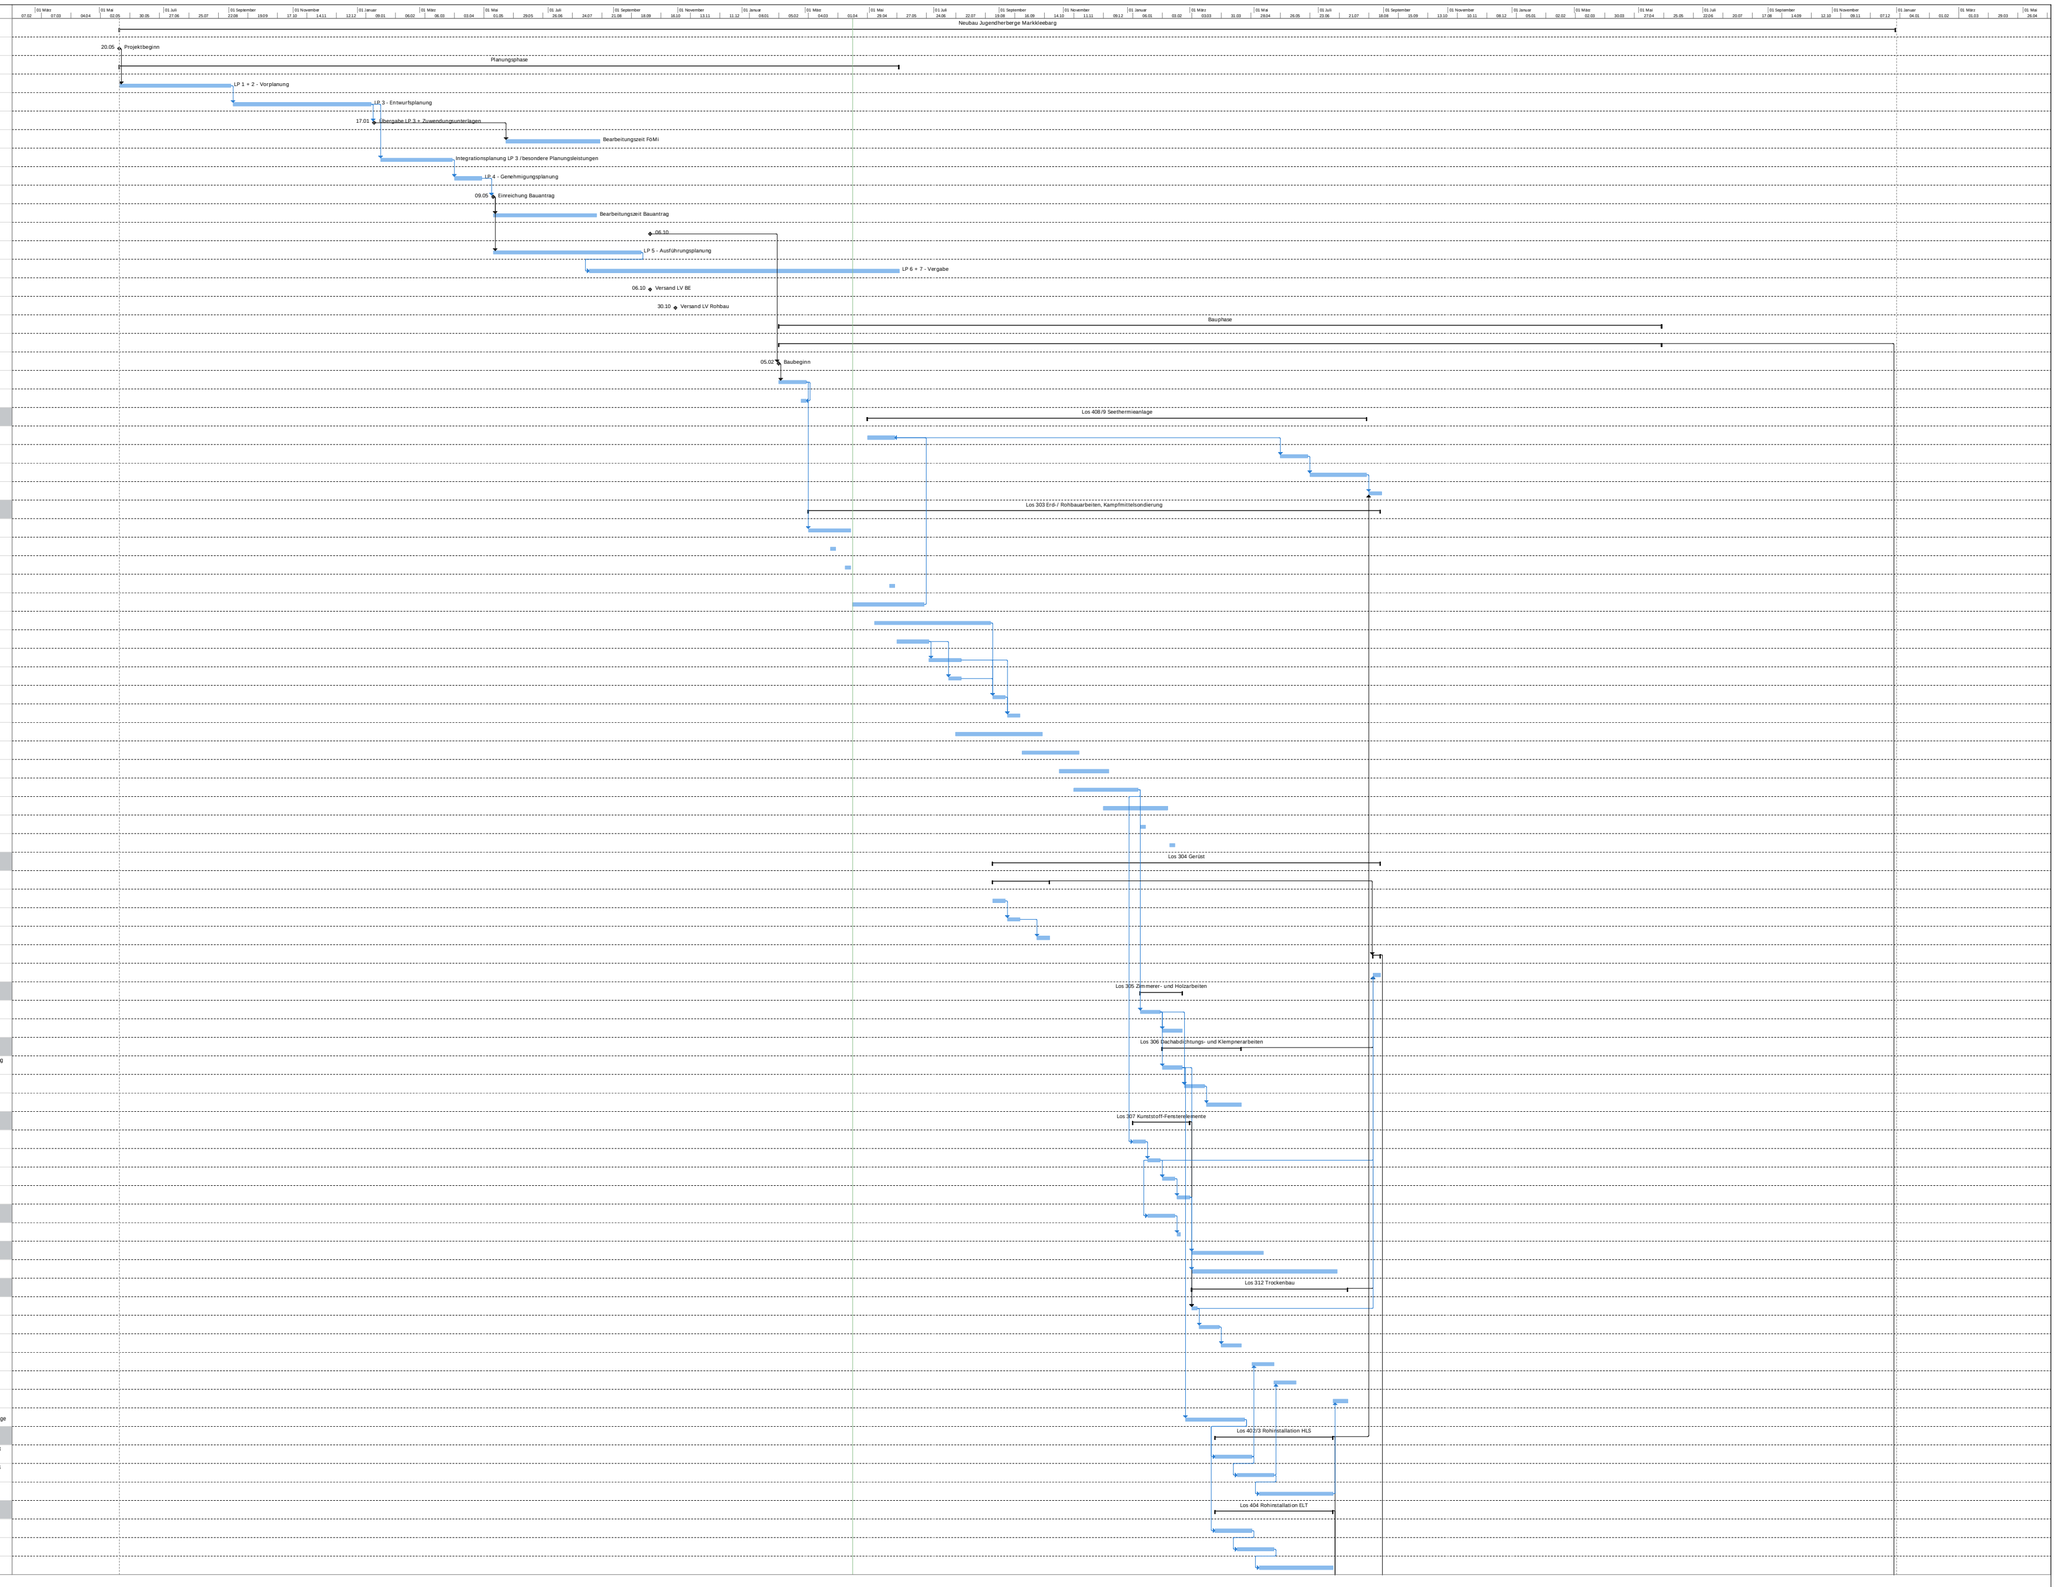

Projekt: 23/2705_JHM_Rahmen
Datum: Mon 15.04.24

Vorgang | Unterbrechung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Vorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Manueller Sammelvorgang | Nur Anfang | Nur Ende | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Stichtag | In Arbeit | Manueller Fortschritt

Nr.		Vorgangsnummer	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger
85			Los 313 Estricharbeiten	52 Tage	Die 15.07.25	Mit 24.09.25		121
86			BA 1; 2.OG	23 Tage	Die 15.07.25	Don 14.08.25		124
87			Verlegung TSD	2 Tage	Die 15.07.25	Mit 16.07.25	77;81	88;92
88			Verlegung Fußbodenheizung	5 Tage	Don 17.07.25	Mit 23.07.25	87	89;93
89			Einbau Estrich	2 Tage	Don 24.07.25	Fre 25.07.25	88	90EA+4 Tage
90			aufheizen	10 Tage	Fre 01.08.25	Don 14.08.25	89EA+4 Tage	
91			BA 1; 1.OG	26 Tage	Don 17.07.25	Don 21.08.25		125
92			Verlegung TSD	2 Tage	Don 17.07.25	Fre 18.07.25	87	97
93			Verlegung Fußbodenheizung	5 Tage	Don 24.07.25	Mit 30.07.25	88	94;98
94			Einbau Estrich	2 Tage	Don 31.07.25	Fre 01.08.25	93	95EA+4 Tage
95			aufheizen	10 Tage	Fre 08.08.25	Don 21.08.25	94EA+4 Tage	
96			BA 1 und 2; EG	36 Tage	Mon 21.07.25	Mon 08.09.25		
97			Verlegung TSD	3 Tage	Mon 21.07.25	Mit 23.07.25	92	102
98			Verlegung Fußbodenheizung	10 Tage	Don 31.07.25	Mit 13.08.25	93	103;99
99			Einbau Estrich	4 Tage	Don 14.08.25	Die 19.08.25	98	100EA+4 Tage
100			aufheizen	10 Tage	Die 26.08.25	Mon 08.09.25	99EA+4 Tage	
101			BA 1; KG	36 Tage	Don 24.07.25	Don 11.09.25		
102			Verlegung TSD	2 Tage	Don 24.07.25	Fre 25.07.25	97	107
103			Verlegung Fußbodenheizung	5 Tage	Don 14.08.25	Mit 20.08.25	98	104;108
104			Einbau Estrich	2 Tage	Don 21.08.25	Fre 22.08.25	103	105EA+4 Tage
105			aufheizen	10 Tage	Fre 29.08.25	Don 11.09.25	104EA+4 Tage	
106			BA 2; 2.OG	39 Tage	Mon 28.07.25	Don 18.09.25		
107			Verlegung TSD	2 Tage	Mon 28.07.25	Die 29.07.25	102	112
108			Verlegung Fußbodenheizung	5 Tage	Don 21.08.25	Mit 27.08.25	103	109;113
109			Einbau Estrich	2 Tage	Don 28.08.25	Fre 29.08.25	108	114;110EA+4 Tage
110			aufheizen	10 Tage	Fre 05.09.25	Don 18.09.25	109EA+4 Tage	
111			BA 2; 1.OG	39 Tage	Mit 30.07.25	Mon 22.09.25		
112			Verlegung TSD	2 Tage	Mit 30.07.25	Don 31.07.25	107	117
113			Verlegung Fußbodenheizung	5 Tage	Don 28.08.25	Mit 03.09.25	108	118
114			Einbau Estrich	2 Tage	Mon 01.09.25	Die 02.09.25	109	119;115EA+4 Tage
115			aufheizen	10 Tage	Die 09.09.25	Mon 22.09.25	114EA+4 Tage	
116			BA 2; EG	39 Tage	Fre 01.08.25	Mit 24.09.25		
117			Verlegung TSD	2 Tage	Fre 01.08.25	Mon 04.08.25	112	
118			Verlegung Fußbodenheizung	5 Tage	Don 04.09.25	Mit 10.09.25	113	
119			Einbau Estrich	2 Tage	Mit 03.09.25	Don 04.09.25	114	120EA+4 Tage
120			aufheizen	10 Tage	Don 11.09.25	Mit 24.09.25	119EA+4 Tage	
121			Los 405 Aufzüge BA1	20 Tage	Don 25.09.25	Mit 22.10.25	85	122
122			Los 405 Aufzüge BA2	20 Tage	Don 23.10.25	Mit 19.11.25	121	
123			Los 316 Malerarbeiten	55 Tage	Fre 15.08.25	Don 30.10.25		
124			BA 1; 2.OG	15 Tage	Fre 15.08.25	Don 04.09.25	86	126;140;133;131;154
125			BA 1; 1.OG	15 Tage	Fre 22.08.25	Don 11.09.25	91	127;134;141
126			BA 1 und 2; EG	25 Tage	Fre 05.09.25	Don 09.10.25	124	128;135;142;156EA-6 Tage
127			BA 1 und 2; KG	20 Tage	Fre 12.09.25	Don 09.10.25	125	129;136;143
128			BA 2; 2.OG	15 Tage	Fre 10.10.25	Don 30.10.25	126	137;144
129			BA 2; 1.OG	15 Tage	Fre 10.10.25	Don 30.10.25	127	145
130			Los 315 Metallbau- und Schlosserarbeiten	20 Tage	Fre 05.09.25	Don 02.10.25		
131			TH 1-4	20 Tage	Fre 05.09.25	Don 02.10.25	124	
132			Los 319 Innentüren	54 Tage	Fre 05.09.25	Mit 19.11.25		
133			BA 1; 2.OG	7 Tage	Fre 05.09.25	Mon 15.09.25	124	140
134			BA 1; 1.OG	7 Tage	Fre 12.09.25	Mon 22.09.25	125	141
135			BA 1 und 2; EG	7 Tage	Fre 10.10.25	Mon 20.10.25	126	142
136			BA 1 und 2; KG	7 Tage	Fre 10.10.25	Mon 20.10.25	127	143
137			BA 2; 2.OG	7 Tage	Fre 31.10.25	Mon 10.11.25	128	138;144
138			BA 2; 1.OG	7 Tage	Die 11.11.25	Mit 19.11.25	137	145
139			Los 317 Fliesenarbeiten	62 Tage	Die 16.09.25	Mit 10.12.25		
140			BA 1; 2.OG	15 Tage	Die 16.09.25	Mon 06.10.25	124;133	147
141			BA 1; 1.OG	15 Tage	Die 23.09.25	Mon 13.10.25	125;134	148
142			BA 1 und 2; EG	25 Tage	Die 21.10.25	Mon 24.11.25	126;135	149
143			BA 1 und 2; KG	20 Tage	Die 21.10.25	Mon 17.11.25	127;136	150
144			BA 2; 2.OG	15 Tage	Die 11.11.25	Mon 01.12.25	128;137	151
145			BA 2; 1.OG	15 Tage	Don 20.11.25	Mit 10.12.25	129;138	152
146			Los 318 Bodenbelagsarbeiten	62 Tage	Die 07.10.25	Mit 31.12.25		
147			BA 1; 2.OG	15 Tage	Die 07.10.25	Mon 27.10.25	140	161
148			BA 1; 1.OG	15 Tage	Die 14.10.25	Mon 03.11.25	141	162
149			BA 1 und 2; EG	25 Tage	Die 25.11.25	Mon 29.12.25	142	163
150			BA 1 und 2; KG	20 Tage	Die 18.11.25	Mon 15.12.25	143	164
151			BA 2; 2.OG	15 Tage	Die 02.12.25	Mon 22.12.25	144	165
152			BA 2; 1.OG	15 Tage	Don 11.12.25	Mit 31.12.25	145	166

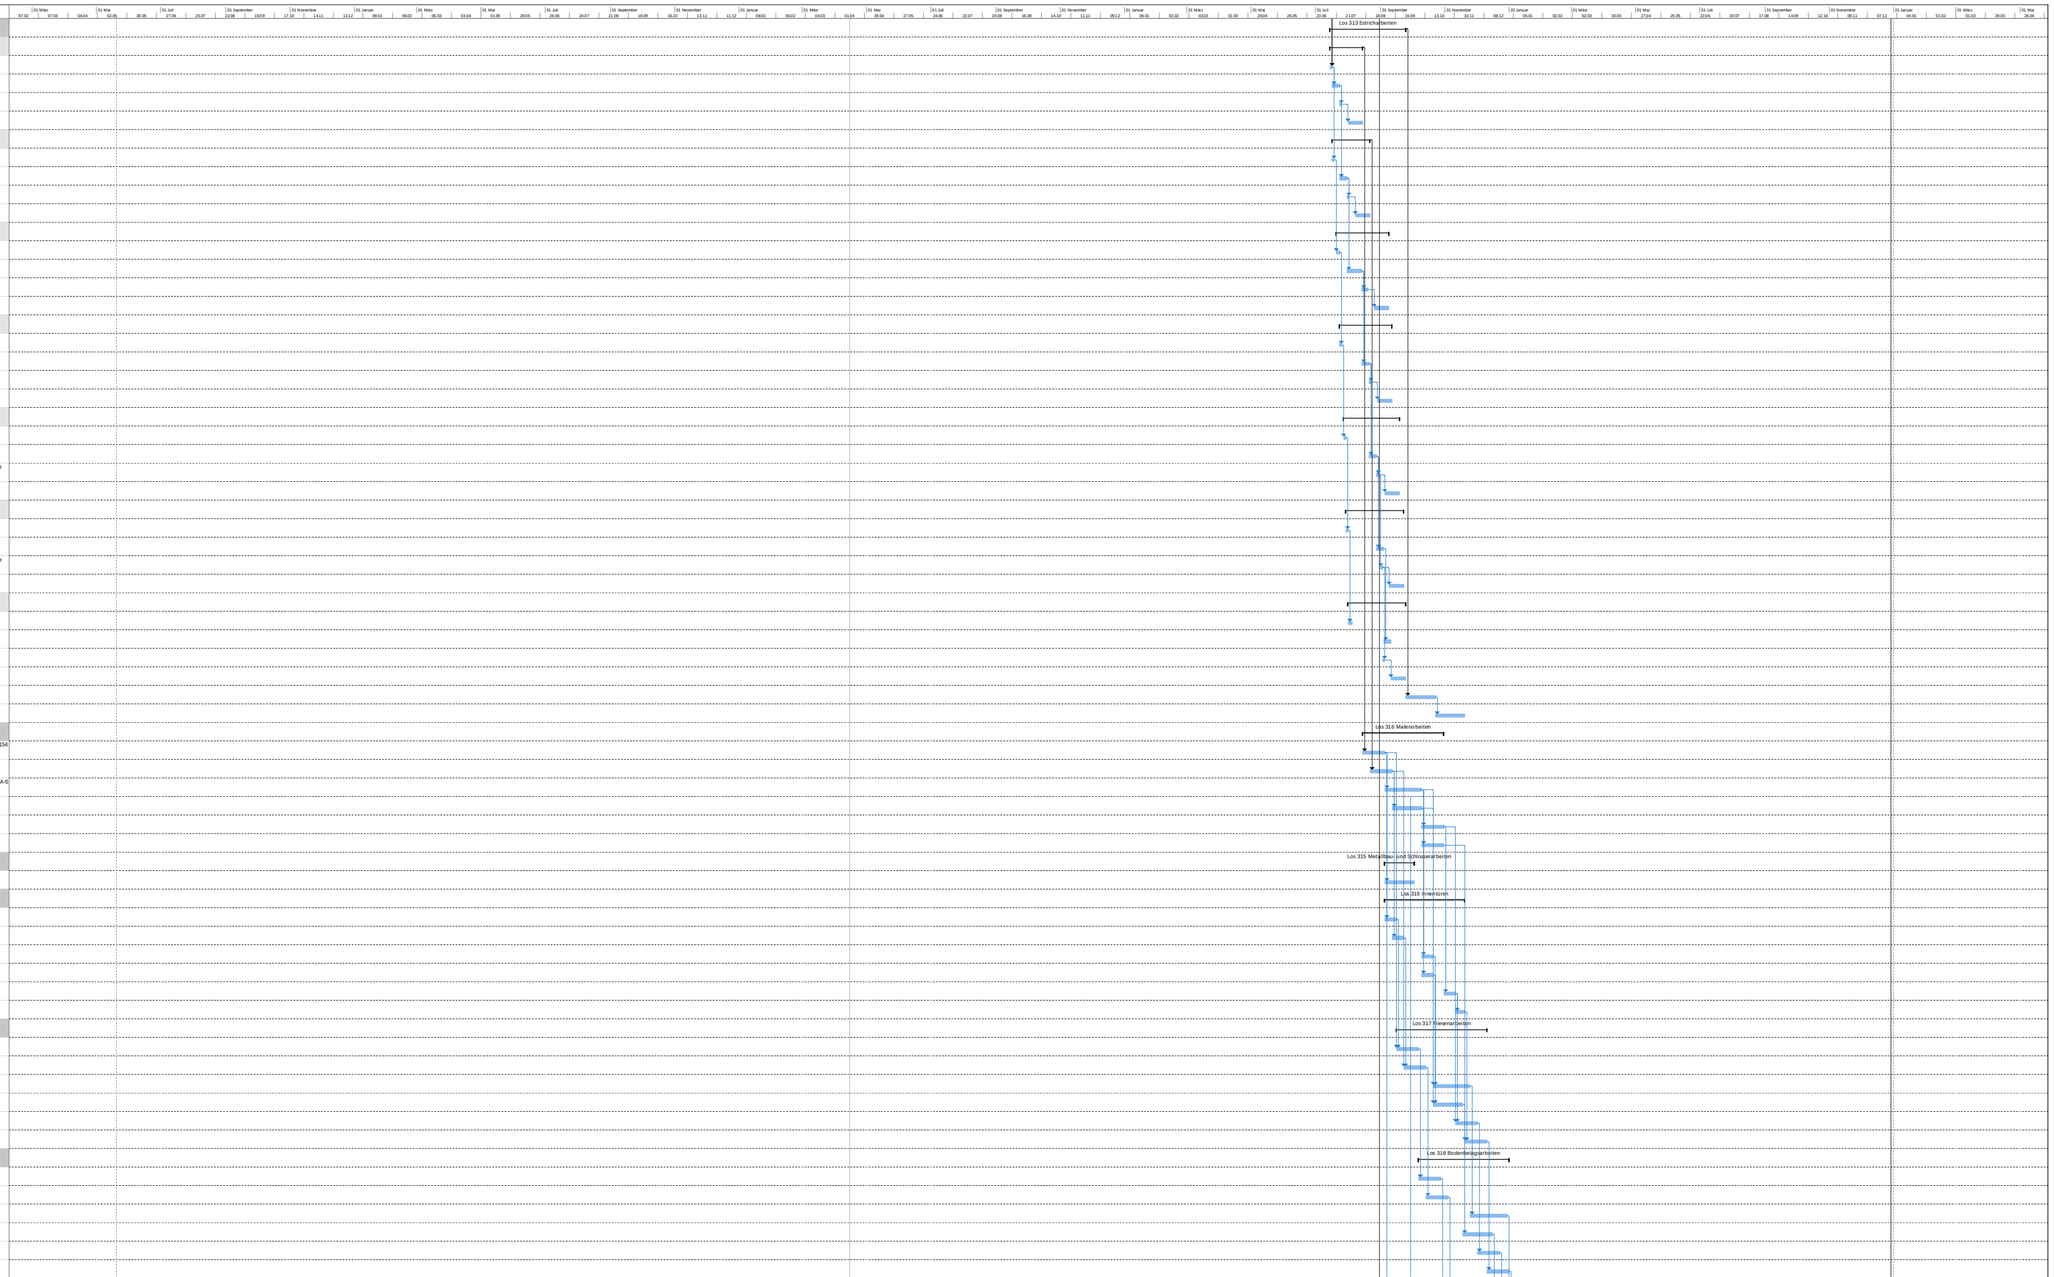

Projekt: 230705_JHM_Rahmen
Datum: Mon 15.04.24

Vorgang | Unterbrechung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Vorgang | Nur Dauer | Manueller Sammeldauer | Manueller Sammelvorgang | Nur Anfang | Nur Ende | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Stichtag | In Arbeit | Manueller Fortschritt

Nr.	Vorgangsnamen	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger
153	Los 402/3/4 Komplettierung HL/ELT	85 Tage	Fre 05.09.25	Don 01.01.26		174
154	BA 1; 2.OG	15 Tage	Fre 05.09.25	Don 25.09.25	124	155EA-5 Tage
155	BA 1; 1.OG	15 Tage	Fre 19.09.25	Don 09.10.25	154EA-5 Tage	
156	BA 1 und 2; EG	25 Tage	Fre 03.10.25	Don 06.11.25	126EA-5 Tage	157EA-5 Tage
157	BA 1 und 2; KG	25 Tage	Fre 31.10.25	Don 04.12.25	156EA-5 Tage	158EA-5 Tage
158	BA 2; 2.OG	15 Tage	Fre 28.11.25	Don 18.12.25	157EA-5 Tage	159EA-5 Tage
159	BA 2; 1.OG	15 Tage	Fre 12.12.25	Don 01.01.26	158EA-5 Tage	
160	Los 321 Grundreinigung	49 Tage	Die 28.10.25	Fre 02.01.26		
161	BA 1; 2.OG	2 Tage	Die 28.10.25	Mit 29.10.25	147	168
162	BA 1; 1.OG	2 Tage	Die 04.11.25	Mit 05.11.25	148	169
163	BA 1 und 2; EG	2 Tage	Die 30.12.25	Mit 31.12.25	149	170
164	BA 1 und 2; KG	2 Tage	Die 16.12.25	Mit 17.12.25	150	171
165	BA 2; 2.OG	2 Tage	Die 23.12.25	Mit 24.12.25	151	172
166	BA 2; 1.OG	2 Tage	Don 01.01.26	Fre 02.01.26	152	173
167	Los 402 Komplettierung Sanitär	57 Tage	Don 30.10.25	Fre 16.01.26		174
168	BA 1; 2.OG	10 Tage	Don 30.10.25	Mit 12.11.25	161	
169	BA 1; 1.OG	10 Tage	Don 06.11.25	Mit 19.11.25	162	
170	BA 1 und 2; EG	5 Tage	Don 01.01.26	Mit 07.01.26	163	
171	BA 1 und 2; KG	5 Tage	Don 18.12.25	Mit 24.12.25	164	
172	BA 2; 2.OG	10 Tage	Don 25.12.25	Mit 07.01.26	165	
173	BA 2; 1.OG	10 Tage	Mon 05.01.26	Fre 16.01.26	166	
174	Inbetriebnahme, SV-Abnahmen, Mangelbeseitigung	30 Tage	Mon 19.01.26	Fre 27.02.26	153;167	176EA-5 Tage;175EE
175	Los 321 Feinreinigung	10 Tage	Mon 16.02.26	Fre 27.02.26	174EE	
176	Los 320 Schließanlage	5 Tage	Mon 23.02.26	Fre 27.02.26	174EA-5 Tage	178
177	Los 500 Freianlagen	5,5 Monate	Fre 29.08.25	Don 29.01.26	51	178
178	Bauende	0 Tage	Fre 27.02.26	Fre 27.02.26	177;176	179
179	Abrechnung, Dokumentation	3 Monate	Mon 02.03.26	Fre 22.05.26	178	
180	Vorhabensende	0 Tage	Don 31.12.26	Don 31.12.26	18	

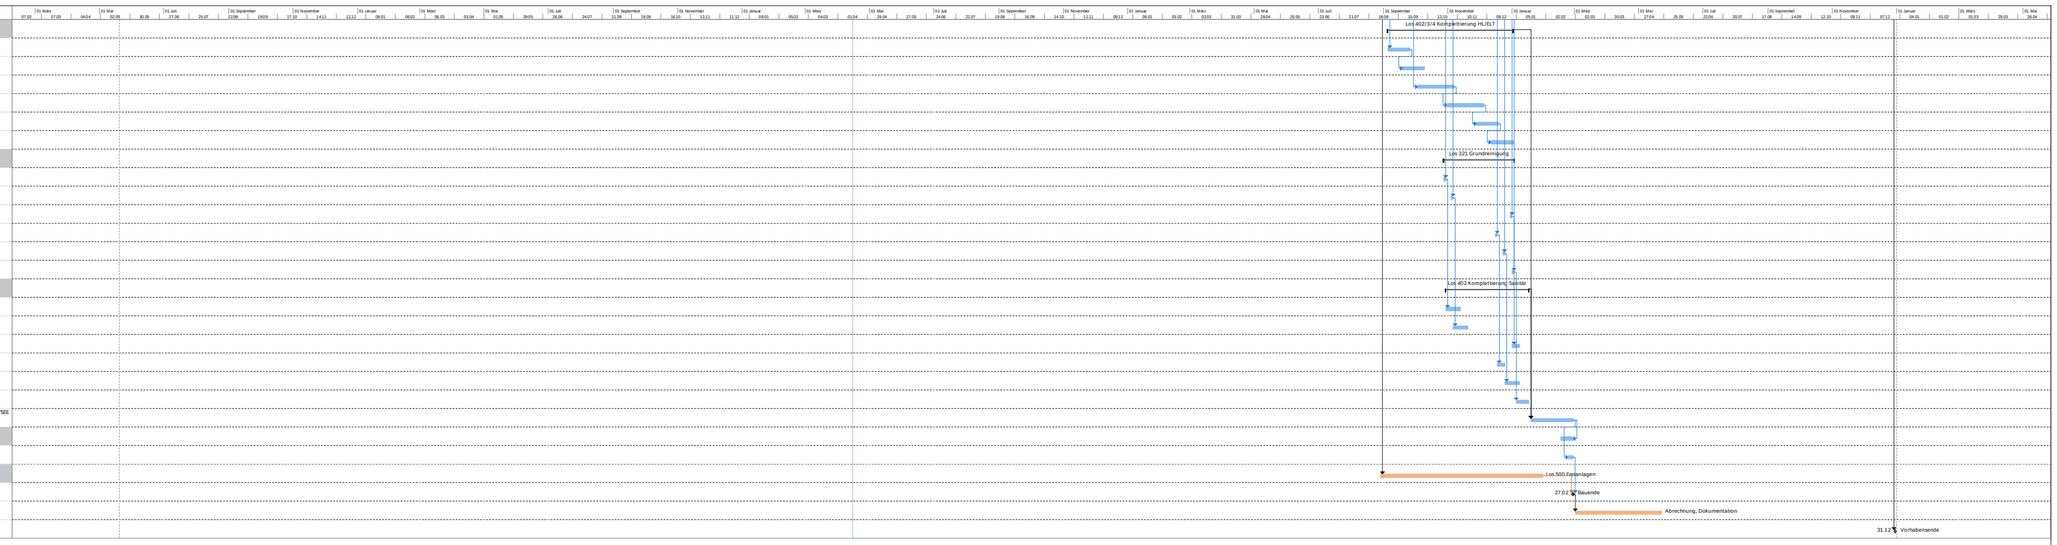

Projekt: 230705_JHM_Rahmen
Datum: Mon 15.04.24

Vorgang | Unterbrechung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Vorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Manueller Sammelvorgang | Nur Anfang | Nur Ende | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Stichtag | In Arbeit | Manueller Fortschritt
