Neubau Grundschule Döbeln Ost

Nr.	Vorgang	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1		Vorbereitende Arbeiten	155 Tage?	Mon 01.07.24	Fre 14.02.25
2		**Erdarbeiten Baugrube**	**100 Tage**	**Mon 14.10.24**	**Fre 14.03.25**
7		**Baustelleneinrichtung allgemein**	**440 Tage**	**Mon 11.11.24**	**Fre 14.08.26**
11		**Rohbau**	**120 Tage**	**Mon 25.11.24**	**Fre 23.05.25**
12		Baustelleneinrichtung Gewerk	2 Wochen	Mon 25.11.24	Fre 06.12.24
13		Fundamentbalken, Aufzugsunterfahrt	4 Wochen	Mon 25.11.24	Fre 20.12.24
14		Bodenplatte	4 Wochen	Mon 09.12.24	Fre 17.01.25
15		Wände EG	5 Wochen	Mon 20.01.25	Fre 21.02.25
16		Decke EG	4 Wochen	Mon 10.02.25	Fre 07.03.25
17		Sockelabdichtung, Dämmung im Erdreich	2 Wochen	Mon 24.02.25	Fre 07.03.25
18		Wände OG	5 Wochen	Mon 03.03.25	Fre 04.04.25
19		Gerätesockel Technik	2 Wochen	Mon 24.03.25	Fre 04.04.25
20		Decke OG	5 Wochen	Mon 24.03.25	Fre 25.04.25
21		Attiken	2 Wochen	Mon 28.04.25	Fre 09.05.25
22		Beräumung, Auschalen	2 Wochen	Mon 12.05.25	Fre 23.05.25
23		**Gerüstbau**	**235 Tage**	**Mon 24.03.25**	**Fre 27.02.26**
24		Aufbau	2 Wochen	Mon 24.03.25	Fre 04.04.25
25		Abbau	2 Wochen	Mon 16.02.26	Fre 27.02.26
26		**Gebäudehülle**	**364 Tage**	**Mon 26.05.25**	**Don 29.10.26**
27		**Fenster Kunststoff + Sonnenschutz**	**364 Tage**	**Mon 26.05.25**	**Don 29.10.26**
28		EG Einbau	4 Wochen	Mon 26.05.25	Fre 20.06.25
29		OG Einbau	4 Wochen	Mon 23.06.25	Fre 18.07.25
30		Endmontage, Komplettierung, Einstellung, Inbetriebnahme	4 Wochen	Die 30.06.26	Mon 27.07.26
31		**Alu-Glasfassaden EG + Sonnenschutz**	**344 Tage**	**Mon 02.06.25**	**Don 08.10.26**
32		EG Einbau	8 Wochen	Mon 02.06.25	Fre 25.07.25
33		Endmontage, Komplettierung, Einstellung, Inbetriebnahme	4 Wochen	Die 30.06.26	Mon 27.07.26
34		**Dach**	**100 Tage**	**Mon 26.05.25**	**Fre 10.10.25**
35		Dampfsperre als Zwischenabdichtung, Haus Regendicht	4 Wochen	Mon 23.06.25	Fre 18.07.25
36		Dämmung, Einbauteile, Oberlage	4 Monate	Mon 21.07.25	Fre 07.11.25
37		**Fassade**	**6 Monate**	**Mon 04.08.25**	**Fre 30.01.26**
38		**Innenausbau**	**445 Tage**	**Mon 04.11.24**	**Fre 14.08.26**
117		**Nacharbeiten, Komplettierung, Inbetriebnahmen, Mangelbeseitigung,**	4,2 Wocher	Fre 17.07.26	Fre 14.08.26
118		**Möblierung, Ausstattung**	4,8 Wocher	Die 30.06.26	Fre 31.07.26
119		**Baufeinreinigung**	55 Tage	Mon 01.06.26	Fre 14.08.26
120		Vorreinigung Inbetriebnahme	22 Tage	Mon 01.06.26	Die 30.06.26
121		Feinreinigung Übergabe	15 Tage	Mon 27.07.26	Fre 14.08.26
122		**Erdarbeiten, Rest aus Los Erschließung / Erdarbeiten**	**10 Tage**	**Mon 10.03.25**	**Fre 21.03.25**
124		**Außenanlagen**	**410 Tage**	**Mon 24.03.25**	**Fre 30.10.26**

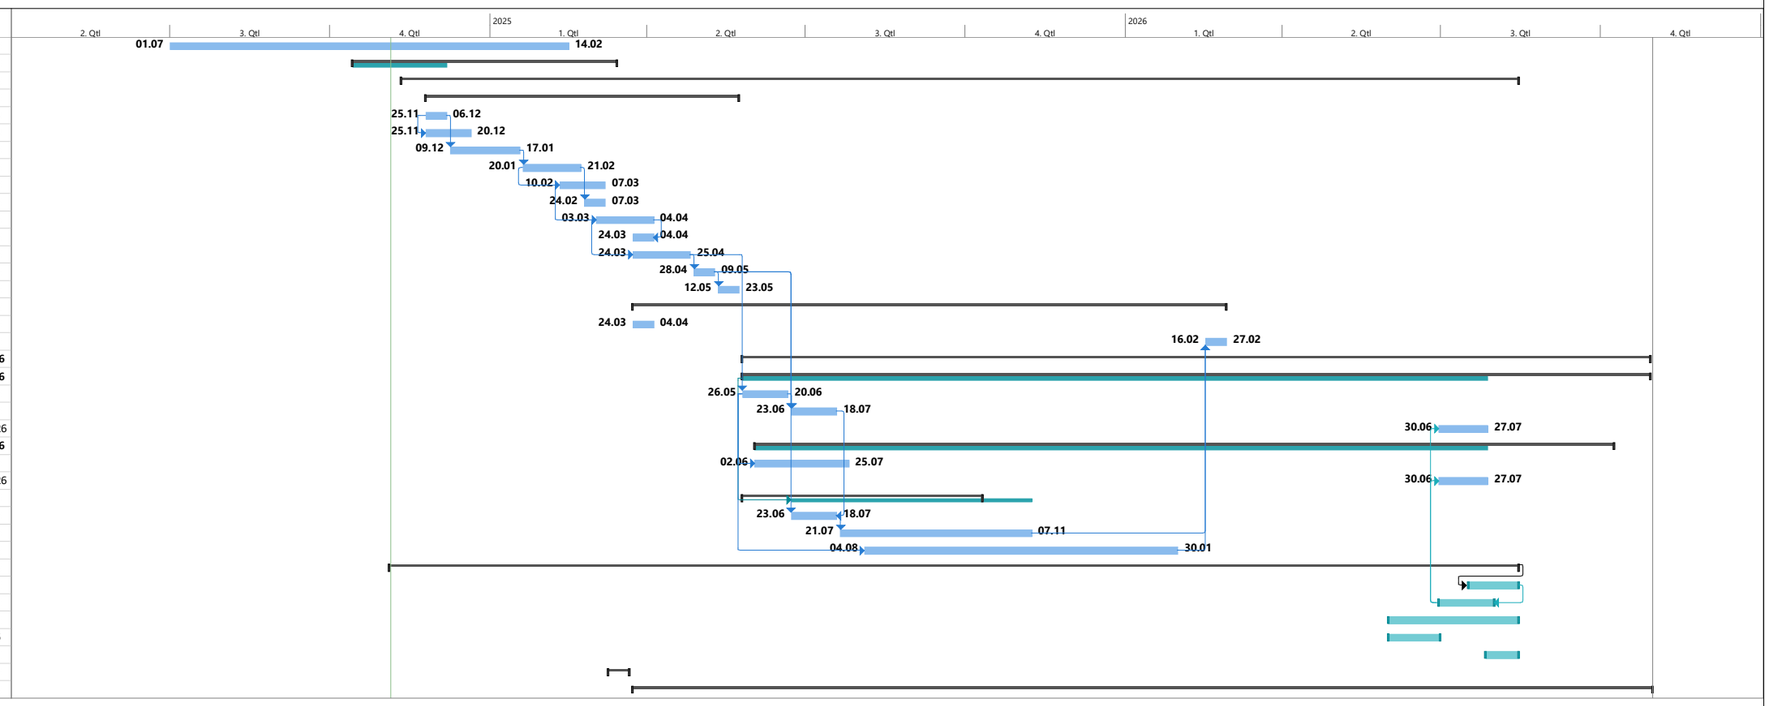

Projekt: 2340110_DÖB_SCH Arbeitsstand
Datum: Die 05.11.24

Vorgang | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Inaktiver Meilenstein | Manueller Vorgang | Manueller Sammelrollup | Nur Anfang | Externe Vorgänge | Stichtag | Manueller Fortschritt
Unterbrechung | Sammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Sammelvorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Nur Ende | Externer Meilenstein | In Arbeit
