# Neubau Rettungswache Förstgen

| Nr. | Vorgangsname | Dauer | Anfang | Ende | Vorgänger | Ressourcennamen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baubeginn | 1 Tag | Mon 07.10.24 | Mon 07.10.24 | | |
| 2 | Baustelleneinrichtung, Abbruch | 10 Tage | Mon 07.10.24 | Fre 18.10.24 | 1EA-1 Tag | Los 1 |
| 3 | Bauschild | 5 Tage | Mon 07.10.24 | Fre 11.10.24 | 1EA-1 Tag | Los 14 |
| 4 | Tiefbau- und Entwässerungskanalarbeiten | 20 Tage | Mon 14.10.24 | Fre 08.11.24 | 3EA-5 Tage;2EA | Los 1 |
| 5 | Erdsonden | 10 Tage | Mon 28.10.24 | Fre 08.11.24 | 3EA+5 Tage;2EA | Los 12 |
| 6 | Gründung und Bodenplatte | 15 Tage | Mon 11.11.24 | Fre 29.11.24 | 4;5 | Los 2 |
| 7 | Stahlbetonwände | 30 Tage | Mon 02.12.24 | Fre 10.01.25 | 6 | Los 2 |
| 8 | Mauerarbeiten | 20 Tage | Mon 10.03.25 | Fre 04.04.25 | 7EA+40 Tage | Los 2 |
| 9 | Stahlbetondecke | 10 Tage | Mon 07.04.25 | Fre 18.04.25 | 8 | Los 2 |
| 10 | Dachtragwerk | 10 Tage | Mon 21.04.25 | Fre 16.05.25 | 6;7;8;9 | Los 3.1 |
| 11 | Dachdeckung, Klempnerarbeiten | 20 Tage | Mon 19.05.25 | Fre 27.06.25 | 10 | Los 3.2 |
| 12 | PV-Anlage | 5 Tage | Mon 30.06.25 | Fre 04.07.25 | 11 | Los 10 |
| 13 | Einbau Fenster | 10 Tage | Mon 23.06.25 | Fre 04.07.25 | 10EA-10 Tage;1 | Los 4.2 |
| 14 | Einbau Tor und Außentüren | 10 Tage | Mon 23.06.25 | Fre 04.07.25 | 10EA-10 Tage;1 | Los 4.1 |
| 15 | Rohinstallation Mauerwerk + Stahlbeton | 15 Tage | Mon 07.07.25 | Fre 25.07.25 | 13;14 | Los 10;Los 11 |
| 16 | Innenputz | 15 Tage | Mon 28.07.25 | Fre 15.08.25 | 15 | Los 6 |
| 17 | Trockenbauwände anlegen | 10 Tage | Mon 18.08.25 | Fre 29.08.25 | 16 | Los 5 |
| 18 | Rohinstallation Trockenbau | 15 Tage | Mon 01.09.25 | Fre 19.09.25 | 17 | Los 10;Los 11 |
| 19 | Trockenbau schließen, Decke Fahrzeughalle | 10 Tage | Mon 15.09.25 | Fre 26.09.25 | 18EA-5 Tage | Los 5 |
| 20 | Estrich & FB-Heizung | 15 Tage | Mon 29.09.25 | Fre 17.10.25 | 19 | Los 7;Los 11 |
| 21 | Einbau Innentürzargen | 5 Tage | Mon 27.10.25 | Fre 31.10.25 | 20EA+5 Tage | Los 4.2 |
| 22 | Fassadenarbeiten | 50 Tage | Mon 07.07.25 | Fre 12.09.25 | 13;14 | Los 6 |
| 23 | Fliesenlegerarbeiten | 30 Tage | Mon 13.10.25 | Fre 21.11.25 | 19EA+10 Tage | Los 8 |
| 24 | Malerarbeiten, Bodenbelag | 20 Tage | Mon 03.11.25 | Fre 28.11.25 | 20EA+10 Tage | Los 9 |
| 25 | Feininstallation | 20 Tage | Mon 10.11.25 | Fre 05.12.25 | 24AA+5 Tage | Los 10;Los 11;Los 12 |
| 26 | Einbau Türblätter, Schließanlage | 5 Tage | Mon 01.12.25 | Fre 05.12.25 | 24 | Los 4.2 |
| 27 | Gebäudereinigung | 5 Tage | Mon 01.12.25 | Fre 05.12.25 | 24 | Los 13 |
| 28 | Außenanlagen, Einfriedung | 45 Tage | Mon 08.09.25 | Fre 07.11.25 | 22EA-5 Tage | Los 1 |
| 29 | Abnahmen + Übergabe an AG | 1 Tag | Mon 08.12.25 | Mon 08.12.25 | 26;27 | |

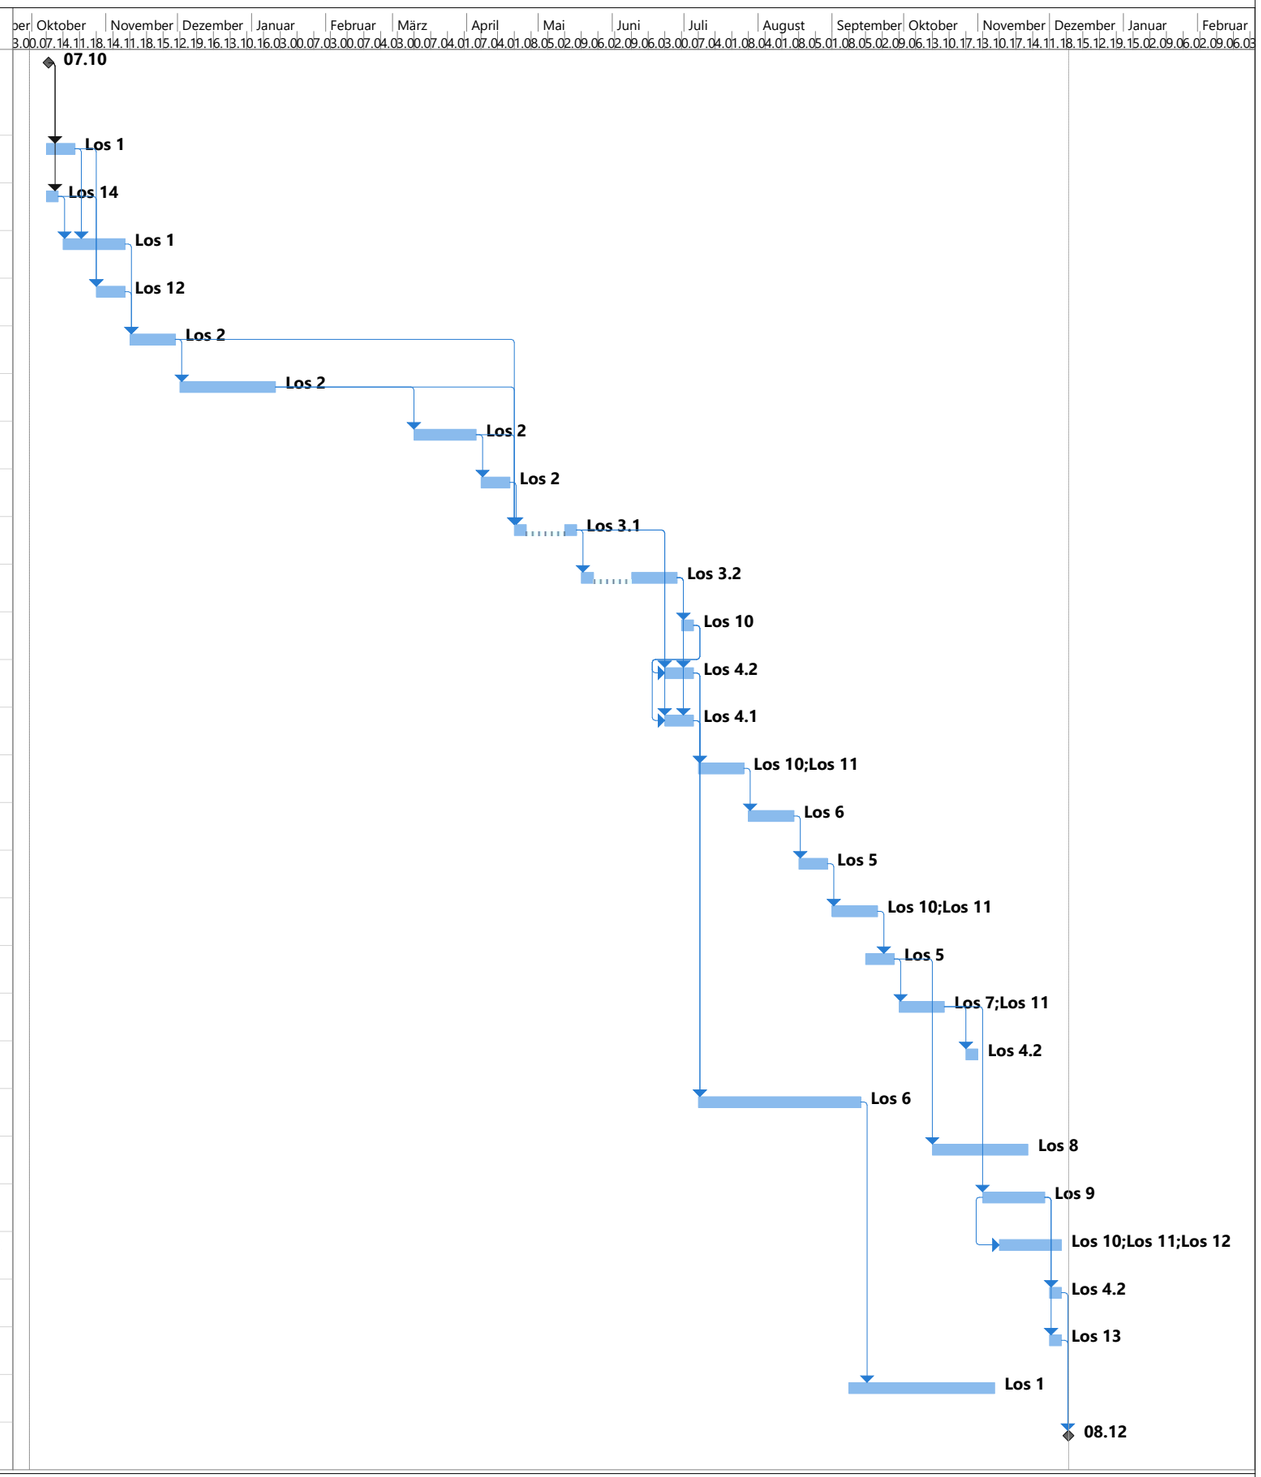


Projekt: RW Förstgen
Datum: Mit 31.07.24

Vorgang | Sammelvorgang | Inaktiver Meilenstein | Nur Dauer | Nur Anfang | Externer Meilenstein | Manueller Fortschritt
Unterbrechung | Projektsammelvorgang | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Sammelrollup | Nur Ende | Stichtag
Meilenstein | Inaktiver Vorgang | Manueller Vorgang | Manueller Sammelvorgang | Externe Vorgänge | In Arbeit
