Alteuben 11-
Wohnstätte für Menschen mit geistiger Behinderung

Bauzeitenplan

Lange Uhren GmbH
F.-A.-Lange-Platz 1
01768 Glashütte

Tage	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	Rohbau	1 Tag?	Mon 15.03.10	Mon 15.03.10
2	Neubau Fundament UG partiell/Aufzug	30 Tage	Mon 23.09.24	Fre 01.11.24
3	Anpassen Bodenplatte UG/Aufzug	30 Tage	Mon 23.09.24	Fre 01.11.24
4	Neubau trag. Wände UG	30 Tage	Mon 23.09.24	Fre 01.11.24
5	Neubau Decke über UG	30 Tage	Mon 23.09.24	Fre 01.11.24
6	Neubau trag. Wände EG	30 Tage	Mon 04.11.24	Fre 13.12.24
7	Neubau Decke über EG	30 Tage	Mon 04.11.24	Fre 13.12.24
8	Neubau trag. Wände OG1	20 Tage	Mon 06.01.25	Fre 31.01.25
9	Neubau Decke über OG1	20 Tage	Mon 06.01.25	Fre 31.01.25
10	Neubau trag.Wände OG2	15 Tage	Mon 03.02.25	Fre 21.02.25
11	Neubau Decke über OG2	15 Tage	Mon 03.02.25	Fre 21.02.25
12	Rückbau stat. Sicherung der Außenwände	10 Tage	Mon 17.02.25	Fre 28.02.25
13	Umbau Gerüst	5 Tage	Mon 03.03.25	Fre 07.03.25
14	Rückbau Schutzdach	5 Tage	Mon 03.03.25	Fre 07.03.25
15	Dachstuhl	15 Tage	Mon 03.03.25	Fre 21.03.25
16	Natursteinarbeiten Dachgesims	15 Tage	Mon 10.03.25	Fre 28.03.25
17	Dachdeckung, Verblechung	30 Tage	Mon 24.03.25	Fre 02.05.25
18	Fassadenöffnungen anpassen	15 Tage	Mon 20.01.25	Fre 07.02.25
19	Natursteinarbeiten Gesimse/Gewände/Fensterbänke/Portale	25 Tage	Mon 03.02.25	Fre 07.03.25
20	Außenputzarbeiten Vorbereitung	10 Tage	Mon 17.03.25	Fre 28.03.25
21	Einbau Außenfenster	15 Tage	Mon 17.03.25	Fre 04.04.25
22	Außenputzarbeiten	15 Tage	Mon 31.03.25	Fre 18.04.25
23	Klempnerarbeiten Fensterbänke/Regenfallrohre	15 Tage	Mon 31.03.25	Fre 18.04.25
24	Schlosserarbeiten Geländer/Absturzsicherung FE	15 Tage	Mon 31.03.25	Fre 18.04.25
25	Fernwärmeanschluss Haus 11, prüfen !	10 Tage	Mon 02.12.24	Fre 13.12.24
26	Dämmung Innenseiten AW OG1	15 Tage	Mon 07.04.25	Fre 25.04.25
27	Trockenbauarbeiten Innenwände OG1	15 Tage	Mon 14.04.25	Fre 02.05.25
28	Rohinstallation ELT OG1	15 Tage	Mon 21.04.25	Fre 09.05.25
29	Rohinstallation HLS OG1	15 Tage	Mon 21.04.25	Fre 09.05.25
30	Putzarbeiten OG1	10 Tage	Mon 12.05.25	Fre 23.05.25
31	Fußbodenheizung OG1	5 Tage	Mon 26.05.25	Fre 30.05.25
32	Estrich OG1	5 Tage	Mon 02.06.25	Fre 06.06.25
33	Trocknungszeit	20 Tage	Mon 09.06.25	Fre 04.07.25
34	Trockenbau Restwände/Decken OG1	10 Tage	Mon 07.07.25	Fre 18.07.25
35	Maler OG1	15 Tage	Mon 21.07.25	Fre 08.08.25
36	Fliesen Wände OG1	10 Tage	Mon 21.07.25	Fre 01.08.25
37	Fliesen FB OG1	10 Tage	Mon 07.07.25	Fre 18.07.25
38	Bodenleger OG1	10 Tage	Mon 21.07.25	Fre 01.08.25
39	Innentüren OG1	5 Tage	Mon 04.08.25	Fre 08.08.25
40	Feininstallation ELT OG1	10 Tage	Mon 11.08.25	Fre 22.08.25
41	Feininstallation HLS OG1	10 Tage	Mon 21.07.25	Fre 01.08.25
42				
43	Dämmung Innenseite AW OG2	15 Tage	Mon 28.04.25	Fre 16.05.25
44	Trockenbauarbeiten Innenwände OG2	15 Tage	Mon 05.05.25	Fre 23.05.25
45	Rohinstallation ELT OG2	15 Tage	Mon 12.05.25	Fre 30.05.25
46	Rohinstallation HLS OG2	15 Tage	Mon 12.05.25	Fre 30.05.25
47	Putzarbeiten OG2	10 Tage	Mon 02.06.25	Fre 13.06.25
48	Fußbodenheizung OG2	5 Tage	Mon 16.06.25	Fre 20.06.25
49	Estrich OG2	5 Tage	Mon 23.06.25	Fre 27.06.25
50	Trocknungzeit	20 Tage	Mon 30.06.25	Fre 25.07.25
51	Trockenbau Restwände/Decken OG2	10 Tage	Mon 14.07.25	Fre 25.07.25
52	Maler OG2	15 Tage	Mon 28.07.25	Fre 15.08.25
53	Fliesen Wände OG2	10 Tage	Mon 28.07.25	Fre 08.08.25
54	Fliesen FB OG2	10 Tage	Mon 11.08.25	Fre 22.08.25
55	Bodenleger OG2	10 Tage	Mon 18.08.25	Fre 29.08.25
56	Innentüren OG2	5 Tage	Mon 01.09.25	Fre 05.09.25
57	Feininstallation ELT OG2	10 Tage	Mon 18.08.25	Fre 29.08.25
58	Feininstallation HLS OG2	10 Tage	Mon 25.08.25	Fre 05.09.25
59				
60	Abbau Gerüst	10 Tage	Mon 05.05.25	Fre 16.05.25
61	Injektion Außenwände EG	10 Tage	Mon 19.05.25	Fre 30.05.25
62	Abdichtung Decke über UG	10 Tage	Mon 26.05.25	Fre 06.06.25
63	Dämmung Innenseiten AW EG	15 Tage	Mon 09.06.25	Fre 27.06.25
64	Trockenbauarbeiten Innenwände EG	15 Tage	Mon 16.06.25	Fre 04.07.25
65	Rohinstallation ELT EG	15 Tage	Mon 23.06.25	Fre 11.07.25
66	Rohinstallation HLS EG	15 Tage	Mon 23.06.25	Fre 11.07.25
67	Putzarbeiten EG	10 Tage	Mon 14.07.25	Fre 25.07.25
68	Fußbodenheizung EG	5 Tage	Mon 28.07.25	Fre 01.08.25
69	Estrich EG	5 Tage	Mon 04.08.25	Fre 08.08.25
70	Trockenbau Restwände/Decken EG	10 Tage	Mon 11.08.25	Fre 22.08.25
71	Maler EG	15 Tage	Mon 25.08.25	Fre 12.09.25
72	Bodenleger EG	10 Tage	Mon 15.09.25	Fre 26.09.25
73	Rohrrahmentüranlage T30RS/Innenverglasung F30	10 Tage	Mon 11.08.25	Fre 22.08.25
74	Fliesen Wände EG	10 Tage	Mon 11.08.25	Fre 22.08.25
75	Fliesen FB EG	10 Tage	Mon 25.08.25	Fre 05.09.25
76	Innentüren EG	5 Tage	Mon 29.09.25	Fre 03.10.25
77	Feininstallation ELT EG	10 Tage	Mon 15.09.25	Fre 26.09.25
78	Feininstallation HLS EG	10 Tage	Mon 08.09.25	Fre 19.09.25
79				
80	Rückbau Innenputz UG	10 Tage	Mon 28.04.25	Fre 09.05.25
81	Rohinstallation ELT UG	15 Tage	Mon 12.05.25	Fre 30.05.25
82	Rohinstallation HLS	15 Tage	Mon 12.05.25	Fre 30.05.25
83	Putzarbeiten UG	10 Tage	Mon 02.06.25	Fre 13.06.25
84	Innentüren UG	5 Tage	Mon 02.06.25	Fre 06.06.25
85	Maler Wände UG	10 Tage	Mon 16.06.25	Fre 27.06.25
86	Anstrich Fußboden UG	10 Tage	Mon 30.06.25	Fre 11.07.25
87	Feininstallation ELT UG	10 Tage	Mon 14.07.25	Fre 25.07.25
88	Feininstallation HLS UG	10 Tage	Mon 14.07.25	Fre 25.07.25
89	Außenanlagen	70 Tage	Mon 07.07.25	Fre 10.10.25

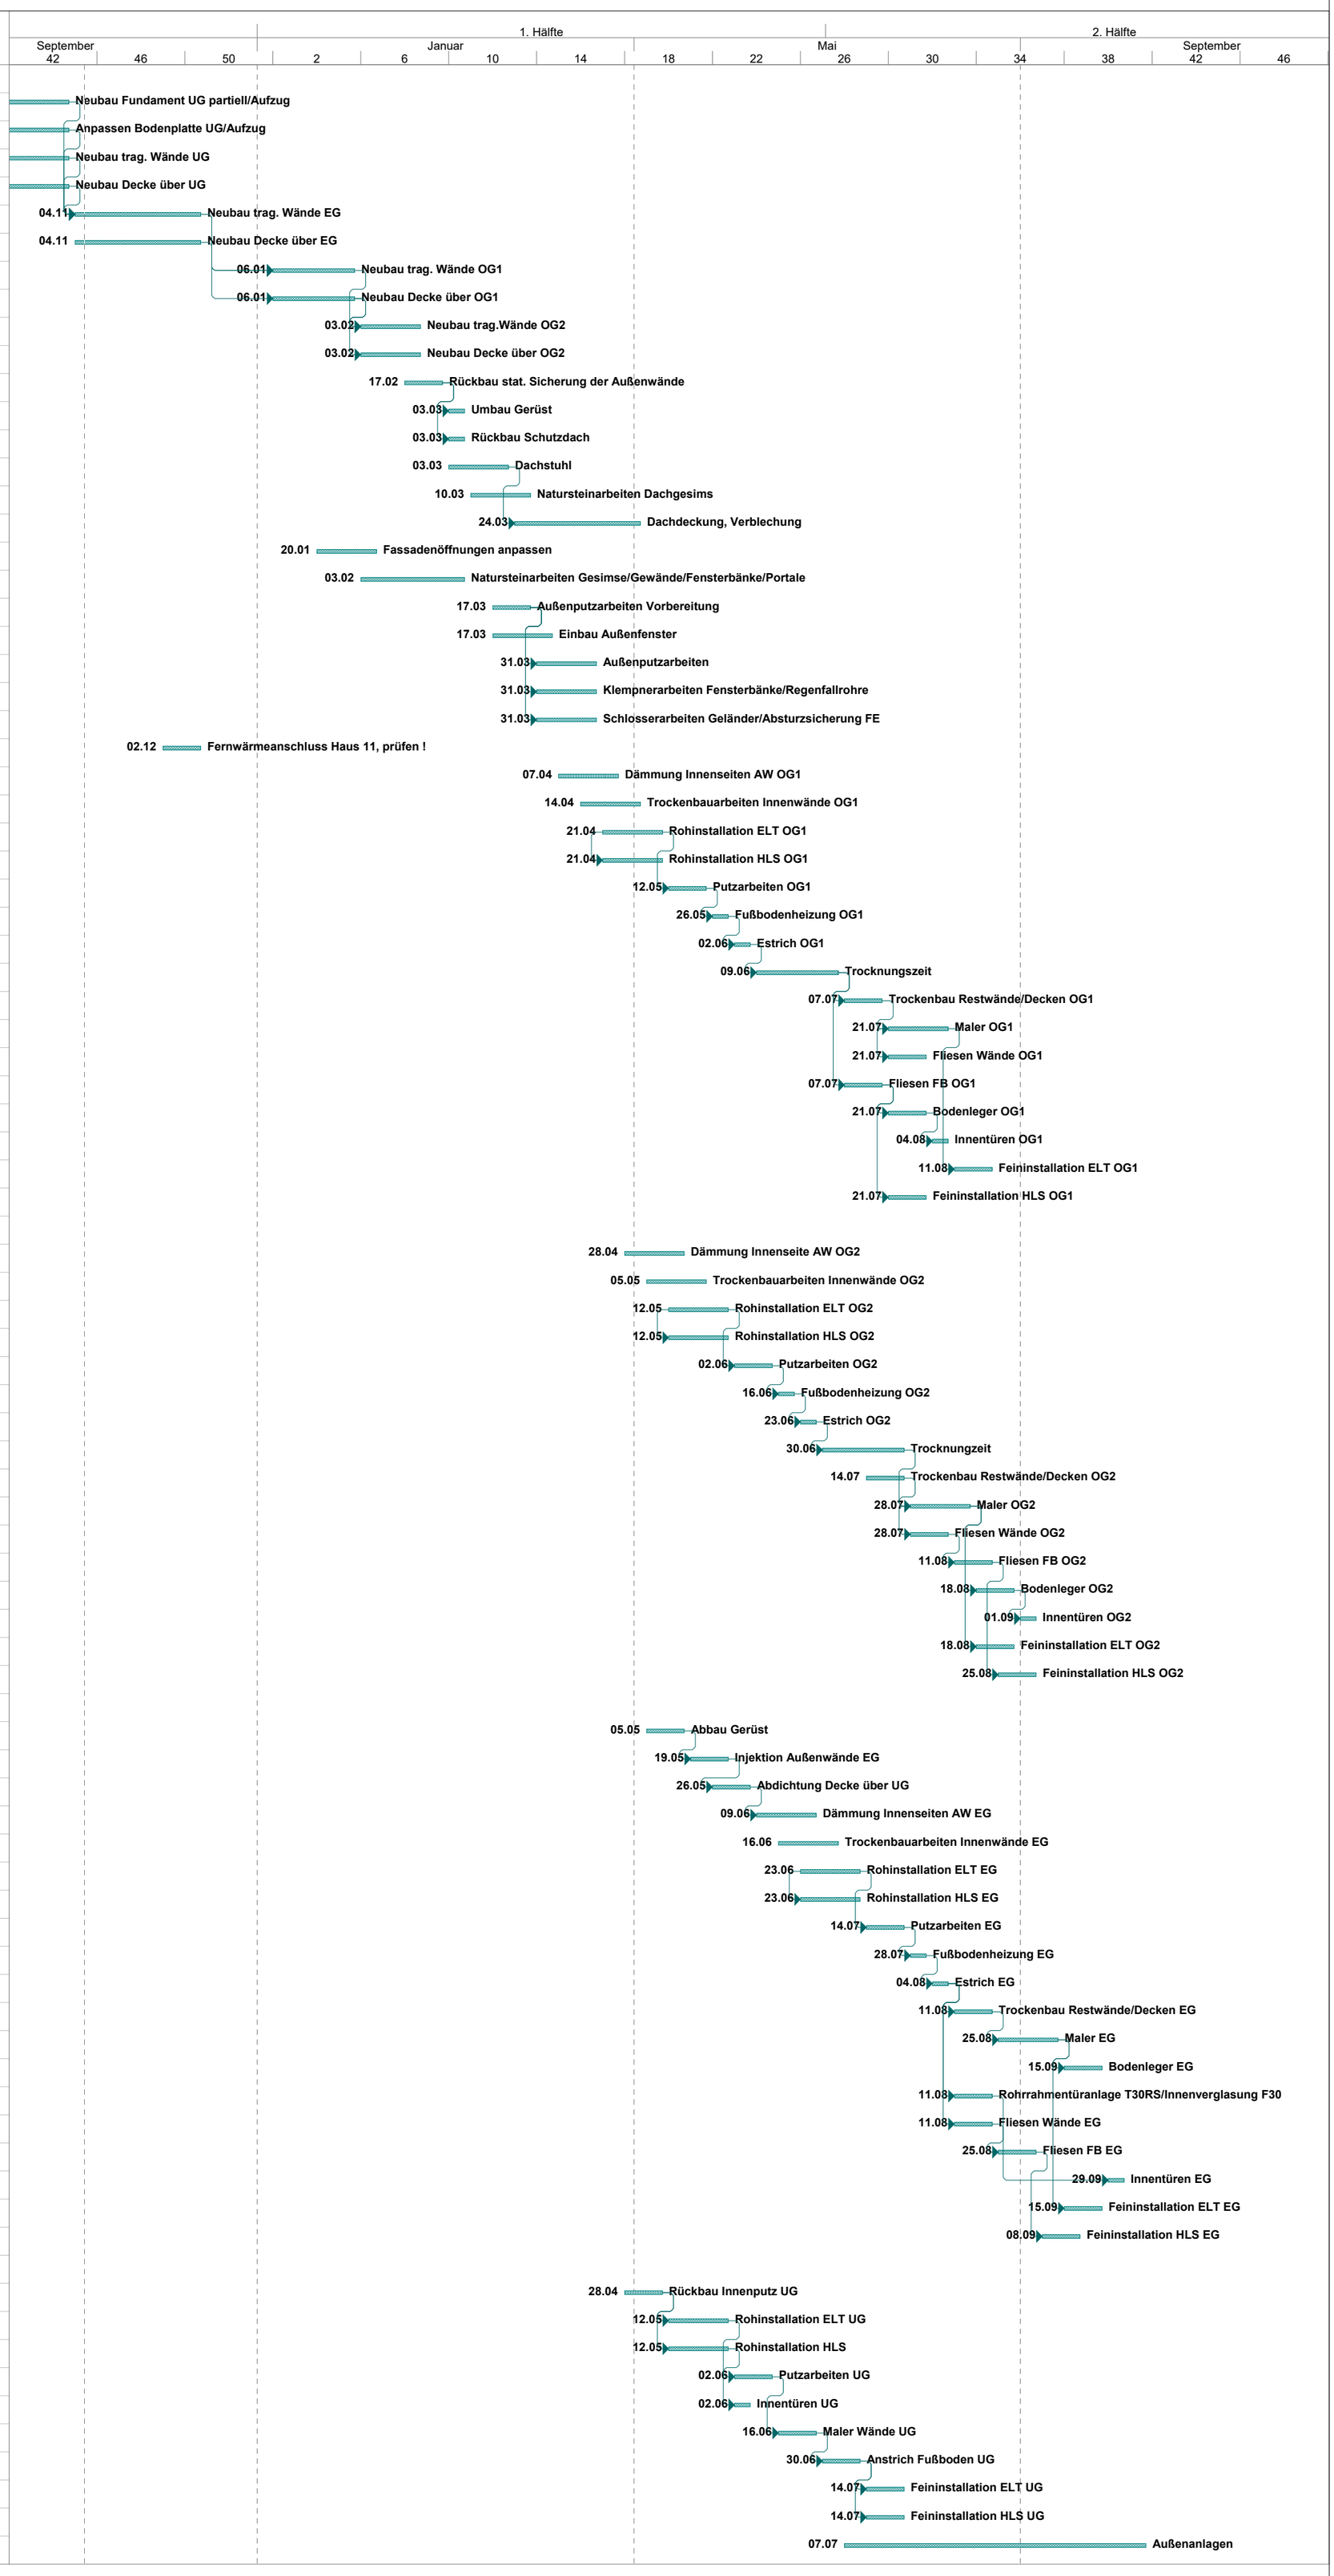

aufgestellt
Rau architekten
