Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH
Georgiring 3
04103 Leipzig

K.-Liebknecht-Str. zw. Körnerstr. u. K.-Eisner-Str. (90141)

Grobablaufplan Stand: 11.11.2024

Verkehrs-Consult Leipzig (VCL) GmbH
Georgiring 3
04103 Leipzig

Zeile-Nr.	Bezeichnung	Start	Ende
1	**Gesamtbauzeit**	**18.05.2025**	**26.10.2025**
2	**ÖPNV**	**28.06.2025**	**29.09.2025**
3	Straßenbahnvollsperrung	28.06.2025	29.09.2025
4	**Individualverkehr**	**19.05.2025**	**26.10.2025**
5	Phase 1.1	19.05.2025	15.06.2025
6	Phase 1.2	15.06.2025	28.06.2025
7	Phase 2.1.1	27.06.2025	04.08.2025
8	Phase 2.1.2	04.08.2025	11.08.2025
9	Phase 2.2.1	11.08.2025	01.09.2025
10	Phase 2.2.2	01.09.2025	17.09.2025
11	Phase 2.2.3	17.09.2025	24.09.2025
12	Phase 2.2.4	24.09.2025	29.09.2025
13	Phase 3.1	29.09.2025	26.10.2025
14	**Gleisbau, Haltestellenbau, Fahrleitungsbau, Bahnstrom**	**28.06.2025**	**25.09.2025**
15	Gleisrückbau für LWW	28.06.2025	03.07.2025
16	**Gleisbau**	**03.07.2025**	**21.09.2025**
17	Gleisbau Knoten Kurt-Eisner-Str.	03.07.2025	01.08.2025
18	Gleisbau nördlich Knoten Kurt-Eisner-Str. bis südlich Schenkendorfstr.	18.07.2025	08.09.2025
19	Gleisbau Knoten Schenkendorfstr. bis Körnerstr.	18.08.2025	21.09.2025
20	**Haltestellenbau**	**31.08.2025**	**14.09.2025**
21	Haltestellenbau -Austausch BLS-	31.08.2025	14.09.2025
22	**Bahnstrom**	**11.08.2025**	**22.09.2025**
23	Bahnstrom Kochstraße	11.08.2025	01.09.2025
24	Bahnstrom A.-Kästner-Str. / K.-Liebknecht-Str.	01.09.2025	22.09.2025
25	**Fahrleitungsbau**	**21.07.2025**	**25.09.2025**
26	Fahrleitungsbau -Maste und Quertragwerke-	21.07.2025	11.08.2025
27	Fahrleitungsbau -Fahrdrahtzug-	18.09.2025	25.09.2025
28	**Schachtkonflikte LVB (3.3 aus BAP LWW Stand 17.06.2024)**	**30.06.2025**	**04.08.2025**
29	Konflikt 7 Rückbau 26870204	30.06.2025	07.07.2025
30	Konflikt 6 Rückbau 26870201	30.06.2025	14.07.2025
31	Konflikt 5 Umbau 26870202	07.07.2025	14.07.2025
32	Konflikt 4 Umbau 26870191	14.07.2025	21.07.2025
33	Konflikt 3 Umbau 26870102	14.07.2025	21.07.2025
34	Konflikt 2 Umbau 26870101	21.07.2025	28.07.2025
35	Konflikt 1 Neubau 26870112	21.07.2025	04.08.2025
36	**Deckensanierung VTA**	**04.08.2025**	**28.09.2025**
37	Bereich Kurt-Eisner-Straße	04.08.2025	11.08.2025
38	Bereich Schenkendorfstraße	17.09.2025	28.09.2025
39		**04.07.2025**	**31.08.2025**
40	**Netz Leipzig**	**04.07.2025**	**31.08.2025**
41	Querung Gas d 160 PEh im SR DN 500 St Schenkendorfstraße	04.07.2025	10.08.2025
42	Querung Elt SR 3x DN 160 Schenkendorfstraße	04.07.2025	10.08.2025
43	Verlegung 1x 10 kV Schenkendorfstr. -Südplatz bis Schenkendorfstr. Nr. .. -	11.08.2025	31.08.2025
44	Querung Fernwärme Körnerstraße	17.07.2025	10.08.2025
45	**Leipziger Wasserwerke LWW (gem. BAP Stand 17.06.2024)**	**18.05.2025**	**14.09.2025**
	Teilmaßnahme 1: Ausw. TWL Schenkendorfstraße / Südplatz		
46	1.1 Auswechslung TWL DN 150 -Schenkendorfsstr.-	18.05.2025	29.06.2025
47	1.2 Auswechslung TWL DN 200 - 300 -Querung K.-Liebknecht-Str.-	04.07.2025	28.07.2025
48	1.3 Auswechslung TWL DN 100 - 200 -Südplatz / westl. Schenkendorfstr.-	21.07.2025	10.08.2025
	Teilmaßnahme 2: Auswechslung TWL K.-Liebknecht-/ A.-Kästner-Straße		
49	2.1 Auswechslung TWL DN 100 - 150 -K.Liebknecht-Str.	04.07.2025	28.07.2025
	Teilmaßnahme 3: Reparatur MWL K.-Liebknecht-Straße (PSP 500162945)		
50	3.1 Reperatur MWK Ei 850/1300 -K.-Liebknecht-Str.- inkl. offene Baugrube Arndt	30.06.2025	15.08.2025
51	3.2 Neubau Abdeckplatte 26870002	07.07.2025	04.08.2025
52	3.3 Sanierung AW-HA offene und geschlossene Bauweise	30.06.2025	14.09.2025
53	Teilmaßnahme 4:	04.07.2025	24.07.2025
	4.1 Querung TWL DN 150 -K.-Liebknecht-Str.-		
54	**LVB: Abnahmen, Inbetriebnahmen, Verkehrsfreigaben**	**26.09.2025**	**29.09.2025**
55	Kurzschlussversuche / Gebrauchsabnahme	26.09.2025	26.09.2025
56	Aufnahme Straßenbahnbetrieb Strecke mit IBN Haltestellen	29.09.2025	29.09.2025

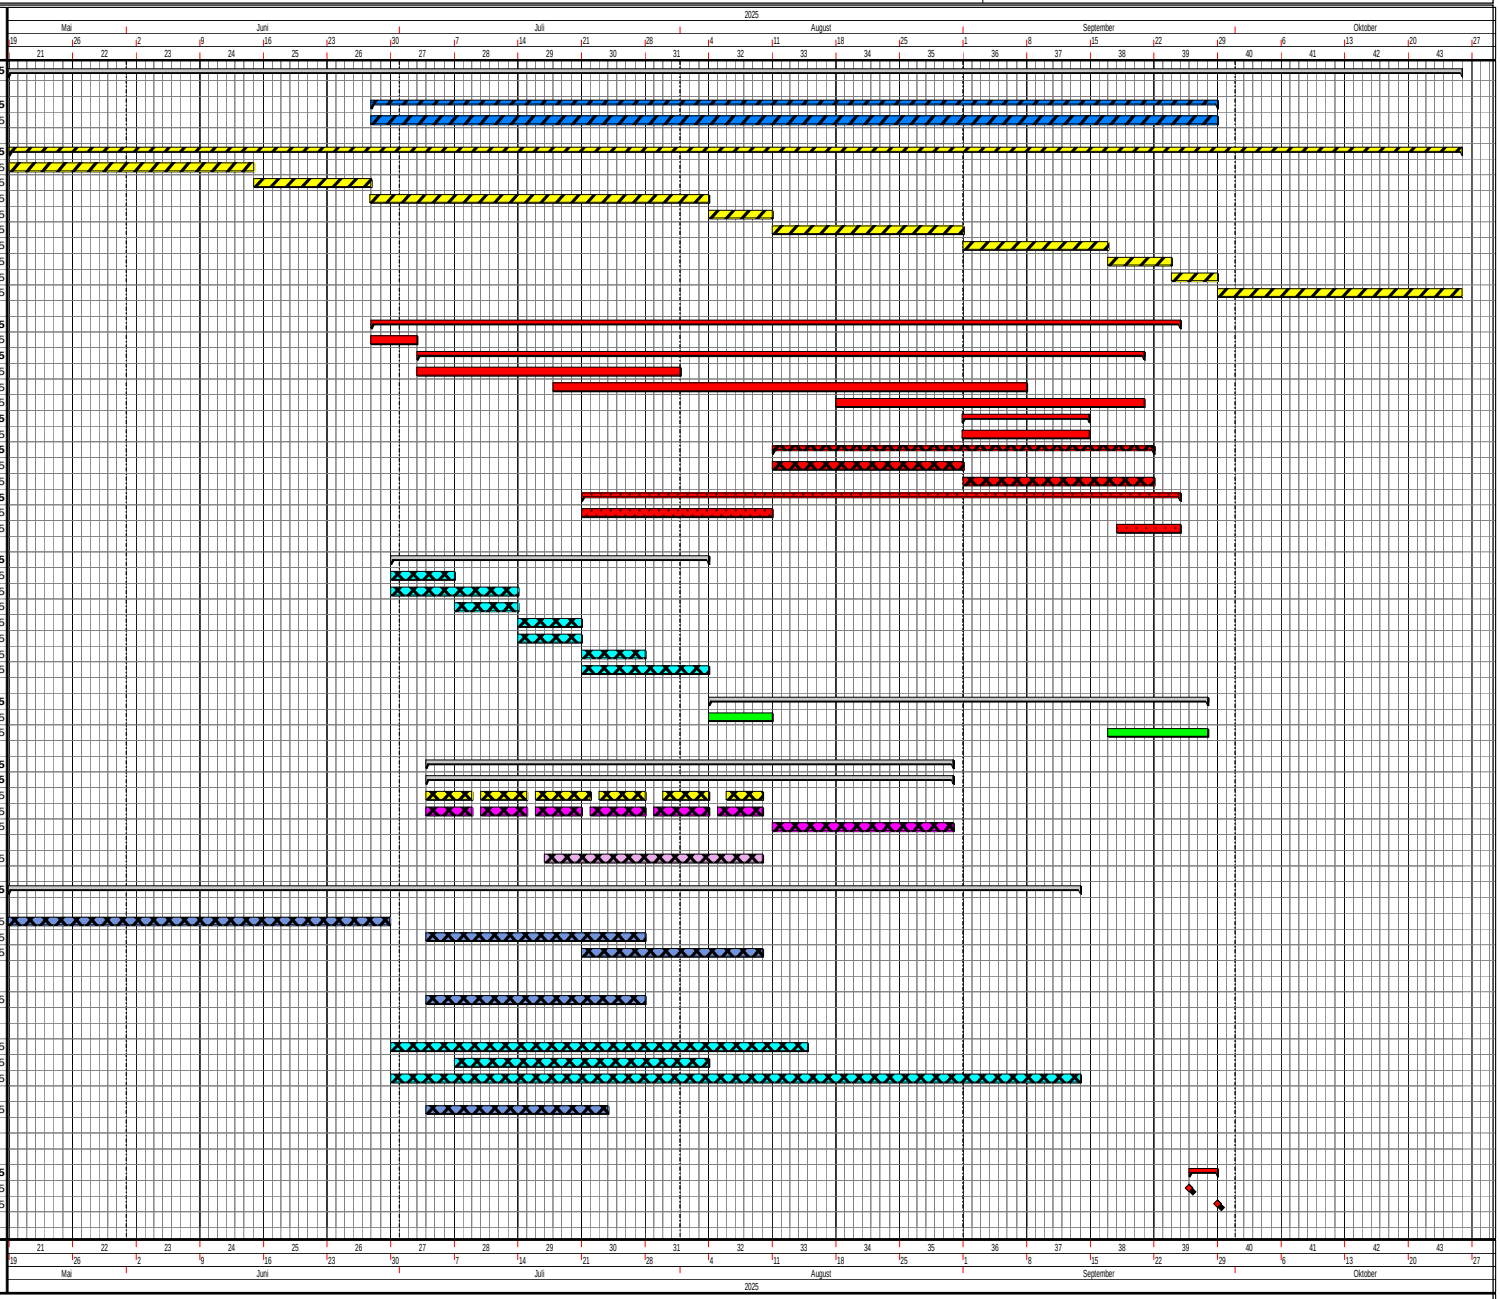

Meilenstein Formen
◇ Raute

Projektdatei: P:\Bauüberwachung\18-092_K-Liebknecht-Str_zw_Körnerstr_u_K-Eisner-Str_Bauablaufpl\1.LEISTUNGEN\1.2_Bauablauf\1.2.1_BAP_AG\2024-07-01_BAP K.-Liebknecht-Str. -Körner bis Eisner-05.pp

11.11.2024
