Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger
1	**Prager Straße zwischen An der Tabaksmühle und Friedhofsgärtnerei**	**35 Wochen**	**Mon 07.04.25**	**Fre 19.12.25**		
2						
3	Baubeginn	0 Tage	Mon 07.04.25	Mon 07.04.25		12
4	Bauende	0 Tage	Fre 19.12.25	Fre 19.12.25	79EE	
5						
6	Rückbau Absperrelemente Leipzig Marathon (Fremdleistung durch Veranstalter)	1 Tag	Mon 14.04.25	Mon 14.04.25		
7						
8	**Verkehrsführung**	**35 Wochen**	**Mon 07.04.25**	**Fre 19.12.25**		
9	Sperrung Straßenbahn (von Betriebsende 13.04.2025 bis Betriebsbeginn 15.11.2025)	29,2 Wochen	Mon 14.04.25	Fre 14.11.25	13AA;65EE;66EE;7	
10	**VF Phase 1 (Vollsperrung Straßenbahn und MIV)**	**30,4 Wochen**	**Mon 07.04.25**	**Mon 17.11.25**		
11	**VF Phase 1a (Knoten AdTM komplett gesperrt, Bus auf landw. Fahrbahn im Gegenverkehr)**	**10 Wochen**	**Mon 07.04.25**	**Die 24.06.25**		
12	Einrichtung	1 Woche	Mon 07.04.25	Fre 11.04.25	3	13
13	Inbetriebnahme und Vorhaltung	9 Wochen	Mon 14.04.25	Die 24.06.25	12	9AA;30AA;122AA
14	**VF Phase 1b (Knoten AdTM frei, Prager Straße für MIV gesperrt, Bus auf landw. Fahrbahn im Gegenverkehr)**	**7,8 Wochen**	**Fre 20.06.25**	**Mit 13.08.25**		
15	Einrichtung	3 Tage	Fre 20.06.25	Die 24.06.25	137AA-3 Tage	16
16	Inbetriebnahme und Vorhaltung	7,2 Wochen	Mit 25.06.25	Mit 13.08.25	15	
17	**VF Phase 1c (Knoten AdTM frei, Prager Straße für MIV gesperrt, Bus auf Richtungsfahrbahnen)**	**3,2 Wochen**	**Mit 13.08.25**	**Mit 03.09.25**		
18	Einrichtung	1 Tag	Mit 13.08.25	Mit 13.08.25	104AA-1 Tag	19
19	Inbetriebnahme und Vorhaltung	3 Wochen	Don 14.08.25	Mit 03.09.25	18	53AA;60AA
20	**VF Phase 1d (Knoten AdTM frei, Prager Straße stadtwärts für MIV und Bus eingeschränkt frei, Prager Straße landwärts für MIV gesperrt und Bus frei)**	**10,8 Wochen**	**Mon 01.09.25**	**Mon 17.11.25**		
21	Einrichtung	3 Tage	Mon 01.09.25	Mit 03.09.25	81EA-3 Tage;88EA	22
22	Inbetriebnahme und Vorhaltung	10,2 Wochen	Don 04.09.25	Mon 17.11.25	21	24EA-2 Tage
23	**VF Phase 2 (Straßenbahn in Betrieb, Prager Straße stadtwärts für MIV frei, Prager Straße landwärts für MIV gesperrt)**	**5 Wochen**	**Fre 14.11.25**	**Fre 19.12.25**		
24	Einrichtung	1 Tag	Fre 14.11.25	Fre 14.11.25	22EA-2 Tage	25
25	Inbetriebnahme und Vorhaltung	4,8 Wochen	Mon 17.11.25	Fre 19.12.25	24	113AA
26						
27						
28	**LVB**	**28,8 Wochen**	**Mon 14.04.25**	**Mit 12.11.25**		
29	**Rückbau Gleis und Eindeckung (ca. 800 m)**	**2,6 Wochen**	**Mon 14.04.25**	**Die 06.05.25**		
30	Baubeginn bis hinter Kommandant-Prendel-Allee (ca. 500 m)	8 Tage	Mon 14.04.25	Fre 25.04.25	13AA	75;31;43
31	(hinter) Kommandant-Prendel-Allee bis Bauende (ca. 300 m)	5 Tage	Mon 28.04.25	Die 06.05.25	30	47
32	**Leitungsbau**	**10,6 Wochen**	**Mon 28.04.25**	**Mit 16.07.25**		
33	**Bahnstrom**	**10,6 Wochen**	**Mon 28.04.25**	**Mit 16.07.25**		
34	**(hinter) Kommandant-Prendel-Allee bis Bauende**	**3,6 Wochen**	**Mon 23.06.25**	**Mit 16.07.25**		
35	Herstellung Leitungsgraben	1 Woche	Mon 23.06.25	Mon 30.06.25	39AE	36;40
36	Kabelzug und Montage	3 Tage	Mon 07.07.25	Mit 09.07.25	35;39	37
37	Rückverfüllung Leitungsgraben inkl. temp. Deckenschluß	1 Woche	Don 10.07.25	Mit 16.07.25	36	92
38	**KVS Wasserwerk bis (hinter) Kommandant-Prendel-Allee**	**2,6 Wochen**	**Mon 30.06.25**	**Mit 16.07.25**		
39	Herstellung Leitungsgraben	1 Woche	Mon 30.06.25	Fre 04.07.25	76	40;36;35AE
40	Kabelzug und Montage	3 Tage	Mon 07.07.25	Mit 09.07.25	39;35	41
41	Rückverfüllung Leitungsgraben inkl. temp. Deckenschluß	1 Woche	Don 10.07.25	Mit 16.07.25	40	103
42	**Ludolf-Colditz-Straße bis KVS Wasserwerk**	**2,6 Wochen**	**Mon 28.04.25**	**Fre 16.05.25**		
43	Herstellung Leitungsgraben	1 Woche	Mon 28.04.25	Die 06.05.25	30	44
44	Kabelzug und Montage	3 Tage	Mit 07.05.25	Fre 09.05.25	43	45
45	Rückverfüllung Leitungsgraben inkl. Wiederherstellung Gehweg	1 Woche	Mon 12.05.25	Fre 16.05.25	44	
46	**Neubau / Umbau / Sanierung MW-Schächte (22 Stück)**	**6 Wochen**	**Mit 07.05.25**	**Fre 20.06.25**		
47	(hinter) Kommandant-Prendel-Allee bis Bauende (8 Stück)	2 Wochen	Mit 07.05.25	Die 20.05.25	31	51
48	Baubeginn bis Kommandant-Prendel-Allee (14 Stück); Achtung: Baustellenlogistik nur innerhalb Gleisbereich!	5 Wochen	Mit 14.05.25	Fre 20.06.25	75EA-1 Woche	58
49	**Gleisbau inkl. Eindeckung (ca. 800 m)**	**24,2 Wochen**	**Mit 21.05.25**	**Mit 12.11.25**		
50	**(hinter) Kommandant-Prendel-Allee bis Bauende (ca. 300 m)**	**17,4 Wochen**	**Mit 21.05.25**	**Die 23.09.25**		
51	Tiefbau (Auskofferung, Gleisdrainage, Gleisentwässerung)	11 Tage	Mit 21.05.25	Fre 06.06.25	47	52;91EE
52	Einbau Gleisbord stadtwärts	9 Tage	Die 10.06.25	Fre 20.06.25	51	90EE
53	Einbau Gleisbord landwärts	2 Wochen	Don 14.08.25	Mit 27.08.25	19AA	54EA-1 Woche;14
54	Herstellung Erdplanum, Einbau FSS	1 Woche	Don 21.08.25	Mit 27.08.25	53EA-1 Woche	55
55	Einbau STS	4 Tage	Don 28.08.25	Die 02.09.25	54	56
56	Verlegung Gleis inkl. Schottereinbau zwischen Schwellen	3 Wochen	Mit 03.09.25	Die 23.09.25	55	64
57	**Baubeginn bis (hinter) Kommandant-Prendel-Allee (ca. 500 m)**	**16,6 Wochen**	**Mon 30.06.25**	**Don 23.10.25**		
58	Tiefbau (Auskofferung, Gleisdrainage, Gleisentwässerung, LSA-Tiefbau)	3 Wochen	Mon 30.06.25	Fre 18.07.25	76;48;77	59EA-1 Woche;10
59	Einbau Gleisbord stadtwärts	3 Wochen	Mon 14.07.25	Fre 01.08.25	58EA-1 Woche	94AA+1 Woche;1
60	Einbau Gleisbord landwärts	3 Wochen	Don 14.08.25	Mit 03.09.25	19AA	61EA-1 Woche;11
61	Herstellung Erdplanum, Einbau FSS	2 Wochen	Don 28.08.25	Mit 10.09.25	60EA-1 Woche	62
62	Einbau STS	1 Woche	Don 11.09.25	Mit 17.09.25	61	63
63	Verlegung Gleis inkl. Schottereinbau zwischen Schwellen	5 Wochen	Don 18.09.25	Don 23.10.25	62	64
64	Stopfgang (gesamte Baustrecke)	4 Tage	Fre 24.10.25	Mit 29.10.25	56;63	65;71
65	Herstellung Gleiseindeckung (Asphalt)	1 Woche	Don 30.10.25	Don 06.11.25	64	66AA;9EE
66	Herstellung Gleiseindeckung (Rasen)	9 Tage	Don 30.10.25	Mit 12.11.25	65AA	9EE
67	**Fahrleitung**	**28 Wochen**	**Die 22.04.25**	**Mit 12.11.25**		
68	**Verdrückung wegen LWW-Schacht**	**28 Wochen**	**Die 22.04.25**	**Mit 12.11.25**		
69	Verdrückung FL	3 Tage	Die 22.04.25	Fre 25.04.25	77AE-1 Tag	
70	Wiederherstellung Ursprungszustand	3 Tage	Mon 10.11.25	Mit 12.11.25	77;76;71EE	
71	Anpassung Fahrleitung	9 Tage	Don 30.10.25	Mit 12.11.25	64	9EE;70EE
72	Umbau landwärtige Haltestelleninsel Knoten An der Tabaksmühle	2 Wochen	Fre 09.05.25	Don 22.05.25	134;124	
73						
74	**LWW**	**8 Wochen**	**Mon 28.04.25**	**Fre 27.06.25**		
75	Erneuerung MWL 400 PP Kommandant-Prendel-Allee (ca. 30 m) inkl. temp. Deckenschluß	3 Wochen	Mon 28.04.25	Die 20.05.25	30	76AA;48EA-1 Woc
76	Neubau TWL 300 GGG (ca. 324 m) und TWL 100 GGG (ca. 63 m) inkl. Umbindungen HA und Stillegung alte TWL DN 300 bzw. DN 150 inkl. temp. Deckenschluß	8 Wochen	Mon 28.04.25	Fre 27.06.25	75AA	58;39;70
77	Neubau Sonderschacht	4 Wochen	Mon 28.04.25	Die 27.05.25	75AA	58;69AE-1 Tag;70
78						
79	**VTA**	**34 Wochen**	**Mon 14.04.25**	**Fre 19.12.25**		**4EE**
80	**Straßenbeleuchtung**	**10 Wochen**	**Don 17.07.25**	**Mit 24.09.25**		
81	**Neubau im stadtwärtigen Gehweg**	**5 Wochen**	**Don 17.07.25**	**Mit 20.08.25**		**21EA-3 Tage**
82	Kommandant-Prendel-Allee bis Bauende (ca. 300 m), inkl. Aufbruch und Wiederherstellung Gehweg	3 Wochen	Mit 23.07.25	Die 12.08.25	92	
83	Gletschersteinstraße bis Kommandant-Prendel-Allee (ca. 200 m)	1 Woche	Don 14.08.25	Mit 20.08.25	99AA	
84	Ludolf-Colditz-Straße bis Gletschersteinstraße (ca. 400 m), inkl. Aufbruch und Wiederherstellung Gehweg	3 Wochen	Don 17.07.25	Mit 06.08.25	102AA	146AA
85	Neubau im landwärtigen Gehweg, inkl. Aufbruch und Wiederherstellung Gehweg	6 Wochen	Don 14.08.25	Mit 24.09.25	53AA	
86	**Prager Straße**	**28,2 Wochen**	**Mon 02.06.25**	**Fre 19.12.25**		
87	**Straßenbau**	**28,2 Wochen**	**Mon 02.06.25**	**Fre 19.12.25**		
88	**stadtwärts**	**13,4 Wochen**	**Mon 02.06.25**	**Mit 03.09.25**		**21EA-3 Tage**
89	**(hinter) Kommandant-Prendel-Allee bis Bauende (ca. 300 m)**	**7,2 Wochen**	**Mon 02.06.25**	**Die 22.07.25**		
90	Herstellung Radrampe am Bauende	2 Wochen	Fre 06.06.25	Fre 20.06.25	52EE	
91	Ertüchtigung Straßenentwässerung	1 Woche	Mon 02.06.25	Fre 06.06.25	51EE	
92	Deckensanierung (ABi + SMA) inkl. Anbindung Seitenstraßen	4 Tage	Don 17.07.25	Die 22.07.25	37	104;82
93	**grundhafter Ausbau Fahrbahn und Gehweg (Haltestellen) zwischen Gletschersteinstraße und Kommandant-Prendel-Allee (ca. 200 m)**	**6,6 Wochen**	**Mon 21.07.25**	**Mit 03.09.25**		
94	Aufbruch und Auskofferung Fahrbahn	1 Woche	Mon 21.07.25	Fre 25.07.25	59AA+1 Woche	95EA-2 Tage
95	Herstellung Entwässerung und LSA-Tiefbau	1 Woche	Don 24.07.25	Mit 30.07.25	94EA-2 Tage	96EA-3 Tage
96	Herstellung Borde	1 Woche	Mon 28.07.25	Fre 01.08.25	95EA-3 Tage	97
97	Herstellung Bodenaustausch und Erdplanum	3 Tage	Mon 04.08.25	Mit 06.08.25	96	98
98	Asphalteinbau	1 Woche	Don 07.08.25	Mit 13.08.25	97	104;116;103EE;99
99	Herstellung Gehweg einschl. Haltestellen (inkl. Ausrüstungselemente und LSA-Tiefbau)	3 Wochen	Don 14.08.25	Mit 03.09.25	98	83AA;146EE-3 Tage
100	**Ludolf-Colditz-Straße bis Gletschersteinstraße (ca. 400 m)**	**4,6 Wochen**	**Mon 14.07.25**	**Mit 13.08.25**		
101	Ertüchtigung Straßenentwässerung	1 Woche	Mon 14.07.25	Fre 18.07.25	58EE	
102	barrierefreier Umbau Bushaltestelle Ludolf-Colditz-Straße inkl. Anpassung Gehweg und diverse Zufahrten	3 Wochen	Don 17.07.25	Don 07.08.25	103AE	84AA
103	Deckensanierung (ABi + SMA) inkl. Anbindung Seitenstraßen	1 Woche	Don 07.08.25	Mit 13.08.25	41;59;98EE	104;102AE
104	Markierung, Asphaltfugen, Restarbeiten	7 Tage	Don 14.08.25	Fre 22.08.25	98;92;103	18AA-1 Tag
105	**landwärts**	**14,8 Wochen**	**Don 04.09.25**	**Fre 19.12.25**		
106	**(hinter) Kommandant-Prendel-Allee bis Bauende (ca. 300 m)**	**3,2 Wochen**	**Mon 17.11.25**	**Die 09.12.25**		
107	Herstellung Radrampe am Bauende	1 Woche	Mon 17.11.25	Mon 24.11.25	113AA	
108	Ertüchtigung Straßenentwässerung	1 Woche	Mon 17.11.25	Mon 24.11.25	113AA	
109	Deckensanierung (ABi + SMA)	4 Tage	Don 04.12.25	Die 09.12.25	116EE	120
110	**grundhafter Ausbau Fahrbahn und Gehweg (Haltestellen) zwischen Gletschersteinstraße und Kommandant-Prendel-Allee (ca. 200 m)**	**13,2 Wochen**	**Don 04.09.25**	**Die 09.12.25**		
111	Herstellung westl. Fahrbahnbord (am Gehweg)	1 Woche	Don 04.09.25	Mit 10.09.25	60	112
112	Herstellung Gehweg einschl. Haltestellen (inkl. Ausrüstungselemente und LSA-Tiefbau)	4 Wochen	Don 11.09.25	Don 09.10.25	111	
113	Aufbruch und Auskofferung Fahrbahn	1 Woche	Mon 17.11.25	Mon 24.11.25	25AA	114EA-2 Tage;118
114	Herstellung Entwässerung und LSA-Tiefbau	1 Woche	Fre 21.11.25	Don 27.11.25	113EA-2 Tage	115
115	Herstellung Bodenaustausch und Erdplanum	3 Tage	Fre 28.11.25	Die 02.12.25	114	116
116	Asphalteinbau	1 Woche	Mit 03.12.25	Die 09.12.25	98;115	120;109EE;119EE;
117	**An der Tabaksmühle bis Gletschersteinstraße (ca. 400 m)**	**3,2 Wochen**	**Mon 17.11.25**	**Die 09.12.25**		
118	Ertüchtigung Straßenentwässerung	1 Woche	Mon 17.11.25	Mon 24.11.25	113AA	
119	Deckensanierung (ABi + SMA)	1 Woche	Mit 03.12.25	Die 09.12.25	116EE	120
120	Markierung, Asphaltfugen, Restarbeiten	1,6 Wochen	Mit 10.12.25	Fre 19.12.25	116;109;119	140EE-1 Tag;142E
121	**Knotenbereich An der Tabaksmühle**	**9 Wochen**	**Mon 14.04.25**	**Die 24.06.25**		
122	Umbau- bzw. Ausbau Schönbachstraße und Ludolf-Colditzstraße	4 Wochen	Mon 14.04.25	Don 15.05.25	13AA	129AA;124AA;126
123	Anpassung Radverkehrsanlage (südöstlich)	2 Wochen	Fre 09.05.25	Don 22.05.25	134	126
124	barrierefreier Umbau Bushaltestelle	3 Wochen	Mon 14.04.25	Don 08.05.25	122AA	72;126
125	Umbau Dreiecksinsel	1 Woche	Fre 09.05.25	Don 15.05.25	134	126
126	Deckensanierung im gesamten Knotenbereich	2 Wochen	Fre 23.05.25	Die 10.06.25	122;123;124;125	127
127	Markierungsarbeiten im gesamten Knotenbereich	2 Wochen	Mit 11.06.25	Die 24.06.25	126	137
128	**Straßenbeleuchtung**	**6 Wochen**	**Mon 14.04.25**	**Mon 02.06.25**		
129	Querung Ludolf-Colditz-Straße inkl. endgültiger Deckenschluß	1 Woche	Mon 14.04.25	Die 22.04.25	122AA	130;134AA
130	ggf. erforderliche Umbaumaßnahmen im restlichen Knotenbereich	1 Woche	Mit 23.04.25	Die 29.04.25	129	131
131	technische Ausrüstung (Maststellung, Inbetriebnahme)	2 Tage	Mit 28.05.25	Mon 02.06.25	130;136EE	
132	**stationäre LSA**	**33,8 Wochen**	**Mon 14.04.25**	**Don 18.12.25**		
133	**An der Tabaksmühle**	**9,2 Wochen**	**Mon 14.04.25**	**Mit 25.06.25**		
134	Erneuerung der gesamten Verrohrung inkl. Schächte inkl. endgültiger Deckenschluß	3 Wochen	Mon 14.04.25	Don 08.05.25	129AA	135EE;123;125;72
135	Erneuerung LSA-Fundamente im gesamten Knotenbereich	2 Wochen	Mit 23.04.25	Don 08.05.25	134EE	136EA+1 Woche
136	technische Ausrüstung (Maststellung, LSA-Montage)	2 Wochen	Fre 16.05.25	Mon 02.06.25	135EA+1 Woche	137;131EE
137	Inbetriebnahme	1 Tag	Mit 25.06.25	Mit 25.06.25	136;127	15AA-3 Tage
138	**Kommandant-Prendel-Allee**	**1,4 Wochen**	**Mit 10.12.25**	**Don 18.12.25**		
139	technische Ausrüstung (Maststellung, LSA-Montage)	1 Woche	Mit 10.12.25	Die 16.12.25	116	140
140	Inbetriebnahme	1 Tag	Don 18.12.25	Don 18.12.25	139;120EE-1 Tag	
141	**Landschaftsbau**	**2 Wochen**	**Mon 08.12.25**	**Fre 19.12.25**		
142	Baumpflanzungen inkl. Erdarbeiten	2 Wochen	Mon 08.12.25	Fre 19.12.25	120EE	
143						
144	**NL-Elt.**	**7 Wochen**	**Mon 28.07.25**	**Fre 12.09.25**		
145	Neubau MS im landwärtigen Gehweg (am Bauende)	4,4 Wochen	Don 14.08.25	Fre 12.09.25	53AA	
146	Neubau MS im stadtwärtigen Gehweg zwischen Gletschersteinstraße und Tankstelle	5 Wochen	Mon 28.07.25	Fre 29.08.25	84AA;99EE-3 Tage	

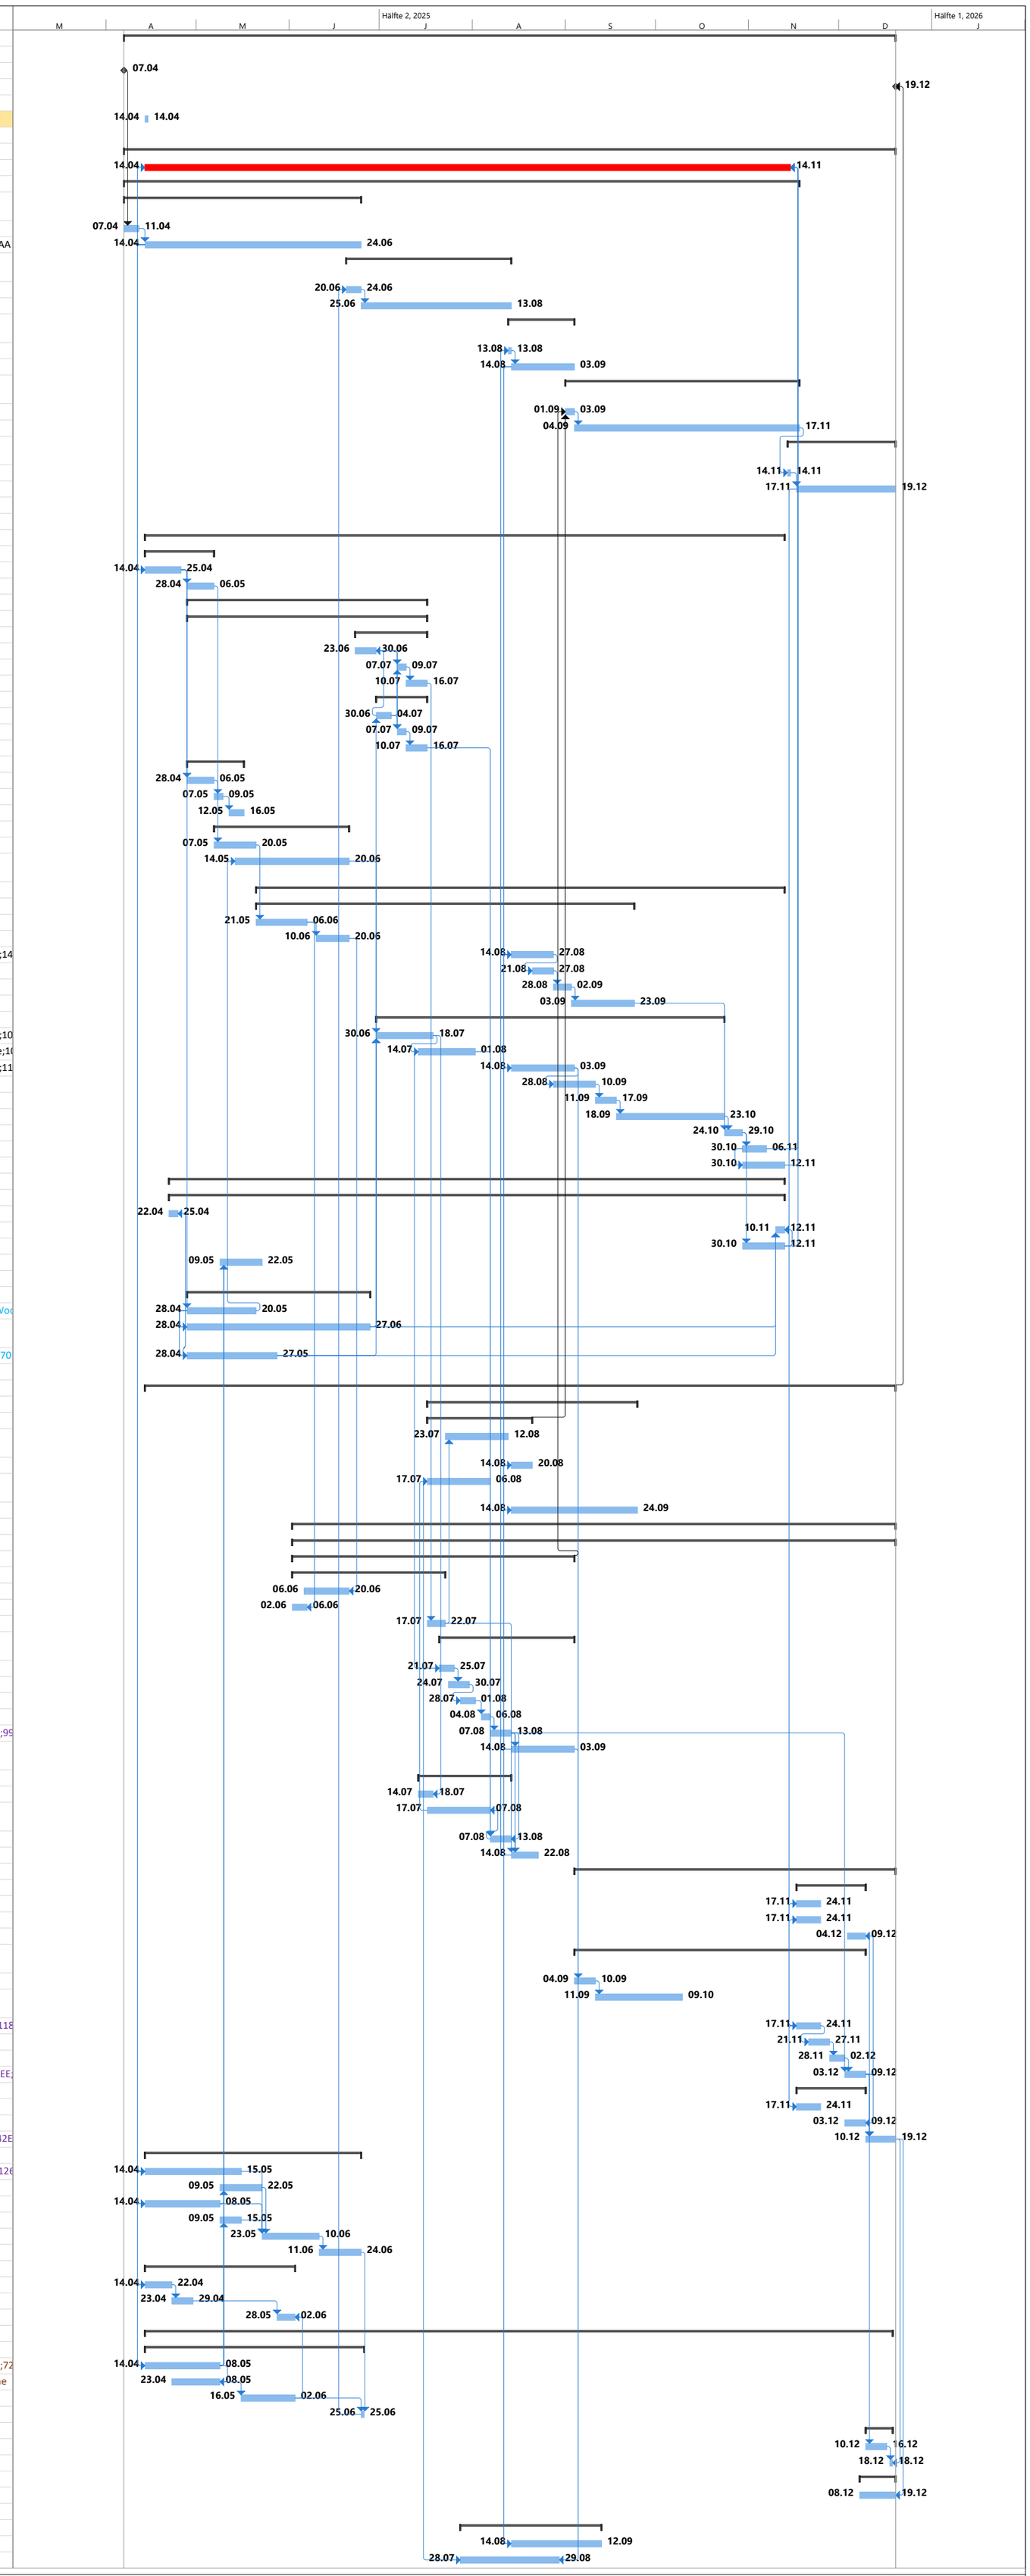

Projekt: Prager Straße
Datum: Mon 23.09.24

Vorgang | Sammelvorgang | Inaktiver Meilenstein | Nur Dauer | Nur Anfang | Externer Meilenstein | Manueller Fortschritt
Unterbrechung | Projektsammelvorgang | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Sammelrollup | Nur Ende | Stichtag
Meilenstein | Inaktiver Vorgang | Manueller Vorgang | Manueller Sammelvorgang | Externe Vorgänge | In Arbeit
