BAUZEITENPLAN (Vorabzug)

Stand: 12.12.2024

[redacted]

Projekt: Sanierung Mehrgenerationenbad Pattensen

[redacted]

[redacted]

erstellt von: RD überarbeitet von: BG
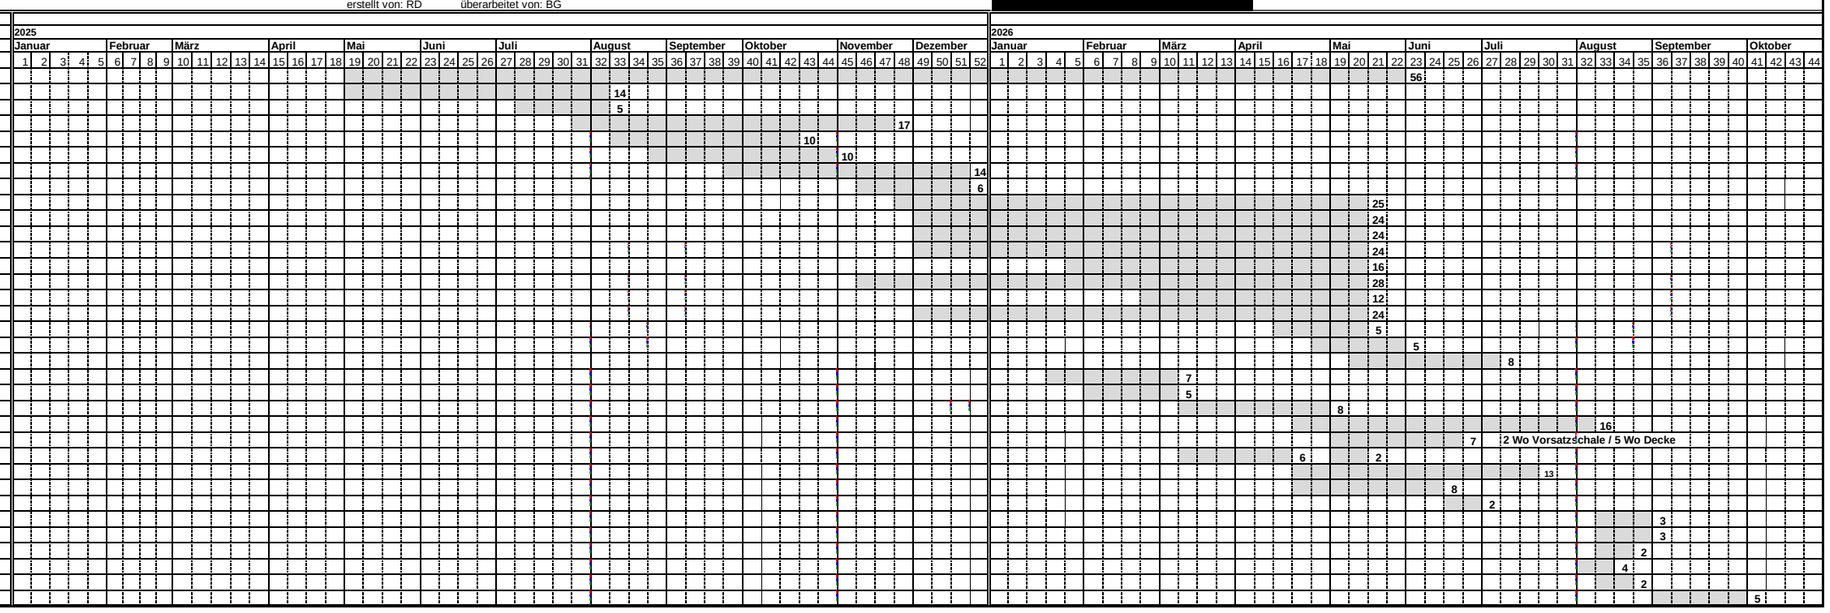
Nr.	Leistung		Jahr / Monat / Woche	
1	**Gerüstbauarbeiten inkl. Vorhaltezeitraum**		*56 Wo*	**19 - 22 KW**
2	**Schadstoffsanierung / Abbrucharbeiten / TGA-Demontage**	WES / GSF / IWT	*14 Wo*	**19 - 32 KW**
3	**Betonsanierungsarbeiten**	Grage	*5 Wo*	**28 - 32 KW**
4	**Rohbauarbeiten**		*17 Wo*	**31 - 47 KW**
5	**Dachdeckerarbeiten**		*10 Wo*	**33 - 42 KW**
6	**Verglasungsarbeiten** (6-8 Wo Bestellung)		*10 Wo*	**35 - 44 KW**
7	**Vorhangfassade**		*14 Wo*	**39 - 51 KW**
8	**Trockenbauarbeiten** (zuerst Vorsatzschale/Verkleidung)		*6 Wo*	**46 - 51 KW**
9	**Elektroarbeiten**	IWT	*25 Wo*	**48 - 20 KW**
10	**Heizungsarbeiten**	IWT	*24 Wo*	**49 - 20 KW**
11	**Sanitärarbeiten**	IWT	*24 Wo*	**49 - 20 KW**
12	**Lüftungstechnik**	IWT	*24 Wo*	**49 - 20 KW**
13	**Blitzschutzarbeiten**	IWT	*16 Wo*	**05 - 20 KW**
14	**Badewassertechnik**	IWT	*28 Wo*	**46 - 20 KW**
15	**Technische Dämmung**	IWT	*12 Wo*	**09 - 20 KW**
16	**Gebäudeautomation**	IWT	*24 Wo*	**49 - 20 KW**
17	**Förderanlagen** (Aufzug)	IWT	*5 Wo*	**18 - 20 KW**
18	**Rutschenbauarbeiten**		*5 Wo*	**18 - 22 KW**
19	**Freianlagenarbeiten** (Beachfelder+Wasserspielplatz)		*8 Wo*	**16 - 23 KW**
20	**Innenputzarbeiten**		*7 Wo*	**02 - 08 KW**
21	**Schlosserarbeiten**		*5 Wo*	**04 - 08 KW**
22	**Estricharbeiten** (4 Wo Trocknung)		*8 Wo*	**09 - 16 KW**
23	**Abdichtungs- und Fliesenarbeiten**		*16 Wo*	**13 - 28 KW**
24	**Trockenbauarbeiten** (Abhangdecken)		*7 Wo*	**21-27 KW**
25	**Innentürenarbeiten** (4-6 Wo Bestellung)		*8 Wo*	**01 - 10 KW**
26	**Malerarbeiten**		*13 Wo*	**17 - 29 KW**
27	**WC-Trennwandsystem- u. Garderobenschränkearbeiten**		*8 Wo*	**17 - 24 KW**
28	**Schreinerarbeiten**		*2 Wo*	**23 - 24 KW**
29	**Schliessanlagenbauarbeiten**		*3 Wo*	**23 - 25 KW**
30	**Kassenalagenbauarbeiten / Drehkreuzanlage**	IWT	*3 Wo*	**23 - 25 KW**
31	**Beschilderungsarbeiten**		*2 Wo*	**26 - 27 KW**
32	**Außenwerbungsarbeiten**		*4 Wo*	**25 - 27 KW**
33	**Ausstattungsarbeiten / Möblierung**		*2 Wo*	**26 - 27 KW**
34	**Bauendreinigung**		*5 Wo*	**26 - 30 KW**
