Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz

Neubau Hochbehälter Heide Rosenthal

BORN | ERMEL | Ingenieure

Vorläufiger Bauzeitenplan

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger	Los	Zuständig
1	**Vergabe, Bauvorbereitung**	**14 Wochen**	**Don 23.01.25**	**Mon 05.05.25**				
17	**Vorläufiger Bauablauf**	**45,6 Wochen**	**Mon 12.05.25**	**Don 09.04.26**			**00-Gesamt**	
18	**Baustelleneinrichtung und Provisorium**	**4 Wochen**	**Mon 12.05.25**	**Mit 11.06.25**				
19	Baubeginn (Gesamt)	0 Tage	Mon 12.05.25	Mon 12.05.25	14EA+5 Tage	20;16EA-2 W	00-Gesamt	AN, ZVWV
20	Baustelleneinrichtung	2 Tage	Die 13.05.25	Mit 14.05.25	19	21EE	01-Los	AN
21	Baum fällen / Baumschutz herstellen	1 Tag	Mit 14.05.25	Mit 14.05.25	20EE	22	01-Los	AN
22	Oberboden abschieben, Baufeld freimachen/herrichten, Baustraße einrichten	5 Tage	Don 15.05.25	Mit 21.05.25	21	23	01-Los	AN
23	Herstellung Fundament Provisorium	4 Tage	Don 22.05.25	Die 27.05.25	22	24EE;26EA+4	01-Los	AN
24	Suchschachtung Bestandsleitungen	1 Tag	Die 27.05.25	Die 27.05.25	23EE	25	01-Los	AN
25	Verlegung prov. Leitung zwischen Bestandsrohrleitungen und Provisorium	4 Tage	Mit 28.05.25	Die 03.06.25	24	26	01-Los	AN
26	Aufstellung Provisorium und Anschluss Leitungen	1 Tag	Mit 04.06.25	Mit 04.06.25	23EA+4 Tage;25	63;27	01-Los	AN
27	Spülen, Keimfreiheit, Inbetriebnahme Provisorium	4 Tage	Don 05.06.25	Mit 11.06.25	26	28	01-Los	AN
28	Fertigstellung Anbindung Rohrleitungen Provisorium (Los 1)	0 Tage	Mit 11.06.25	Mit 11.06.25	63;27	30	01-Los	AN
62	**EMSR-Technik**	**31,2 Wochen**	**Don 05.06.25**	**Mon 19.01.26**			03-Los	
63	Anbindung Messtechnik Provisorium an Pumpwerk	3 Tage	Don 05.06.25	Die 10.06.25	26	28;64	03-Los	AN
64	Fertigstellung Anbindung Provisorium (Los 3)	0 Wochen	Die 10.06.25	Die 10.06.25	63		03-Los	AN
65	EMSR-technische Ausrüstung	10 Tage	Die 06.01.26	Mon 19.01.26	56;68;71	66	03-Los	AN
66	Fertigstellung EMSR-Technik (Los 3)	0 Tage	Mon 19.01.26	Mon 19.01.26	65	72	03-Los	AN
29	**Abbruch Bestand**	**2,4 Wochen**	**Don 12.06.25**	**Fre 27.06.25**				
30	Baugrube herrichten, Wasserhaltung	4 Tage	Don 12.06.25	Die 17.06.25	28	31	01-Los	AN
31	Abbruch Bestandsbauwerk	5 Tage	Mit 18.06.25	Die 24.06.25	30	34;32	01-Los	AN
32	Entsorgung Bauschutt	3 Tage	Mit 25.06.25	Fre 27.06.25	31		01-Los	AN
33	**Errichtung Rohbau**	**20,6 Wochen**	**Mit 25.06.25**	**Die 18.11.25**				
34	Planum, Gebäudeentwässerung, Kies/Schotterschicht, Sauberkeitsschicht	5 Tage	Mit 25.06.25	Die 01.07.25	31	35	01-Los	AN
35	Herstellung Bodenplatte Pumpensumpf	3 Tage	Mit 02.07.25	Fre 04.07.25	34	36EA+10 Tage;37EA+1	01-Los	AN
36	Herstellung Bodenplatte Behälter	7 Tage	Mon 21.07.25	Die 29.07.25	35EA+10 Tage	38EA+10 Tag	01-Los	AN
37	Herstellung Bodenplatte Schieberkammer	5 Tage	Mon 21.07.25	Fre 25.07.25	35EA+10 Tage		01-Los	AN
38	Herstellung Wände Behälter	8 Tage	Mit 13.08.25	Fre 22.08.25	36EA+10 Tage	41EA+10 Tag	01-Los	AN

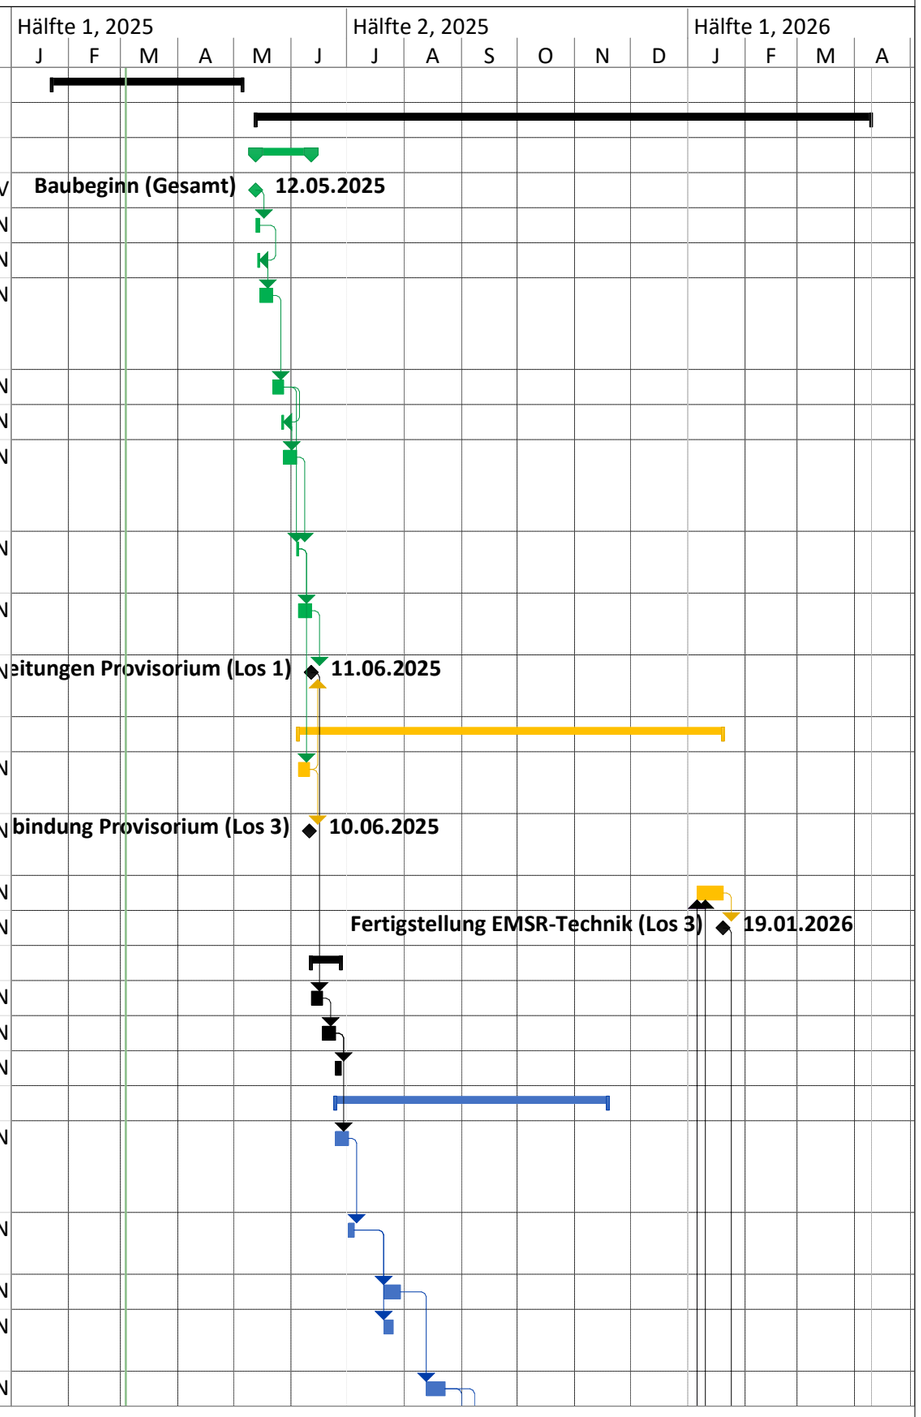

Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz

Neubau Hochbehälter Heide Rosenthal

BORN | ERMEL | Ingenieure

Vorläufiger Bauzeitenplan
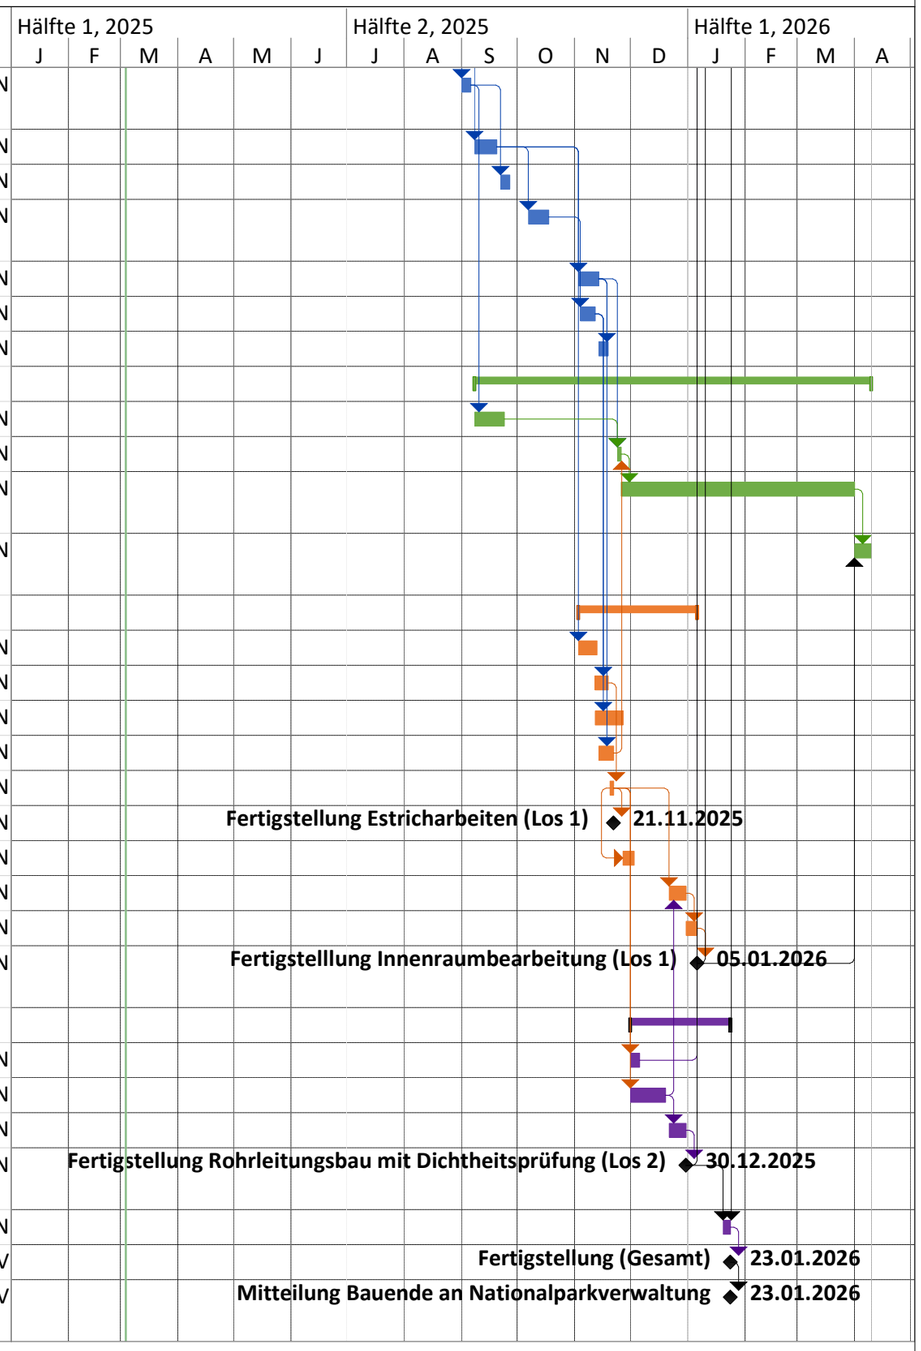
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger	Los	Zuständig
39	Herstellung Wände UG Schieberkammer	5 Tage	Mon 01.09.25	Fre 05.09.25	38EA+5 Tage	40EA+10 Tage;58	01-Los	AN
41	Herstellung Decke Behälter	10 Tage	Mon 08.09.25	Fre 19.09.25	38EA+10 Tage	42EA+10 Tag	01-Los	AN
40	Herstellung Zwischendecke	5 Tage	Mon 22.09.25	Fre 26.09.25	39EA+10 Tage		01-Los	AN
42	Herstellung Wände EG Schieberkammer	9 Tage	Die 07.10.25	Fre 17.10.25	41EA+10 Tage	44EA+10 Tage	01-Los	AN
43	Dichtheitsprüfung	9 Tage	Mon 03.11.25	Don 13.11.25	41EA+28 Tage	45;47;59	01-Los	AN
44	Errichtung Dachstuhl	6 Tage	Die 04.11.25	Die 11.11.25	42EA+10 Tage	48;49	01-Los	AN
45	Abdichtung Dach Wasserkammer	3 Tage	Fre 14.11.25	Die 18.11.25	43		01-Los	AN
57	**Landschaftsbauarbeiten**	**29,2 Wochen**	**Mon 08.09.25**	**Don 09.04.26**				
58	Erdverlegte Rohrleitungen	12 Tage	Mon 08.09.25	Die 23.09.25	39	59	01-Los	AN
59	Rückverfüllung	2 Tage	Mon 24.11.25	Die 25.11.25	43;47;58	60	01-Los	AN
60	Außentreppe, Außenanlagen, Landschaftsbau	87 Tage	Mit 26.11.25	Die 31.03.26	59	61	04-Los	AN
61	Rückbau Baustelleneinrichtung und Provisorium	5 Tage	Mit 01.04.26	Don 09.04.26	60;56		01-Los	AN
46	**Ausbau**	**8,4 Wochen**	**Mon 03.11.25**	**Mon 05.01.26**				
53	Herstellung Tröpfchendecke	8 Tage	Mon 03.11.25	Mit 12.11.25	41EA+28 Tage		01-Los	AN
48	Dachdeckung	5 Tage	Mit 12.11.25	Die 18.11.25	44	50	01-Los	AN
49	Fassade Schieberkammer	10 Tage	Mit 12.11.25	Mit 26.11.25	44		01-Los	AN
47	Perimeterdämmung UG	5 Tage	Fre 14.11.25	Fre 21.11.25	43	59	01-Los	AN
50	Einbau Estrich	2 Tage	Don 20.11.25	Fre 21.11.25	48	52AA+1 Wo	01-Los	AN
51	Fertigstellung Estricharbeiten (Los 1)	0 Wochen	Fre 21.11.25	Fre 21.11.25	50		01-Los	AN
52	Einbau Türen und Fenster	4 Tage	Don 27.11.25	Die 02.12.25	50AA+1 Woche		01-Los	AN
54	Fliesenarbeiten Schieberkammer	5 Tage	Mon 22.12.25	Die 30.12.25	50EA+4 Woche	55	01-Los	AN
55	Malerarbeiten Schieberkammer	3 Tage	Mit 31.12.25	Mon 05.01.26	54	56	01-Los	AN
56	Fertigstelllung Innenraumbearbeitung (Los 1)	0 Tage	Mon 05.01.26	Mon 05.01.26	55	61;65	01-Los	AN
67	**Ausrüstung und Stahlbau**	**7,4 Wochen**	**Mon 01.12.25**	**Fre 23.01.26**			02-Los	
68	Stahlbau Treppen und Podeste	5 Tage	Mon 01.12.25	Fre 05.12.25	50EA+1 Woche	65	02-Los	AN
69	Rohrleitungsbau	15 Tage	Mon 01.12.25	Fre 19.12.25	50EA+1 Woche	70;54	02-Los	AN
70	Dichtheitsprüfung Rohrleitungen	5 Tage	Mon 22.12.25	Die 30.12.25	69	71	02-Los	AN
71	Fertigstellung Rohrleitungsbau mit Dichtheitsprüfung (Los 2)	0 Tage	Die 30.12.25	Die 30.12.25	70	72;65	02-Los	AN
72	Keimfreiheit, Probebetrieb	4 Tage	Die 20.01.26	Fre 23.01.26	66;71	73	02-Los	AN
73	Fertigstellung (Gesamt)	0 Tage	Fre 23.01.26	Fre 23.01.26	72	74	00-Gesamt	AN, ZVWV
74	Mitteilung Bauende an Nationalparkverwaltung	0 Wochen	Fre 23.01.26	Fre 23.01.26	73		00-Gesamt	ZVWV
