Neubau Grundschule Döbeln Ost
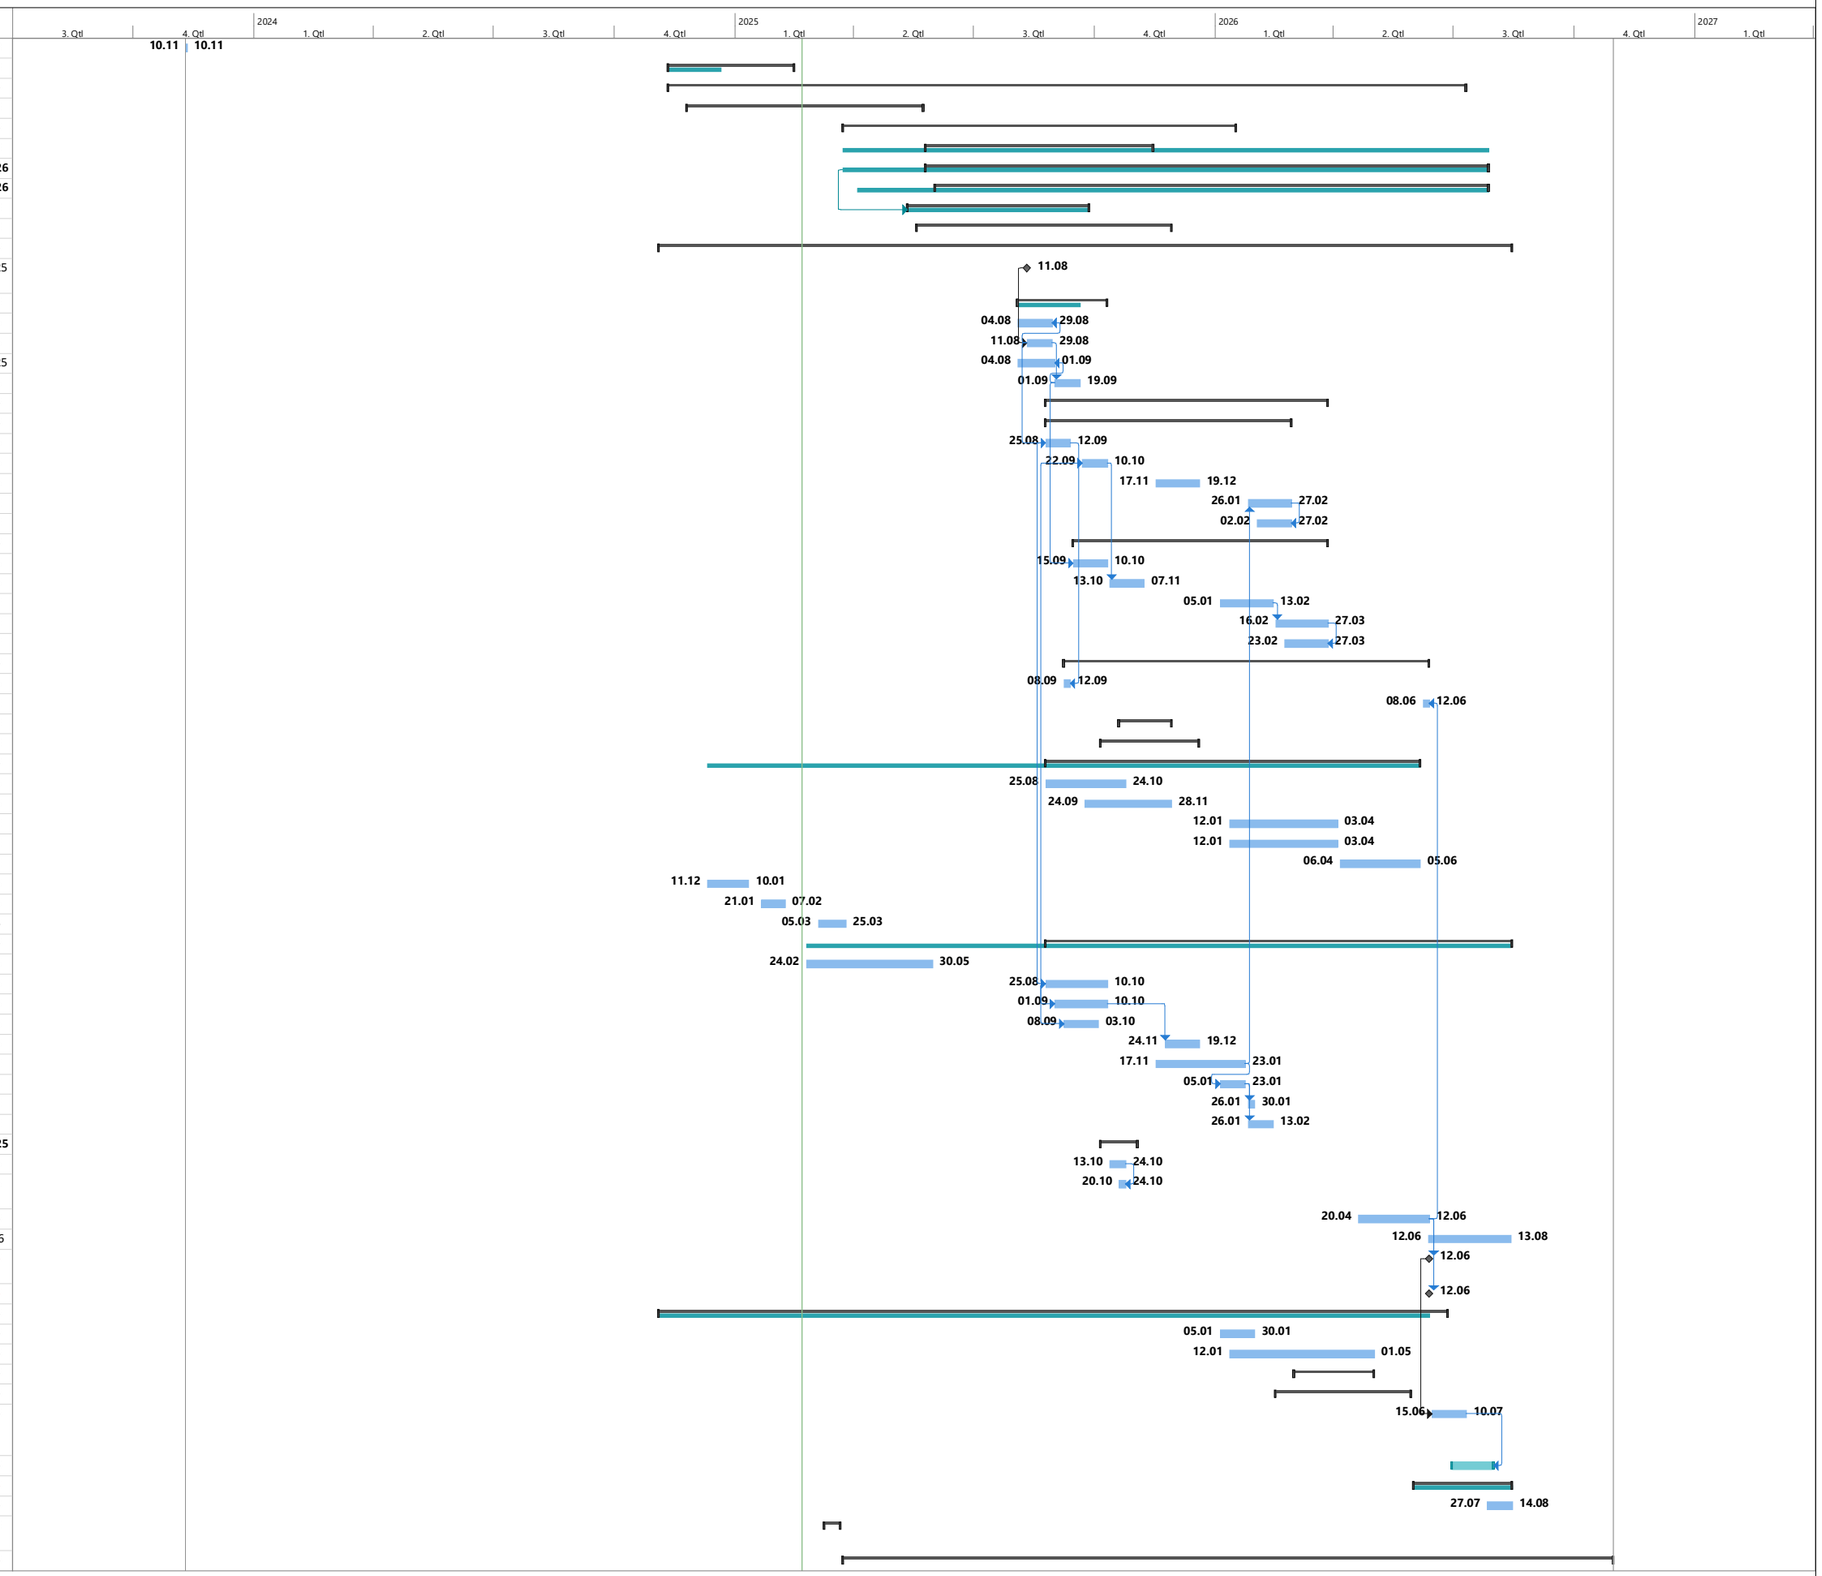
Nr.	Vorgang	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1		Vorbereitende Arbeiten	1 Tag?	Fre 10.11.23	Fre 10.11.23
2		**Erdarbeiten Baugrube**	**60 Tage**	**Mon 11.11.24**	**Fre 14.02.25**
8		**Baustelleneinrichtung allgemein**	**415 Tage**	**Mon 11.11.24**	**Fre 10.07.26**
13		**Rohbau**	**120 Tage**	**Mon 25.11.24**	**Fre 23.05.25**
25		**Gerüstbau**	**205 Tage**	**Mon 24.03.25**	**Fre 16.01.26**
28		**Gebäudehülle**	**125 Tage**	**Mon 26.05.25**	**Fre 14.11.25**
29		**Fenster Kunststoff**	**296 Tage**	**Mon 26.05.25**	**Mon 27.07.26**
34		**Alu-Glasfassaden EG+OG + Sonnenschutz**	**291 Tage**	**Mon 02.06.25**	**Mon 27.07.26**
38		**Dach**	**100 Tage**	**Mon 12.05.25**	**Fre 26.09.25**
41		**Fassade**	**140 Tage**	**Mon 19.05.25**	**Fre 28.11.25**
45		**Innenausbau**	**445 Tage?**	**Mon 04.11.24**	**Fre 14.08.26**
46		Beginn, Haus wetterdicht, Zwischenabdichtung Dach, nach Sommerferien	0 Tage	Mon 11.08.25	Mon 11.08.25
47		**Innenputz**	**50 Tage**	**Mon 04.08.25**	**Fre 10.10.25**
48		EG Vorbereitung	4 Wochen	Mon 04.08.25	Fre 29.08.25
49		EG	3 Wochen	Mon 11.08.25	Fre 29.08.25
50		OG Vorbereitung	4 Wochen	Mon 04.08.25	Mon 01.09.25
51		OG	3 Wochen	Mon 01.09.25	Fre 19.09.25
52		**Trockenbau**	**145 Tage**	**Mon 25.08.25**	**Fre 27.03.26**
53		**EG**	**125 Tage**	**Mon 25.08.25**	**Fre 27.02.26**
54		Anlegen Wände, Schächte	3 Wochen	Mon 25.08.25	Fre 12.09.25
55		Schließen Wände, Schächte	3 Wochen	Mon 22.09.25	Fre 10.10.25
56		Decken anlegen	5 Wochen	Mon 17.11.25	Fre 19.12.25
57		Decken schließen	5 Wochen	Mon 26.01.26	Fre 27.02.26
58		Spachteln, Schleifen	4 Wochen	Mon 02.02.26	Fre 27.02.26
59		**OG**	**130 Tage**	**Mon 15.09.25**	**Fre 27.03.26**
60		Anlegen Wände, Schächte	4 Wochen	Mon 15.09.25	Fre 10.10.25
61		Schließen Wände, Schächte	4 Wochen	Mon 13.10.25	Fre 07.11.25
62		Decken anlegen	6 Wochen	Mon 05.01.26	Fre 13.02.26
63		Decken schließen	6 Wochen	Mon 16.02.26	Fre 27.03.26
64		Spachteln, Schleifen	5 Wochen	Mon 23.02.26	Fre 27.03.26
65		**Mobile Trennwand**	**190 Tage**	**Mon 08.09.25**	**Fre 12.06.26**
66		Deckenschiene, Wandprofile	1 Woche	Mon 08.09.25	Fre 12.09.25
67		Endmontage	1 Woche	Mon 08.06.26	Fre 12.06.26
68		**Schlosser**	**30 Tage**	**Mon 20.10.25**	**Fre 28.11.25**
71		**Estricheinbau**	**55 Tage**	**Mon 06.10.25**	**Fre 19.12.25**
83		**Elektro**	**195 Tage?**	**Mon 25.08.25**	**Fre 05.06.26**
84		Rohmontage EG	45 Tage	Mon 25.08.25	Fre 24.10.25
85		Rohmontage OG	48 Tage	Mit 24.09.25	Fre 28.11.25
86		Feinmontage EG	60 Tage	Mon 12.01.26	Fre 03.04.26
87		Feinmontage OG	60 Tage	Mon 12.01.26	Fre 03.04.26
88		Inbetriebnahme	45 Tage	Mon 06.04.26	Fre 05.06.26
89		Fundamenterder / Rohbau	13 Tage	Mit 11.12.24	Fre 10.01.25
90		Leerrohre Beton / Rohbau EG	14 Tage	Die 21.01.25	Fre 07.02.25
91		Leerrohre Beton / Rohbau OG	15 Tage	Mit 05.03.25	Die 25.03.25
92		**TGA**	**245 Tage?**	**Mon 25.08.25**	**Fre 14.08.26**
93		Werkplanung	70 Tage	Mon 24.02.25	Fre 30.05.25
94		Rohmontage HSL Wände	7 Wochen	Mon 25.08.25	Fre 10.10.25
95		Rohmontagen Heizungsverteiler	6 Wochen	Mon 01.09.25	Fre 10.10.25
96		FW-HA-Staion durch SWL	4 Wochen	Mon 08.09.25	Fre 03.10.25
97		ASP Heizung-1 (für provi. Betrieb)	4 Wochen	Mon 24.11.25	Fre 19.12.25
98		Rohmontage HSL Decken	2 Monate	Mon 17.11.25	Fre 23.01.26
99		Montagen HK im EG	3 Wochen	Mon 05.01.26	Fre 23.01.26
100		IB Heizung-1 (provi. Betrieb)	1 Woche	Mon 26.01.26	Fre 30.01.26
101		Montagen HK im OG	3 Wochen	Mon 26.01.26	Fre 13.02.26
102		**Rohmontage Boden Heizung**	**20 Tage**	**Mon 06.10.25**	**Mon 03.11.25**
105		Verlegung Fußbodenheizung Estrich	2 Wochen	Mon 13.10.25	Fre 24.10.25
106		Verlegung Fußbodenheizung Trockenestrich	1 Woche	Mon 20.10.25	Fre 24.10.25
107		**Feinmontage**	**8 Wochen**	**Mon 20.04.26**	**Fre 12.06.26**
108		Mängelbeseitigung / IB /Probebetrieb	45 Tage	Fre 12.06.26	Don 13.08.26
109		Abnahmen / Fertigstellung Sanitär / Heizung	0 Tage	Fre 12.06.26	Fre 12.06.26
110		Abnahmen / Fertigstellung Lüftung / GA	0 Tage	Fre 12.06.26	Fre 12.06.26
111		**Aufzug**	**410 Tage**	**Mon 04.11.24**	**Fre 26.06.26**
116		**Fliesen**	**4 Wochen**	**Mon 05.01.26**	**Fre 30.01.26**
117		**Innentüren**	**16 Wochen**	**Mon 12.01.26**	**Fre 01.05.26**
118		**Bodenbeläge**	**45 Tage**	**Mon 02.03.26**	**Fre 01.05.26**
121		**Maler**	**75 Tage**	**Mon 16.02.26**	**Fre 29.05.26**
125		**Nacharbeiten, Komplettierung, Inbetriebnahmen, Mangelbeseitigung, Abnahmen**	**4 Wochen**	**Mon 15.06.26**	**Fre 10.07.26**
126		**Möblierung, Ausstattung**	**4,8 Wochen**	**Die 30.06.26**	**Fre 31.07.26**
127		**Baureinigung**	**55 Tage**	**Mon 01.06.26**	**Fre 14.08.26**
130		**Umzug Schule**	**15 Tage?**	**Mon 27.07.26**	**Fre 14.08.26**
131		**Erdarbeiten, Rest aus Los Erschließung / Erdarbeiten**	**10 Tage**	**Mon 10.03.25**	**Fre 21.03.25**
133		**Außenanlagen**	**410 Tage**	**Mon 24.03.25**	**Fre 30.10.26**
