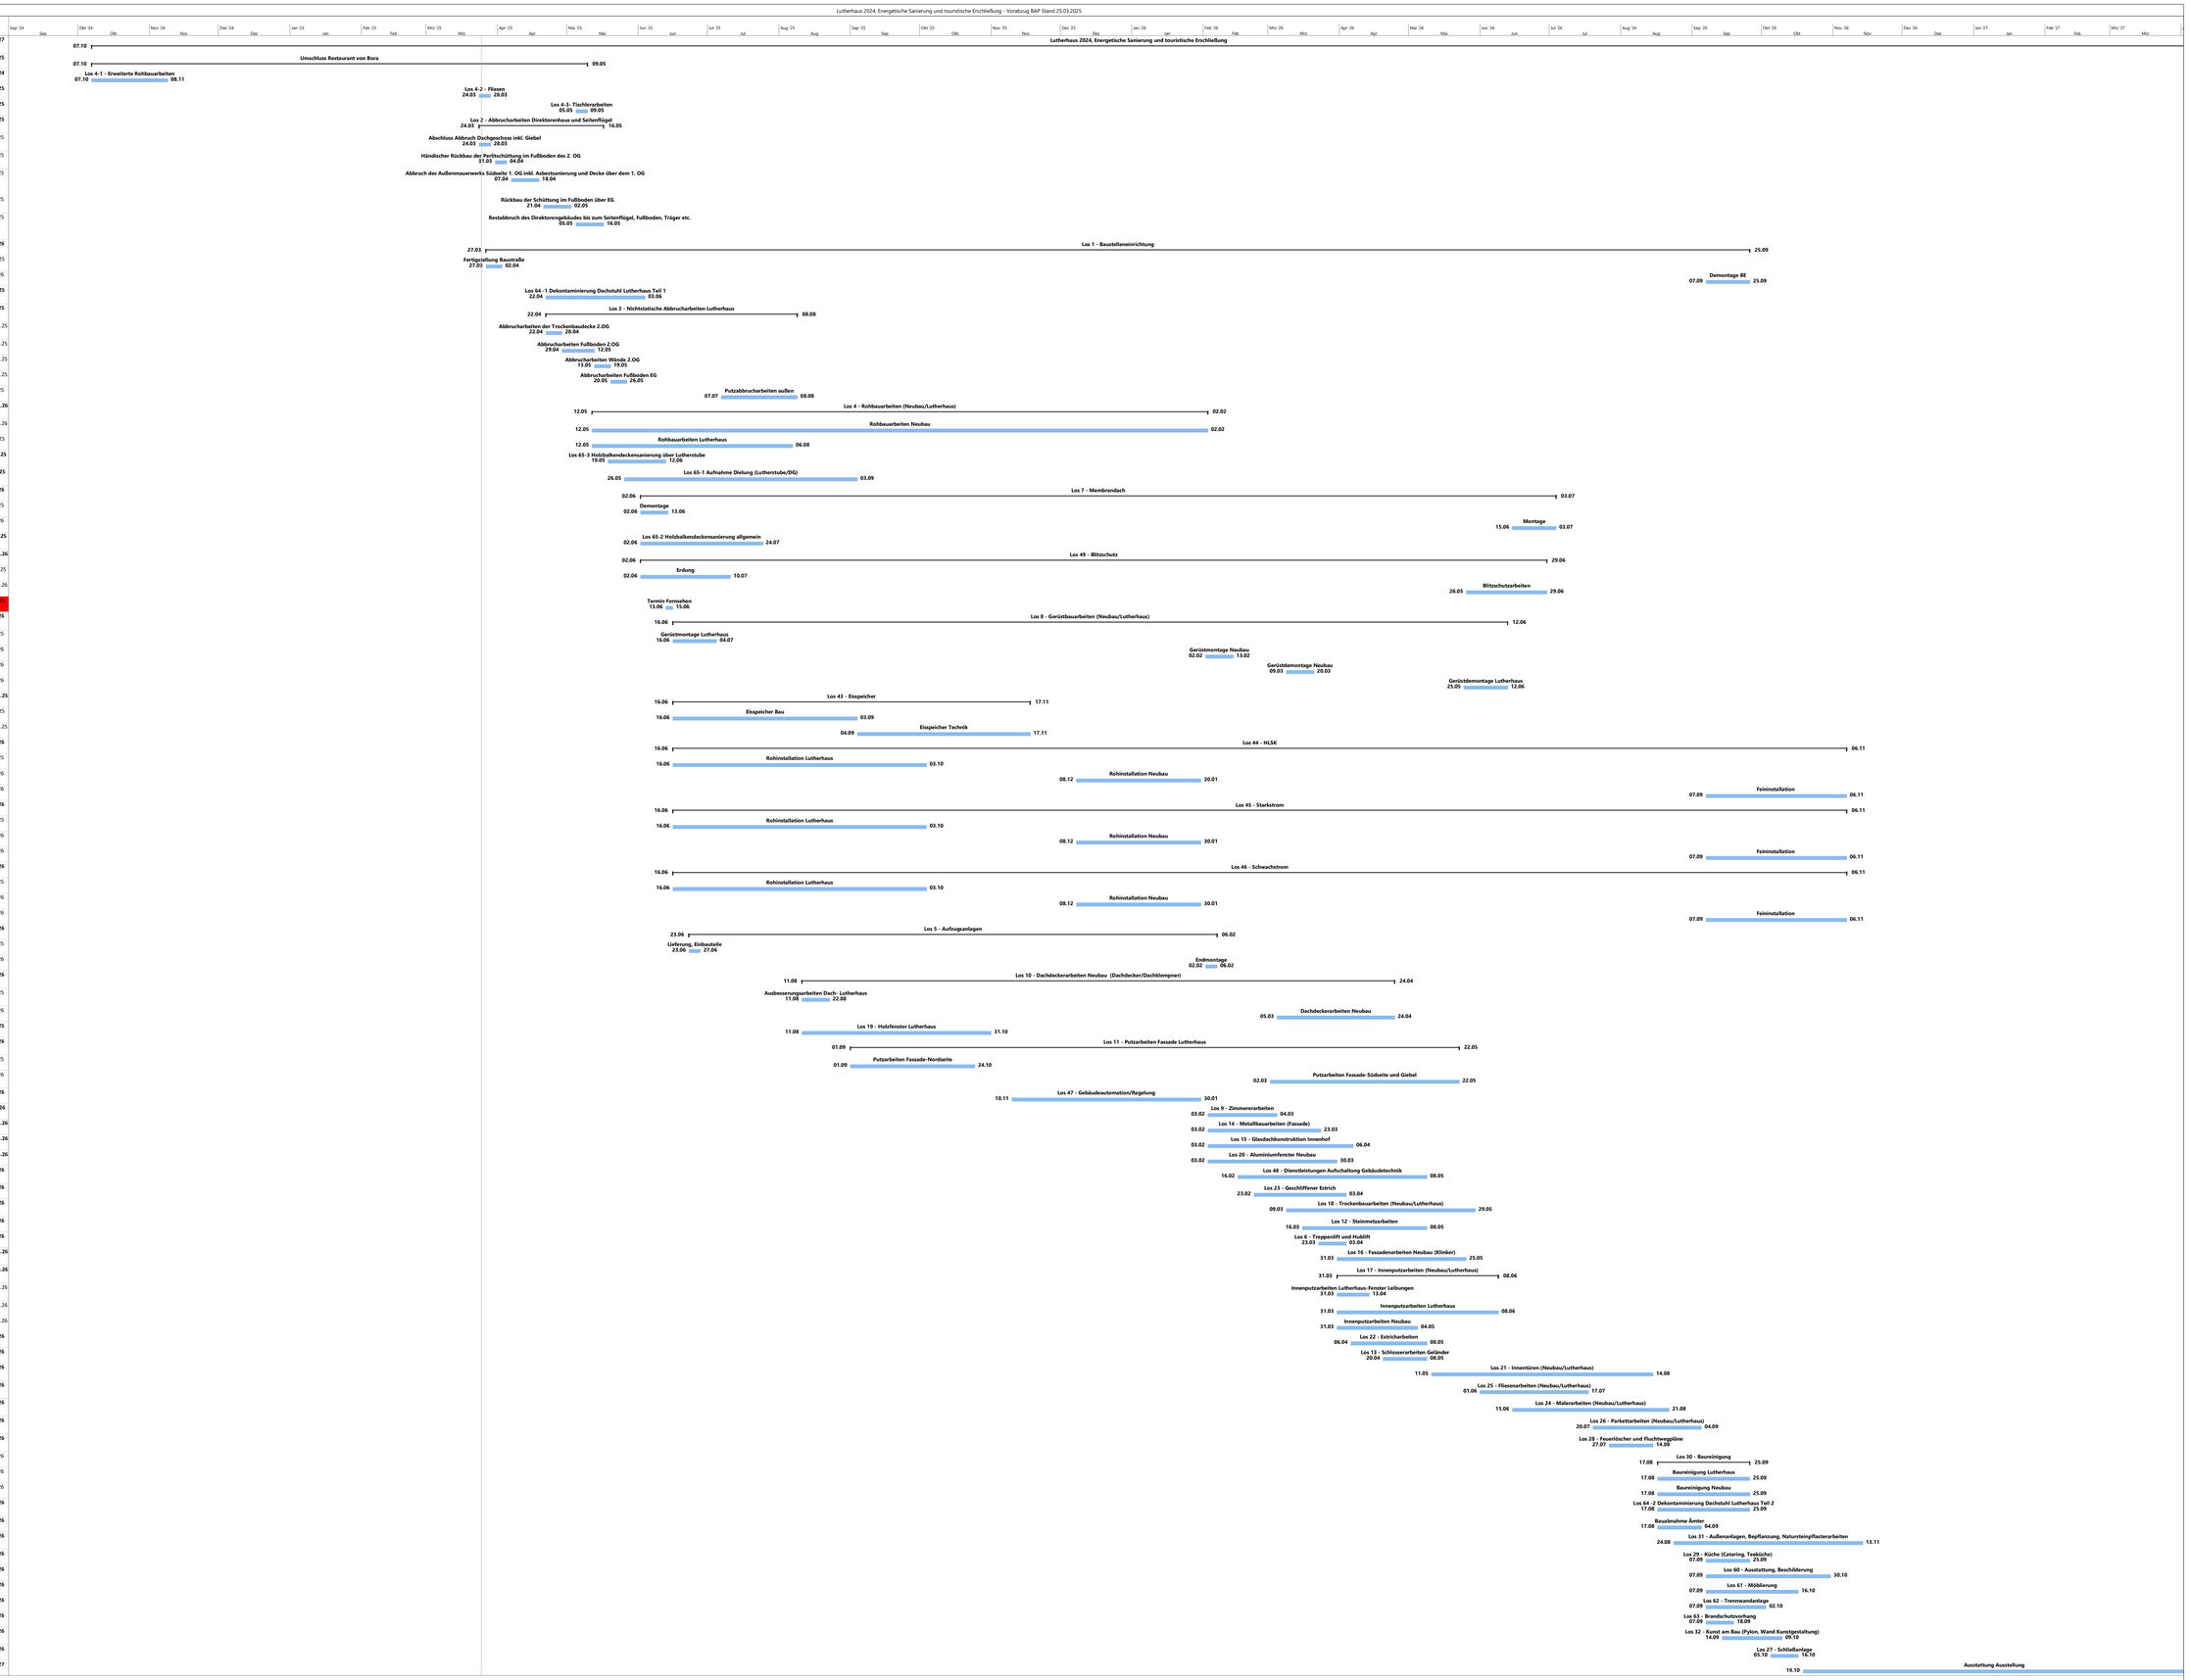Nr.		Nummer	Vorg.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1		**1**		**Lutherhaus 2024, Energetische Sanierung und touristische Erschließung**	**652 Tage**	**Mon 07.10.24**	**Fre 02.04.27**
3		**2**		**Umschluss Restaurant von Bora**	**155 Tage**	**Mon 07.10.24**	**Fre 09.05.25**
4		**3**		**Los 4-1 - Erweiterte Rohbauarbeiten**	**25 Tage**	**Mon 07.10.24**	**Fre 08.11.24**
5		**4**		**Los 4-2 - Fliesen**	**5 Tage**	**Mon 24.03.25**	**Fre 28.03.25**
6		**5**		**Los 4-3- Tischlerarbeiten**	**5 Tage**	**Mon 05.05.25**	**Fre 09.05.25**
11		**6**		**Los 2 - Abbrucharbeiten Direktorenhaus und Seitenflügel**	**40 Tage**	**Mon 24.03.25**	**Fre 16.05.25**
12		**7**		Abschluss Abbruch Dachgeschoss inkl. Giebel	5 Tage	Mon 24.03.25	Fre 28.03.25
13		**8**		Händischer Rückbau der Perlitschüttung im Fußboden des 2. OG	5 Tage	Mon 31.03.25	Fre 04.04.25
14		**9**		Abbruch des Außenmauerwerks Südseite 1. OG inkl. Asbestsanierung und Decke über dem 1. OG	10 Tage	Mon 07.04.25	Fre 18.04.25
15		**10**		Rückbau der Schüttung im Fußboden über EG	10 Tage	Mon 21.04.25	Fre 02.05.25
16		**11**		Restabbruch des Direktorengebäudes bis zum Seitenflügel, Fußboden, Träger etc.	10 Tage	Mon 05.05.25	Fre 16.05.25
7		**12**		**Los 1 - Baustelleneinrichtung**	**394 Tage**	**Don 27.03.25**	**Fre 25.09.26**
8		**13**		Fertigstellung Baustraße	5 Tage	Don 27.03.25	Mit 02.04.25
9		**14**		Demontage BE	15 Tage	Mon 07.09.26	Fre 25.09.26
10		**15**		**Los 64 -1 Dekontaminierung Dachstuhl Lutherhaus Teil 1**	**32 Tage**	**Die 22.04.25**	**Die 03.06.25**
17		**16**		**Los 3 - Nichtstatische Abbrucharbeiten Lutherhaus**	**83 Tage**	**Die 22.04.25**	**Fre 08.08.25**
18		**17**		Abbrucharbeiten der Trockenbaudecke 2.OG	5 Tage	Die 22.04.25	Mon 28.04.25
19		**18**		Abbrucharbeiten Fußboden 2.OG	10 Tage	Die 29.04.25	Mon 12.05.25
20		**19**		Abbrucharbeiten Wände 2.OG	5 Tage	Die 13.05.25	Mon 19.05.25
21		**20**		Abbrucharbeiten Fußboden EG	5 Tage	Die 20.05.25	Mon 26.05.25
22		**21**		Putzabbrucharbeiten außen	25 Tage	Mon 07.07.25	Fre 08.08.25
23		**22**		**Los 4 - Rohbauarbeiten (Neubau/Lutherhaus)**	**193 Tage**	**Mon 12.05.25**	**Mon 02.02.26**
24		**23**		Rohbauarbeiten Neubau	193 Tage	Mon 12.05.25	Mon 02.02.26
25		**24**		Rohbauarbeiten Lutherhaus	65 Tage	Mon 12.05.25	Mit 06.08.25
65		**25**		**Los 65-3 Holzbalkendeckensanierung über Lutherstube**	**20 Tage**	**Mon 19.05.25**	**Don 12.06.25**
63		**26**		**Los 65-1 Aufnahme Dielung (Lutherstube/OG)**	**75 Tage**	**Mon 26.05.25**	**Mit 03.09.25**
30		**27**		**Los 7 - Membrandach**	**286 Tage**	**Mon 02.06.25**	**Fre 03.07.26**
31		**28**		Demontage	10 Tage	Mon 02.06.25	Fre 13.06.25
32		**29**		Montage	15 Tage	Mon 15.06.26	Fre 03.07.26
64		**30**		**Los 65-2 Holzbalkendeckensanierung allgemein**	**40 Tage**	**Mon 02.06.25**	**Don 24.07.25**
91		**31**		**Los 49 - Blitzschutz**	**282 Tage**	**Mon 02.06.25**	**Mon 29.06.26**
92		**32**		Erdung	30 Tage	Mon 02.06.25	Don 10.07.25
93		**33**		Blitzschutzarbeiten	25 Tage	Die 26.05.26	Mon 29.06.26
2		**34**		Termin Fernsehen	2 Tage	Fre 13.06.25	Son 15.06.25
33		**35**		**Los 8 - Gerüstbauarbeiten (Neubau/Lutherhaus)**	**260 Tage**	**Mon 16.06.25**	**Fre 12.06.26**
36		**36**		Gerüstmontage Lutherhaus	15 Tage	Mon 16.06.25	Fre 04.07.25
34		**37**		Gerüstmontage Neubau	10 Tage	Mon 02.02.26	Fre 13.02.26
35		**38**		Gerüstdemontage Neubau	10 Tage	Mon 09.03.26	Fre 20.03.26
37		**39**		Gerüstdemontage Lutherhaus	15 Tage	Mon 25.05.26	Fre 12.06.26
74		**40**		**Los 43 - Eisspeicher**	**111 Tage**	**Mon 16.06.25**	**Mon 17.11.25**
75		**41**		Eisspeicher Bau	58 Tage	Mon 16.06.25	Mit 03.09.25
76		**42**		Eisspeicher Technik	53 Tage	Don 04.09.25	Mon 17.11.25
77		**43**		**Los 44 - HLSK**	**365 Tage**	**Mon 16.06.25**	**Fre 06.11.26**
78		**44**		Rohinstallation Lutherhaus	80 Tage	Mon 16.06.25	Fre 03.10.25
79		**45**		Rohinstallation Neubau	40 Tage	Mon 08.12.25	Fre 30.01.26
80		**46**		Feininstallation	45 Tage	Mon 07.09.26	Fre 06.11.26
81		**47**		**Los 45 - Starkstrom**	**365 Tage**	**Mon 16.06.25**	**Fre 06.11.26**
82		**48**		Rohinstallation Lutherhaus	80 Tage	Mon 16.06.25	Fre 03.10.25
83		**49**		Rohinstallation Neubau	40 Tage	Mon 08.12.25	Fre 30.01.26
84		**50**		Feininstallation	45 Tage	Mon 07.09.26	Fre 06.11.26
85		**51**		**Los 46 - Schwachstrom**	**365 Tage**	**Mon 16.06.25**	**Fre 06.11.26**
86		**52**		Rohinstallation Lutherhaus	80 Tage	Mon 16.06.25	Fre 03.10.25
87		**53**		Rohinstallation Neubau	40 Tage	Mon 08.12.25	Fre 30.01.26
88		**54**		Feininstallation	45 Tage	Mon 07.09.26	Fre 06.11.26
26		**55**		**Los 5 - Aufzugsanlagen**	**165 Tage**	**Mon 23.06.25**	**Fre 06.02.26**
27		**56**		Lieferung, Einbauteile	5 Tage	Mon 23.06.25	Fre 27.06.25
28		**57**		Endmontage	5 Tage	Mon 02.02.26	Fre 06.02.26
39		**58**		**Los 10 - Dachdeckerarbeiten Neubau (Dachdecker/Dachklempner)**	**185 Tage**	**Mon 11.08.25**	**Fre 24.04.26**
41		**59**		Ausbesserungsarbeiten Dach- Lutherhaus	10 Tage	Mon 11.08.25	Fre 22.08.25
40		**60**		Dachdeckerarbeiten Neubau	37 Tage	Don 05.03.26	Fre 24.04.26
55		**61**		**Los 19 - Holzfenster Lutherhaus**	**60 Tage**	**Mon 11.08.25**	**Fre 31.10.25**
42		**62**		**Los 11 - Putzarbeiten Fassade Lutherhaus**	**190 Tage**	**Mon 01.09.25**	**Fre 22.05.26**
43		**63**		Putzarbeiten Fassade-Nordseite	40 Tage	Mon 01.09.25	Fre 24.10.25
44		**64**		Putzarbeiten Fassade-Südseite und Giebel	60 Tage	Mon 02.03.26	Fre 22.05.26
89		**65**		**Los 47 - Gebäudeautomation/Regelung**	**60 Tage**	**Mon 10.11.25**	**Fre 30.01.26**
38		**66**		**Los 9 - Zimmererarbeiten**	**22 Tage**	**Die 03.02.26**	**Mit 04.03.26**
47		**67**		**Los 14 - Metallbauarbeiten (Fassade)**	**35 Tage**	**Die 03.02.26**	**Mon 23.03.26**
48		**68**		**Los 15 - Glasdachkonstruktion Innenhof**	**45 Tage**	**Die 03.02.26**	**Mon 06.04.26**
56		**69**		**Los 20 - Aluminiumfenster Neubau**	**40 Tage**	**Die 03.02.26**	**Mon 30.03.26**
90		**70**		**Los 48 - Dienstleistungen Aufschaltung Gebäudetechnik**	**60 Tage**	**Mon 16.02.26**	**Fre 08.05.26**
59		**71**		**Los 23 - Geschliffener Estrich**	**30 Tage**	**Mon 23.02.26**	**Fre 03.04.26**
54		**72**		**Los 18 - Trockenbauarbeiten (Neubau/Lutherhaus)**	**60 Tage**	**Mon 09.03.26**	**Fre 29.05.26**
45		**73**		**Los 12 - Steinmetzarbeiten**	**40 Tage**	**Mon 16.03.26**	**Fre 08.05.26**
29		**74**		**Los 6 - Treppenlift und Hubilft**	**10 Tage**	**Mon 23.03.26**	**Fre 03.04.26**
49		**75**		**Los 16 - Fassadenarbeiten Neubau (Klinker)**	**40 Tage**	**Die 31.03.26**	**Mon 25.05.26**
50		**76**		**Los 17 - Innenputzarbeiten (Neubau/Lutherhaus)**	**50 Tage**	**Die 31.03.26**	**Mon 08.06.26**
51		**77**		Innenputzarbeiten Lutherhaus-Fenster Leibungen	10 Tage	Die 31.03.26	Mon 13.04.26
52		**78**		Innenputzarbeiten Lutherhaus	50 Tage	Die 31.03.26	Mon 08.06.26
53		**79**		Innenputzarbeiten Neubau	25 Tage	Die 31.03.26	Mon 04.05.26
58		**80**		**Los 22 - Estricharbeiten**	**25 Tage**	**Mon 06.04.26**	**Fre 08.05.26**
46		**81**		**Los 13 - Schlosserarbeiten Geländer**	**15 Tage**	**Mon 20.04.26**	**Fre 08.05.26**
57		**82**		**Los 21 - Innentüren (Neubau/Lutherhaus)**	**70 Tage**	**Mon 11.05.26**	**Fre 14.08.26**
61		**83**		**Los 25 - Fliesenarbeiten (Neubau/Lutherhaus)**	**35 Tage**	**Mon 01.06.26**	**Fre 17.07.26**
60		**84**		**Los 24 - Malerarbeiten (Neubau/Lutherhaus)**	**50 Tage**	**Mon 15.06.26**	**Fre 21.08.26**
62		**85**		**Los 26 - Parkettarbeiten (Neubau/Lutherhaus)**	**35 Tage**	**Mon 20.07.26**	**Fre 04.09.26**
67		**86**		**Los 28 - Feuerlöscher und Fluchtwegpläne**	**15 Tage**	**Mon 27.07.26**	**Fre 14.08.26**
69		**87**		**Los 30 - Baureinigung**	30 Tage	Mon 17.08.26	Fre 25.09.26
70		**88**		Baureinigung Lutherhaus	30 Tage	Mon 17.08.26	Fre 25.09.26
71		**89**		Baureinigung Neubau	30 Tage	Mon 17.08.26	Fre 25.09.26
98		**90**		**Los 64 -2 Dekontaminierung Dachstuhl Lutherhaus Teil 2**	**30 Tage**	**Mon 17.08.26**	**Fre 25.09.26**
99		**91**		**Bauabnahme Ämter**	**15 Tage**	**Mon 17.08.26**	**Fre 04.09.26**
72		**92**		**Los 31 - Außenanlagen, Bepflanzung, Natursteinpflasterarbeiten**	**60 Tage**	**Mon 24.08.26**	**Fre 13.11.26**
68		**93**		**Los 29 - Küche (Catering, Teeküche)**	**15 Tage**	**Mon 07.09.26**	**Fre 25.09.26**
94		**94**		**Los 60 - Ausstattung, Beschilderung**	**40 Tage**	**Mon 07.09.26**	**Fre 30.10.26**
95		**95**		**Los 61 - Möblierung**	**30 Tage**	**Mon 07.09.26**	**Fre 16.10.26**
96		**96**		**Los 62 - Trennwandanlage**	**20 Tage**	**Mon 07.09.26**	**Fre 02.10.26**
97		**97**		**Los 63 - Brandschutzvorhang**	**10 Tage**	**Mon 07.09.26**	**Fre 18.09.26**
73		**98**		**Los 32 - Kunst am Bau (Pylon, Wand Kunstgestaltung)**	**20 Tage**	**Mon 14.09.26**	**Fre 09.10.26**
66		**99**		**Los 27 - Schließanlage**	**10 Tage**	**Mon 05.10.26**	**Fre 16.10.26**
100		**100**		**Ausstattung Ausstellung**	**120 Tage**	**Mon 19.10.26**	**Fre 02.04.27**
