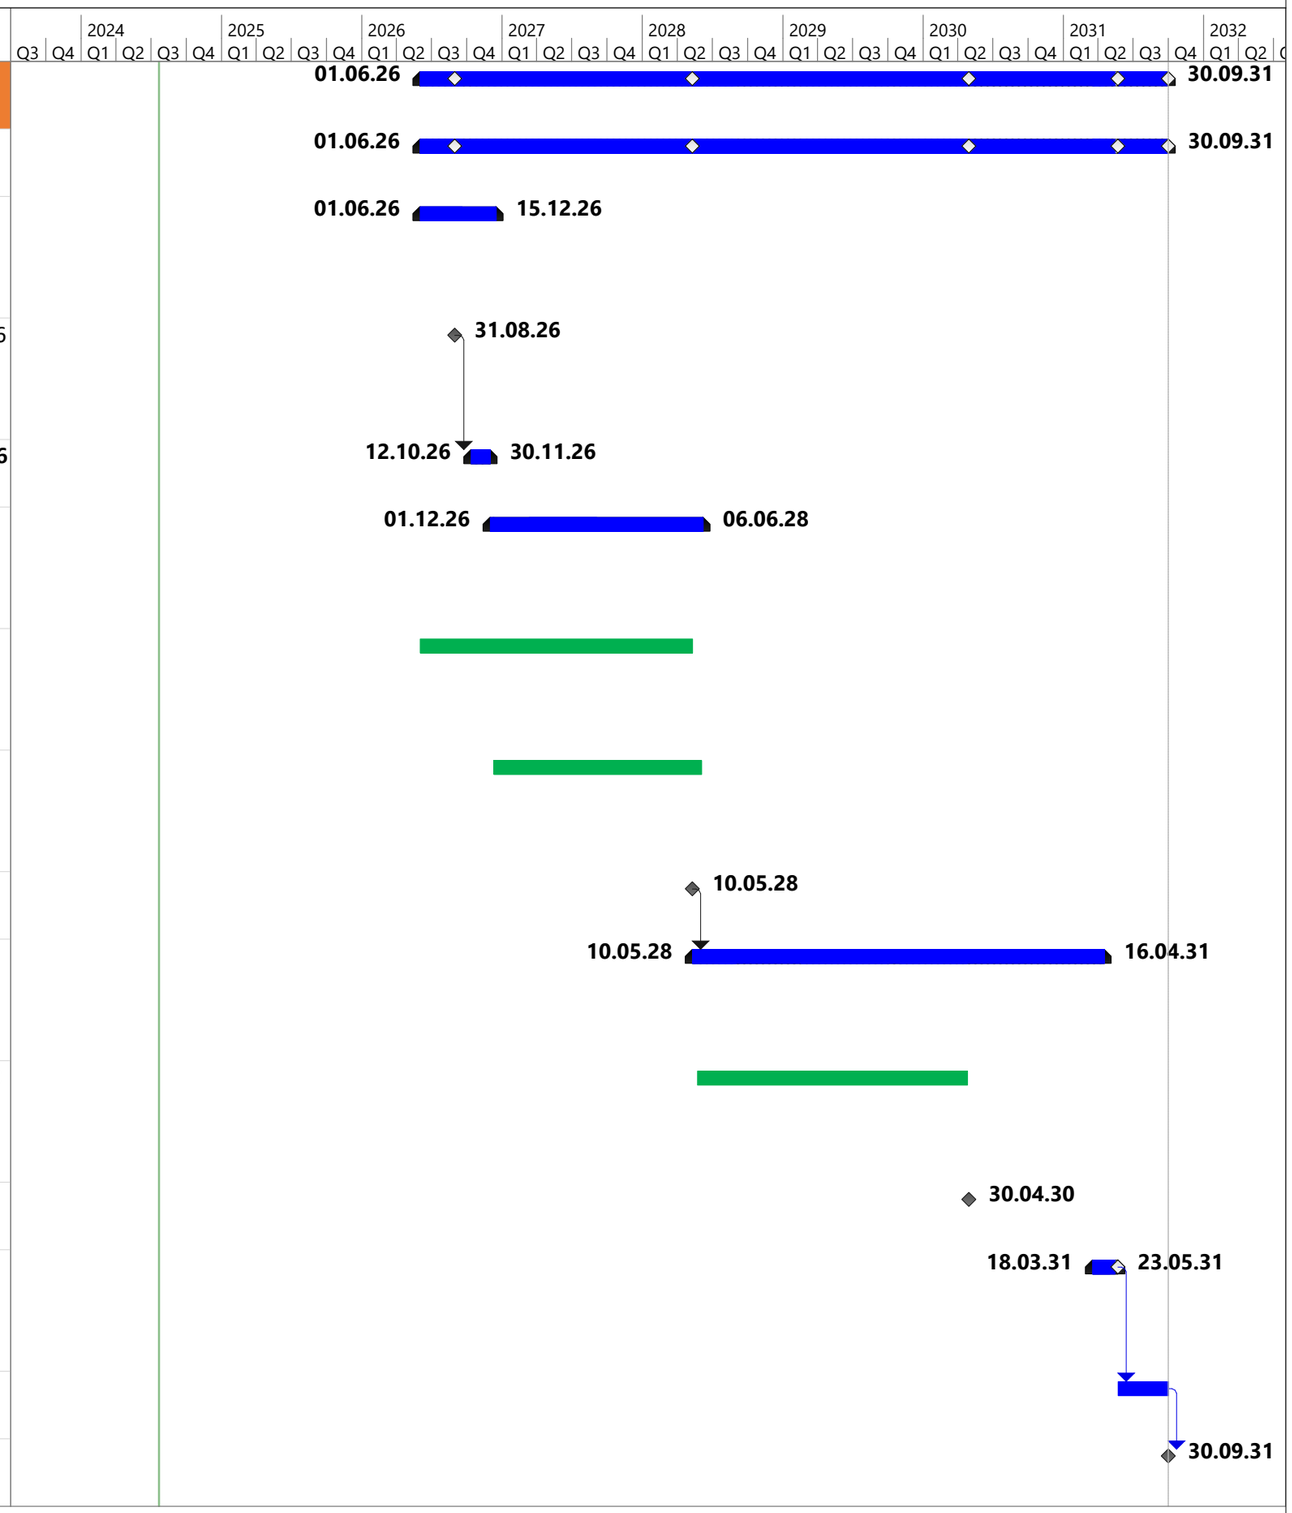Nr.	Vorgangsı	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1		**Baudurchführung (AGG)**	**1313 Tage**	**Mon 01.06.26**	**Die 30.09.31**
2		**Los 1 - Komplexmaßnahme TA 1.2**	**1313 Tage**	**Mon 01.06.26**	**Die 30.09.31**
3		**Bauphase 0 (Baufeldfreimachung , Bauvorbereitende Maßnahmen)**	**141 Tage**	**Mon 01.06.26**	**Die 15.12.26**
6		Inbetriebnahme Düker (Bauleistung Los 2.1)	0 Tage	Mon 31.08.26	Mon 31.08.26
7		**Bauphase 0 (Brückenbau)**	**35 Tage**	**Mon 12.10.26**	**Mon 30.11.26**
9		**Bauphase 1 (nördl. Brückenzug einschl. Regenrückhaltenbecken)**	**368 Tage**	**Die 01.12.26**	**Die 06.06.28**
13		Straßenbau Ebertplatz und Bereich Brücke (Nordseite)	480 Tage	Mon 01.06.26	Die 09.05.28
14		Straßenbau Nürnberger Straße (Nordseite)	360 Tage	Don 10.12.26	Fre 02.06.28
15		Inbetriebnahme nördlicher Verkehrszug	0 Tage	Mit 10.05.28	Mit 10.05.28
16		**Bauphase 2/3 (Südlicher und mittlerer Brückenzug)**	**716 Tage**	**Mit 10.05.28**	**Mit 16.04.31**
22		Straßenbau Ebertplatz- Bereich Brücke - Nürnberger Straße	470 Tage	Die 23.05.28	Don 25.04.30
23		Inbetriebnahme STRAB-Überbau	0 Tage	Die 30.04.30	Die 30.04.30
24		**Bauphase 4 (Rückbaumaßnahmen und Komplettierung Verkehrsanlage)**	**45 Tage**	**Die 18.03.31**	**Fre 23.05.31**
28		Restarbeiten und Komplettierung	92 Tage	Fre 23.05.31	Die 30.09.31
29		Fertigstellung Komplexmaßnahme TA 1.2	0 Tage	Die 30.09.31	Die 30.09.31
