Nr.		Vorgangsnamen	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger
1		Neubau Jugendherberge Markkleebarg	1204 Tage	Fre 20.05.22	Don 31.12.26		
2		Projektbeginn	0 Tage	Fre 20.05.22	Fre 20.05.22		4
3		Planungsphase	528 Tage	Fre 20.05.22	Die 28.05.24		
4		LP 1 + 2 - Vorplanung	3,8 Monate	Fre 20.05.22	Fre 02.09.22	2	5
5		LP 3 - Entwurfsplanung	4,75 Monate	Mon 05.09.22	Fre 13.01.23	4	6;8EA+5 Tage
6		Übergabe LP 3 + Zuwendungsunterlagen	0 Tage	Die 17.01.23	Die 17.01.23	5	7EA+1 Tag
7		Bearbeitungszeit FöMi	65 Tage	Mon 22.05.23	Fre 18.08.23	6EA+1 Tag	
8		Integrationsplanung LP 3 /besondere Planungsleistungen	50 Tage	Mon 23.01.23	Fre 31.03.23	5EA+5 Tage	9
9		LP 4 - Genehmigungsplanung	1 Monat	Mon 03.04.23	Fre 28.04.23	8	10EA+7 Tage
10		Einreichung Bauantrag	0 Tage	Die 09.05.23	Die 09.05.23	9EA+7 Tage	11;13
11		Bearbeitungszeit Bauantrag	3,5 Monate	Mit 10.05.23	Die 15.08.23	10	
12		Baugenehmigung	0 Tage	Fre 06.10.23	Fre 06.10.23		19
13		LP 5 - Ausführungsplanung	5 Monate	Mit 10.05.23	Die 26.09.23	10	14EA-35 Tage
14		LP 6 + 7 - Vergabe	10,5 Monate	Mit 09.08.23	Die 28.05.24	13EA-35 Tage	
15		Versand LV BE	0 Tage	Fre 06.10.23	Fre 06.10.23		
16		Versand LV Rohbau	0 Tage	Mon 30.10.23	Mon 30.10.23		
17		Bauphase	600 Tage	Mon 05.02.24	Fre 22.05.26		
18		Bauzeit	600 Tage	Mon 05.02.24	Fre 22.05.26		182
19		Baubeginn	0 Tage	Mon 05.02.24	Mon 05.02.24	12	20
20		Los 301 Baustelleneinrichtung + Baufeldfreimachung	4 Wochen	Mon 05.02.24	Fre 01.03.24	19	21;8E;28
21		Los 302 Bauschild	5 Tage	Mon 26.02.24	Fre 01.03.24	20;8E	
22		Los 408/9 Seethermeanlage	340 Tage	Mon 29.04.24	Fre 15.08.25		
23		Abschnitt 1 Horizontalbohrung	20 Tage	Mon 29.04.24	Fre 24.05.24	32;8E-20 Tage	24
24		Abschnitt 2 Verteilerschacht	20 Tage	Mon 26.05.25	Fre 20.06.25	23	25
25		Abschnitt 3 Seewasser-Wärmetauscher	40 Tage	Mon 23.06.25	Fre 15.08.25	24	26
26		Funktionsprüfung Wärmeerzeuger	10 Tage	Mon 18.08.25	Fre 29.08.25	78;25	
27		Los 303 Erd-/ Rohbauarbeiten, Kampfmittelsondierung	389 Tage	Mon 04.03.24	Don 28.08.25		
28		Aushub Baugrube	6 Wochen	Mon 04.03.24	Fre 12.04.24	20	
29		Grundleitungen, Fundamenterder (BA1)	1 Woche	Mon 25.03.24	Fre 29.03.24		
30		Grundleitungen, Fundamenterder (BA 2)	1 Woche	Mon 08.04.24	Fre 12.04.24		
31		Grundleitungen, Fundamenterder (BA 4)	1 Woche	Mon 20.05.24	Fre 24.05.24		
32		Bodenplatte (BA 1, 2 und 4)	10 Wochen	Mon 15.04.24	Fre 21.06.24		23;8E-20 Tage
33		KG (BA 1, 2, 3 und 4); Wände/Stützen/Treppen/Decke/ Abdichtung	16 Wochen	Mon 06.05.24	Fre 23.08.24		37
34		GL außerhalb des Gebäude (Nordhaus)	4,5 Wochen	Mon 27.05.24	Mit 26.06.24		35;36
35		GL außerhalb des Gebäude (Südhaus)	4,5 Wochen	Mit 26.06.24	Fre 26.07.24	34	38;37
36		Verfüllung Baugrube (Nordhaus)	2 Wochen	Mon 15.07.24	Fre 26.07.24	34	37
37		Verfüllung Baugrube (Verbinder)	2 Wochen	Mon 26.08.24	Fre 06.09.24	36;35;33	38
38		Verfüllung Baugrube (Südhaus)	2 Wochen	Mon 09.09.24	Fre 20.09.24	37;35	
39		EG (BA 1, 2 und 3); Wände/Stützen/Treppen/Decke	12 Wochen	Mon 22.07.24	Fre 11.10.24		
40		1.OG BA 1 (Nordhaus); Wände/Stützen/Treppen/Decke	8 Wochen	Mon 23.09.24	Fre 15.11.24		
41		1.OG BA 2 (Südhaus); Wände/Stützen/Treppen/Decke	7 Wochen	Mon 28.10.24	Fre 13.12.24		
42		2.OG BA 1 (Nordhaus); Wände/Stützen/Treppen/Decke	9 Wochen	Mon 11.11.24	Fre 10.01.25		54;62EA-5 Tage
43		2.OG BA 2 (Südhaus); Wände/Stützen/Treppen/Decke	9 Wochen	Mon 09.12.24	Fre 07.02.25		
44		Giebel Nord	1 Woche	Mon 13.01.25	Fre 17.01.25		
45		Giebel Süd	1 Woche	Mon 10.02.25	Fre 14.02.25		
46		Los 304 Gerüst	264 Tage	Mon 26.08.24	Don 28.08.25		
47		Aufbau	40 Tage	Mon 26.08.24	Fre 18.10.24		51
48		BA 1 (Nordhaus)	10 Tage	Mon 26.08.24	Fre 06.09.24		49
49		BA 2 (Mittelhaus)	10 Tage	Mon 09.09.24	Fre 20.09.24	48	50
50		BA 3 (Südhaus)	10 Tage	Mon 07.10.24	Fre 18.10.24	49	
51		Abbau	5 Tage	Fre 22.08.25	Don 28.08.25	47	179
52		BA 1, 2 und 3	5 Tage	Fre 22.08.25	Don 28.08.25	63;70;71	60EA-1 Tag
53		Los 305 Zimmerer- und Holzarbeiten	30 Tage	Mon 13.01.25	Fre 21.02.25		
54		BA 1(Nordhaus); Dachstuhl	3 Wochen	Mon 13.01.25	Fre 31.01.25	42	55;57;58
55		BA 2 (Südhaus); Dachstuhl	3 Wochen	Mon 03.02.25	Fre 21.02.25	54	
56		Los 305 Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten	160 Tage	Mon 03.02.25	Fre 12.09.25		
57		BA 1(Nordhaus); Dachabdichtung	3 Wochen	Mon 03.02.25	Fre 21.02.25	54	58;71;77EA+1 Tag
58		BA 2 (Südhaus); Dachabdichtung	3 Wochen	Mon 24.02.25	Fre 14.03.25	57;54	59
59		BA 1, 2 und 3; Dachbegrünung (ext.), Kies, PV-Anlage	5 Wochen	Mon 17.03.25	Fre 18.04.25	58	
60		Dacharbeiten Terrassen	12 Tage	Don 28.08.25	Fre 12.09.25	53EA-1 Tag	
61		Los 306 Kunststoff-Fensterelemente	40 Tage	Mon 20.01.25	Fre 14.03.25		71
62		BA 1, 2 und 3; KG	10 Tage	Mon 20.01.25	Fre 31.01.25	43EA-5 Tage	63
63		BA 1, 2 und 3; EG	10 Tage	Mon 03.02.25	Fre 14.02.25	62	64;66AA;52
64		BA 1 und 3; 1.OG	10 Tage	Mon 17.02.25	Fre 28.02.25	63	65
65		BA 1 und 3; 2.OG	10 Tage	Mon 03.03.25	Fre 14.03.25	64	68;69AA
66		Los 306/307 Alu-Fensterelemente/ Alu-RR-Türen innen u. Außen	20 Tage	Mon 03.02.25	Fre 28.02.25	63AA	67
67		Los 312 Brandschutzschiebetor	3 Tage	Mon 03.03.25	Mit 05.03.25	66	
68		Los 308 Wärmedämm-Verbundsysteme	10 Wochen	Mon 17.03.25	Fre 23.05.25	65	
69		Los 309 Vorgehängte hinterlüftete Fassaden	32 Wochen	Mon 03.03.25	Fre 10.10.25	65AA	
70		Los 310 Trockenbau	96 Tage	Mon 17.03.25	Mon 28.07.25		52
71		BA 1, 2 und 3; KG und EG Ständerwerk einseitig beplankt	5 Tage	Mon 17.03.25	Fre 21.03.25	61;57	72;52
72		BA 1 und 3; 1.OG Ständerwerk einseitig beplankt	3 Wochen	Mon 24.03.25	Fre 11.04.25	71	73
73		BA 1 und 3; 2.OG Ständerwerk einseitig beplankt	3 Wochen	Mon 14.04.25	Fre 02.05.25	72	
74		BA 1 und 3; 2.OG TB-Wände+Decken Schließen + Finish	3 Wochen	Die 29.04.25	Mon 19.05.25	79	
75		BA 1 und 3; 1.OG TB-Wände+Decken Schließen + Finish	3 Wochen	Die 20.05.25	Mon 09.06.25	80	
76		BA 1, 2 und 3; KG und EG TB-Wände+Decken Schließen + Finish	2 Wochen	Die 15.07.25	Mon 28.07.25	81	
77		Trassenbau HLSE	40 Tage	Die 25.02.25	Mon 21.04.25	57EA+1 Tag	79EA-20 Tage;83EA-20 Tage
78		Los 402/3 Rohrinstallation HLS	80 Tage	Die 25.03.25	Mon 14.07.25		88;26
79		BA 1 und 3 2. OG	25 Tage	Die 25.03.25	Mon 28.04.25	77EA-20 Tage	80EA-10 Tage;74
80		BA 1 und 3 1. OG	25 Tage	Die 15.04.25	Mon 19.05.25	79EA-10 Tage	81EA-10 Tage;75
81		BA 1,2 und 3; KG und EG	50 Tage	Die 06.05.25	Mon 14.07.25	80EA-10 Tage	76
82		Los 404 Rohrinstallation ELT	80 Tage	Die 25.03.25	Mon 14.07.25		88
83		BA 1 und 3 2. OG	25 Tage	Die 25.03.25	Mon 28.04.25	77EA-20 Tage	84EA-10 Tage
84		BA 1 und 3 1. OG	25 Tage	Die 15.04.25	Mon 19.05.25	83EA-10 Tage	85EA-10 Tage
85		BA 1,2 und 3; KG und EG	50 Tage	Die 06.05.25	Mon 14.07.25	84EA-10 Tage	

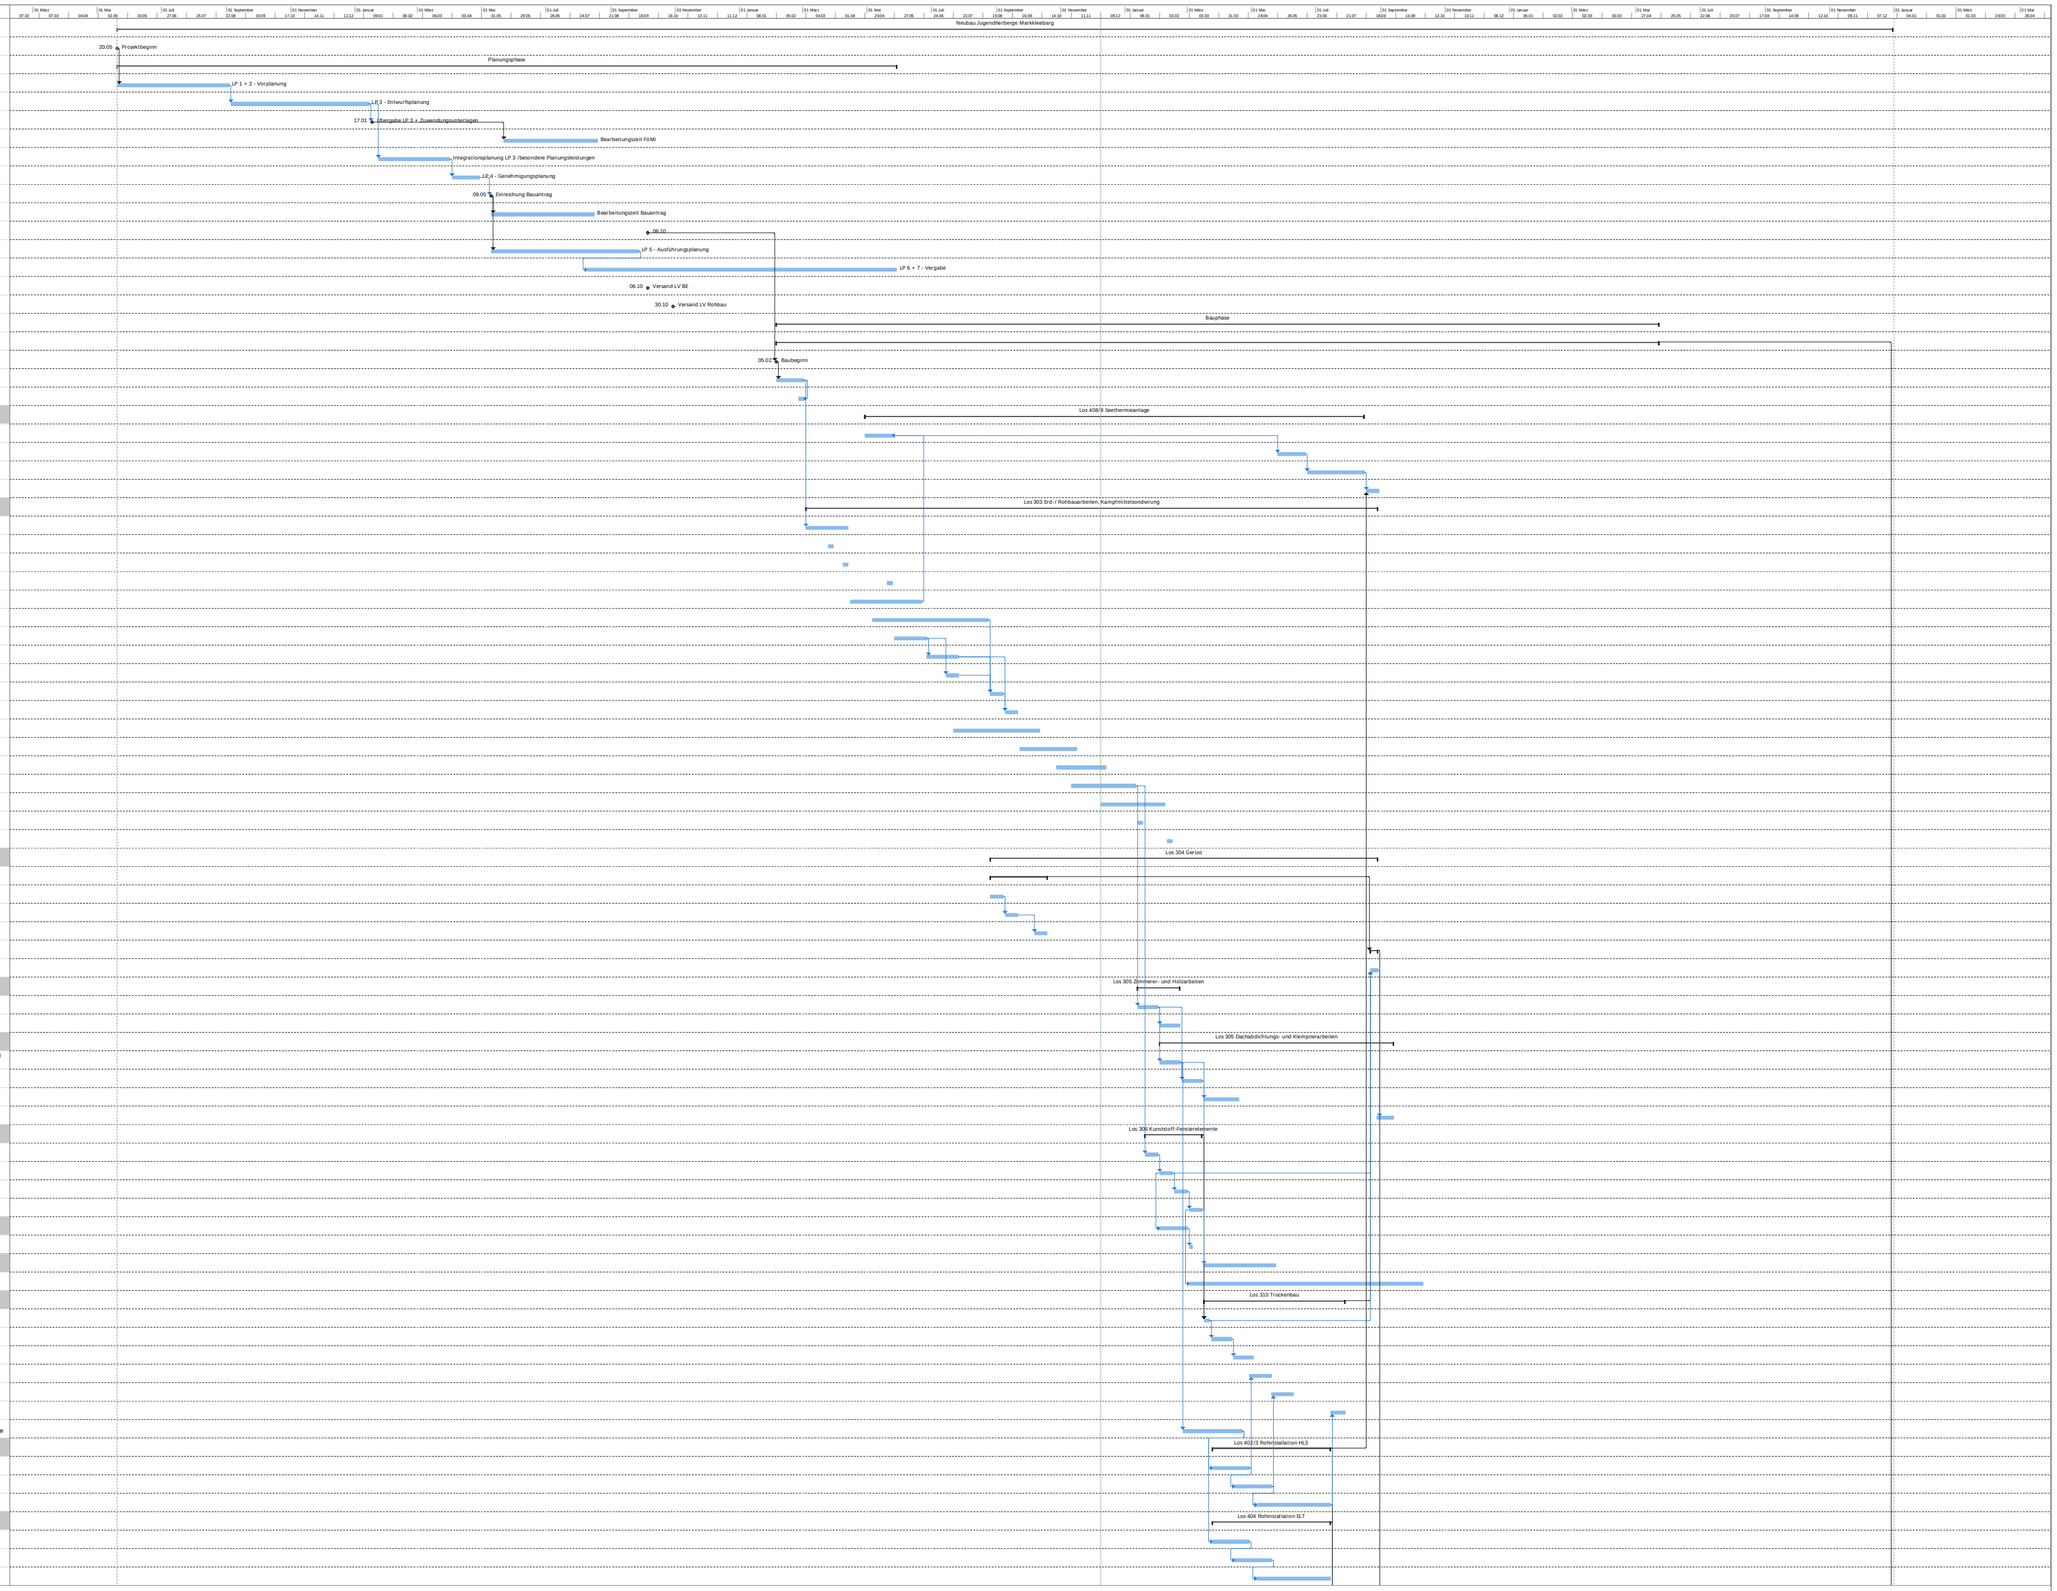

Projekt: 230705_JHM_Rahmen
Datum: Mon 09.02.24

Vorgang | Unterbrechung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Vorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Manueller Sammelvorgang | Nur Anfang | Nur Ende | Externe Vorgänge | Externe Meilenstein | Stichtag | In Arbeit | Manueller Fortschritt

Nr.		Vorgangsnr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger
86			Los 311 Estricharbeiten	52 Tage	Die 15.07.25	Mit 24.09.25		122
87			BA 1; 2.OG	23 Tage	Die 15.07.25	Don 14.08.25		125
88			Verlegung TSD	2 Tage	Die 15.07.25	Mit 16.07.25	78;82	89;93
89			Verlegung Fußbodenheizung	5 Tage	Don 17.07.25	Mit 23.07.25	88	90;94
90			Einbau Estrich	2 Tage	Don 24.07.25	Fre 25.07.25	89	91EA+4 Tage
91			aufheizen	10 Tage	Fre 01.08.25	Don 14.08.25	90EA+4 Tage	
92			BA 1; 1.OG	26 Tage	Don 17.07.25	Don 21.08.25		126
93			Verlegung TSD	2 Tage	Don 17.07.25	Fre 18.07.25	88	98
94			Verlegung Fußbodenheizung	5 Tage	Don 24.07.25	Mit 30.07.25	89	95;99
95			Einbau Estrich	2 Tage	Don 31.07.25	Fre 01.08.25	94	96EA+4 Tage
96			aufheizen	10 Tage	Fre 08.08.25	Don 21.08.25	95EA+4 Tage	
97			BA 1 und 2; EG	36 Tage	Mon 21.07.25	Mon 08.09.25		
98			Verlegung TSD	3 Tage	Mon 21.07.25	Mit 23.07.25	93	103
99			Verlegung Fußbodenheizung	10 Tage	Don 31.07.25	Mit 13.08.25	94	104;100
100			Einbau Estrich	4 Tage	Don 14.08.25	Die 19.08.25	99	101EA+4 Tage
101			aufheizen	10 Tage	Die 26.08.25	Mon 08.09.25	100EA+4 Tage	
102			BA 1; KG	36 Tage	Don 24.07.25	Don 11.09.25		
103			Verlegung TSD	2 Tage	Don 24.07.25	Fre 25.07.25	98	108
104			Verlegung Fußbodenheizung	5 Tage	Don 14.08.25	Mit 20.08.25	99	105;109
105			Einbau Estrich	2 Tage	Don 21.08.25	Fre 22.08.25	104	106EA+4 Tage
106			aufheizen	10 Tage	Fre 29.08.25	Don 11.09.25	105EA+4 Tage	
107			BA 2; 2.OG	39 Tage	Mon 28.07.25	Don 18.09.25		
108			Verlegung TSD	2 Tage	Mon 28.07.25	Die 29.07.25	103	113
109			Verlegung Fußbodenheizung	5 Tage	Don 21.08.25	Mit 27.08.25	104	110;114
110			Einbau Estrich	2 Tage	Don 28.08.25	Fre 29.08.25	109	115;111EA+4 Tage
111			aufheizen	10 Tage	Fre 05.09.25	Don 18.09.25	110EA+4 Tage	
112			BA 2; 1.OG	39 Tage	Mit 30.07.25	Mon 22.09.25		
113			Verlegung TSD	2 Tage	Mit 30.07.25	Don 31.07.25	108	118
114			Verlegung Fußbodenheizung	5 Tage	Don 28.08.25	Mit 03.09.25	109	119
115			Einbau Estrich	2 Tage	Mon 01.09.25	Die 02.09.25	110	120;116EA+4 Tage
116			aufheizen	10 Tage	Die 09.09.25	Mon 22.09.25	115EA+4 Tage	
117			BA 2; EG	39 Tage	Fre 01.08.25	Mit 24.09.25		
118			Verlegung TSD	2 Tage	Fre 01.08.25	Mon 04.08.25	113	
119			Verlegung Fußbodenheizung	5 Tage	Don 04.09.25	Mit 10.09.25	114	
120			Einbau Estrich	2 Tage	Mit 03.09.25	Don 04.09.25	115	121EA+4 Tage
121			aufheizen	10 Tage	Don 11.09.25	Mit 24.09.25	120EA+4 Tage	
122			Los 405 Aufzüge BA1	20 Tage	Don 25.09.25	Mit 22.10.25	86	123
123			Los 405 Aufzüge BA2	20 Tage	Don 23.10.25	Mit 19.11.25	122	
124			Los 314 Malerarbeiten	55 Tage	Fre 15.08.25	Don 30.10.25		
125			BA 1; 2.OG	15 Tage	Fre 15.08.25	Don 04.09.25	87	127;141;134;132;159
126			BA 1; 1.OG	15 Tage	Fre 22.08.25	Don 11.09.25	92	128;135;142
127			BA 1 und 2; EG	25 Tage	Fre 05.09.25	Don 09.10.25	125	129;136;143;157EA+5 Tage
128			BA 1 und 2; KG	20 Tage	Fre 12.09.25	Don 09.10.25	126	130;137;144
129			BA 2; 2.OG	15 Tage	Fre 10.10.25	Don 30.10.25	127	138;145
130			BA 2; 1.OG	15 Tage	Fre 10.10.25	Don 30.10.25	128	146
131			Los 313 Metallbau- und Schlosserarbeiten	20 Tage	Fre 05.09.25	Don 02.10.25		
132			TH 1-4	20 Tage	Fre 05.09.25	Don 02.10.25	125	
133			Los 3xx Innentüren	54 Tage	Fre 05.09.25	Mit 19.11.25		
134			BA 1; 2.OG	7 Tage	Fre 05.09.25	Mon 15.09.25	125	141
135			BA 1; 1.OG	7 Tage	Fre 12.09.25	Mon 22.09.25	126	142
136			BA 1 und 2; EG	7 Tage	Fre 10.10.25	Mon 20.10.25	127	143
137			BA 1 und 2; KG	7 Tage	Fre 10.10.25	Mon 20.10.25	128	144
138			BA 2; 2.OG	7 Tage	Fre 31.10.25	Mon 10.11.25	129	139;145
139			BA 2; 1.OG	7 Tage	Die 11.11.25	Mit 19.11.25	138	146
140			Los 315 Fliesenarbeiten	62 Tage	Die 16.09.25	Mit 10.12.25		
141			BA 1; 2.OG	15 Tage	Die 16.09.25	Mon 06.10.25	125;134	148
142			BA 1; 1.OG	15 Tage	Die 23.09.25	Mon 13.10.25	126;135	149
143			BA 1 und 2; EG	25 Tage	Die 21.10.25	Mon 24.11.25	127;136	150
144			BA 1 und 2; KG	20 Tage	Die 21.10.25	Mon 17.11.25	128;137	151
145			BA 2; 2.OG	15 Tage	Die 11.11.25	Mon 01.12.25	129;138	152
146			BA 2; 1.OG	15 Tage	Don 20.11.25	Mit 10.12.25	130;139	153
147			Los 316 Bodenbelagsarbeiten	62 Tage	Die 07.10.25	Mit 31.12.25		
148			BA 1; 2.OG	15 Tage	Die 07.10.25	Mon 27.10.25	141	162
149			BA 1; 1.OG	15 Tage	Die 14.10.25	Mon 03.11.25	142	163
150			BA 1 und 2; EG	25 Tage	Die 25.11.25	Mon 29.12.25	143	164
151			BA 1 und 2; KG	20 Tage	Die 18.11.25	Mon 15.12.25	144	165
152			BA 2; 2.OG	15 Tage	Die 02.12.25	Mon 22.12.25	145	166
153			BA 2; 1.OG	15 Tage	Don 11.12.25	Mit 31.12.25	146	167

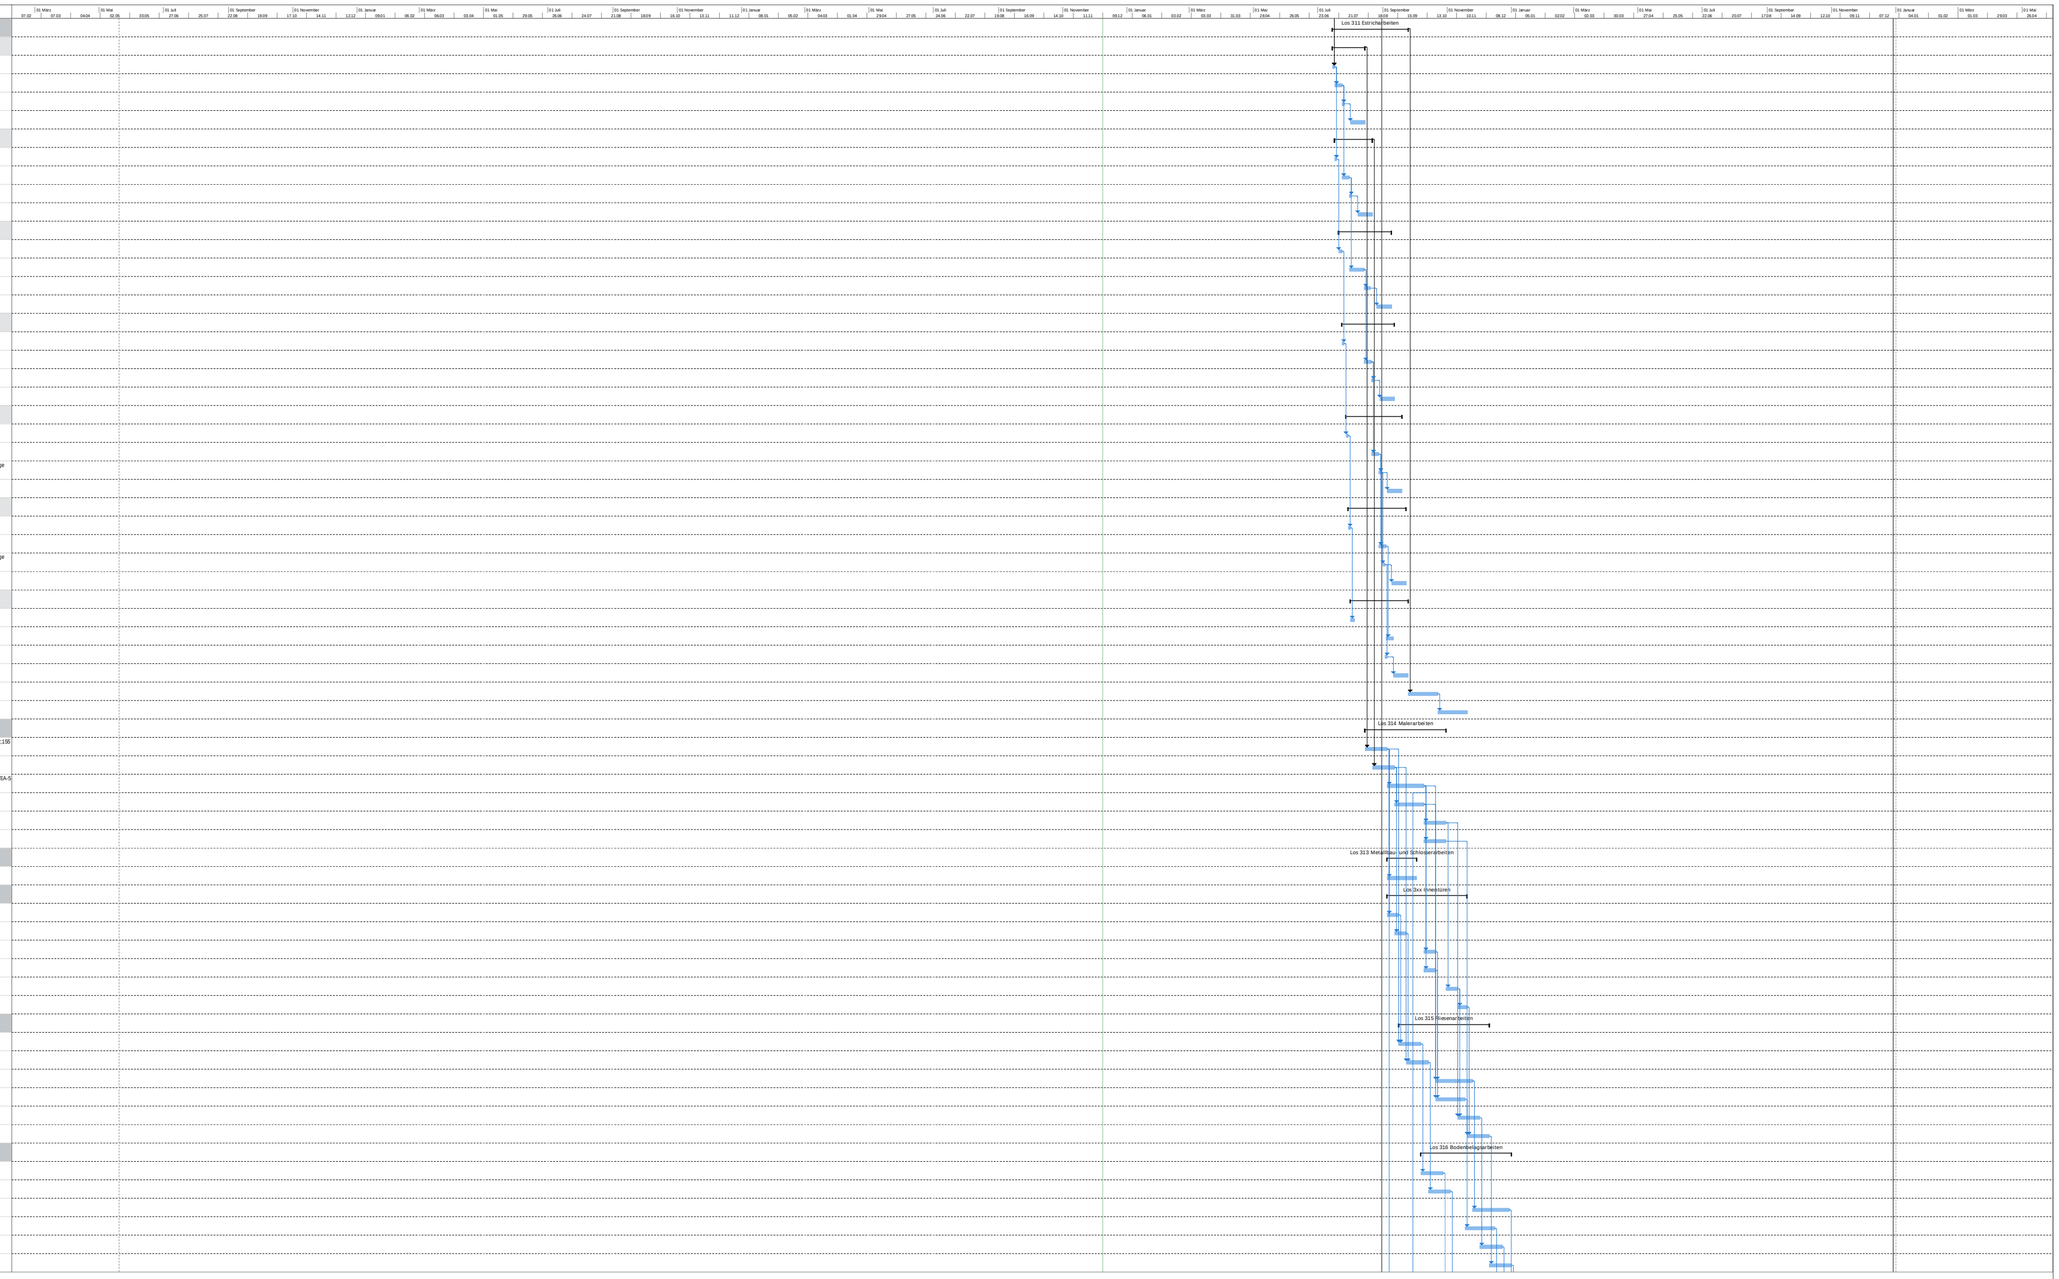

Projekt: 230705_JHM_Rahmen
Datum: Mon 09.12.24

Vorgang | Unterbrechung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Vorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Manueller Sammelvorgang | Nur Anfang | Nur Ende | Externe Vorgänge | Externe Meilensteine | Stichtag | In Arbeit | Manueller Fortschritt

Nr.	Vorgangsnummer	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger
154		Los 402/3/4 Komplettierung HL/ELT	85 Tage	Fre 05.09.25	Don 01.01.26		176
155		BA 1; 2.OG	15 Tage	Fre 05.09.25	Don 25.09.25	125	156EA-5 Tage
156		BA 1; 1.OG	15 Tage	Fre 19.09.25	Don 09.10.25	155EA-5 Tage	
157		BA 1 und 2; EG	25 Tage	Fre 03.10.25	Don 06.11.25	127EA-5 Tage	158EA-5 Tage
158		BA 1 und 2; KG	25 Tage	Fre 31.10.25	Don 04.12.25	157EA-5 Tage	159EA-5 Tage
159		BA 2; 2.OG	15 Tage	Fre 28.11.25	Don 18.12.25	158EA-5 Tage	160EA-5 Tage
160		BA 2; 1.OG	15 Tage	Fre 12.12.25	Don 01.01.26	159EA-5 Tage	
161		Los 320 Grundreinigung	49 Tage	Die 28.10.25	Fre 02.01.26		
162		BA 1; 2.OG	2 Tage	Die 28.10.25	Mit 29.10.25	148	169
163		BA 1; 1.OG	2 Tage	Die 04.11.25	Mit 05.11.25	149	170
164		BA 1 und 2; EG	2 Tage	Die 30.12.25	Mit 31.12.25	150	171
165		BA 1 und 2; KG	2 Tage	Die 16.12.25	Mit 17.12.25	151	172
166		BA 2; 2.OG	2 Tage	Die 23.12.25	Mit 24.12.25	152	173
167		BA 2; 1.OG	2 Tage	Don 01.01.26	Fre 02.01.26	153	174
168		Los 402 Komplettierung Sanitär	57 Tage	Don 30.10.25	Fre 16.01.26		176
169		BA 1; 2.OG	10 Tage	Don 30.10.25	Mit 12.11.25	162	
170		BA 1; 1.OG	10 Tage	Don 06.11.25	Mit 19.11.25	163	
171		BA 1 und 2; EG	5 Tage	Don 01.01.26	Mit 07.01.26	164	
172		BA 1 und 2; KG	5 Tage	Don 18.12.25	Mit 24.12.25	165	
173		BA 2; 2.OG	10 Tage	Don 25.12.25	Mit 07.01.26	166	
174		BA 2; 1.OG	10 Tage	Mon 05.01.26	Fre 16.01.26	167	
175		Los 306 Restleistungen Außentüren	10 Tage	Mon 05.01.26	Fre 16.01.26		
176		Inbetriebnahme, SV-Abnahmen, Mangelbeseitigung	30 Tage	Mon 19.01.26	Fre 27.02.26	154;168	178EA-5 Tage;177EE
177		Los 320 Feinreinigung	10 Tage	Mon 16.02.26	Fre 27.02.26	176EE	
178		Los 320 Schließanlage	5 Tage	Mon 23.02.26	Fre 27.02.26	176EA-5 Tage	180
179		Los 500 Freianlagen	5,5 Monate	Fre 29.08.25	Don 29.01.26	51	180
180		Bauende	0 Tage	Fre 27.02.26	Fre 27.02.26	179;178	181
181		Abrechnung, Dokumentation	3 Monate	Mon 02.03.26	Fre 22.05.26	180	
182		Vorhabensende	0 Tage	Don 31.12.26	Don 31.12.26	18	

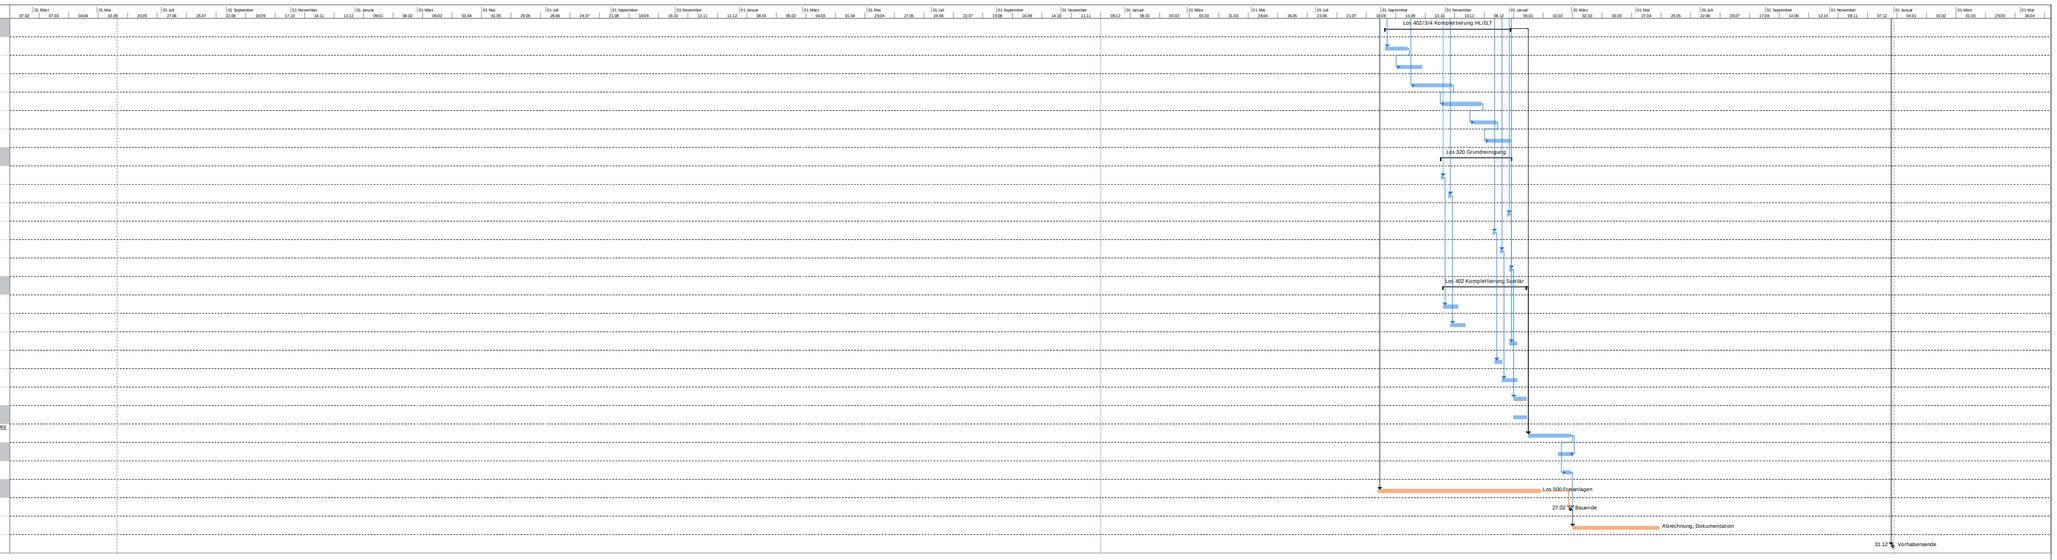

Projekt: 230705_JHM_Rahmen
Datum: Mon 09.12.24

Vorgang | Unterbrechung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Vorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelablauf | Manueller Sammelvorgang | Nur Anfang | Nur Ende | Externe Vorgänge | Externe Meilenstein | Stichtag | In Arbeit | Manueller Fortschritt
