Stadt Leipzig

Leipzig-Grünau - Kreisverkehrsplatz Saturnstraße

# Bauablaufplan
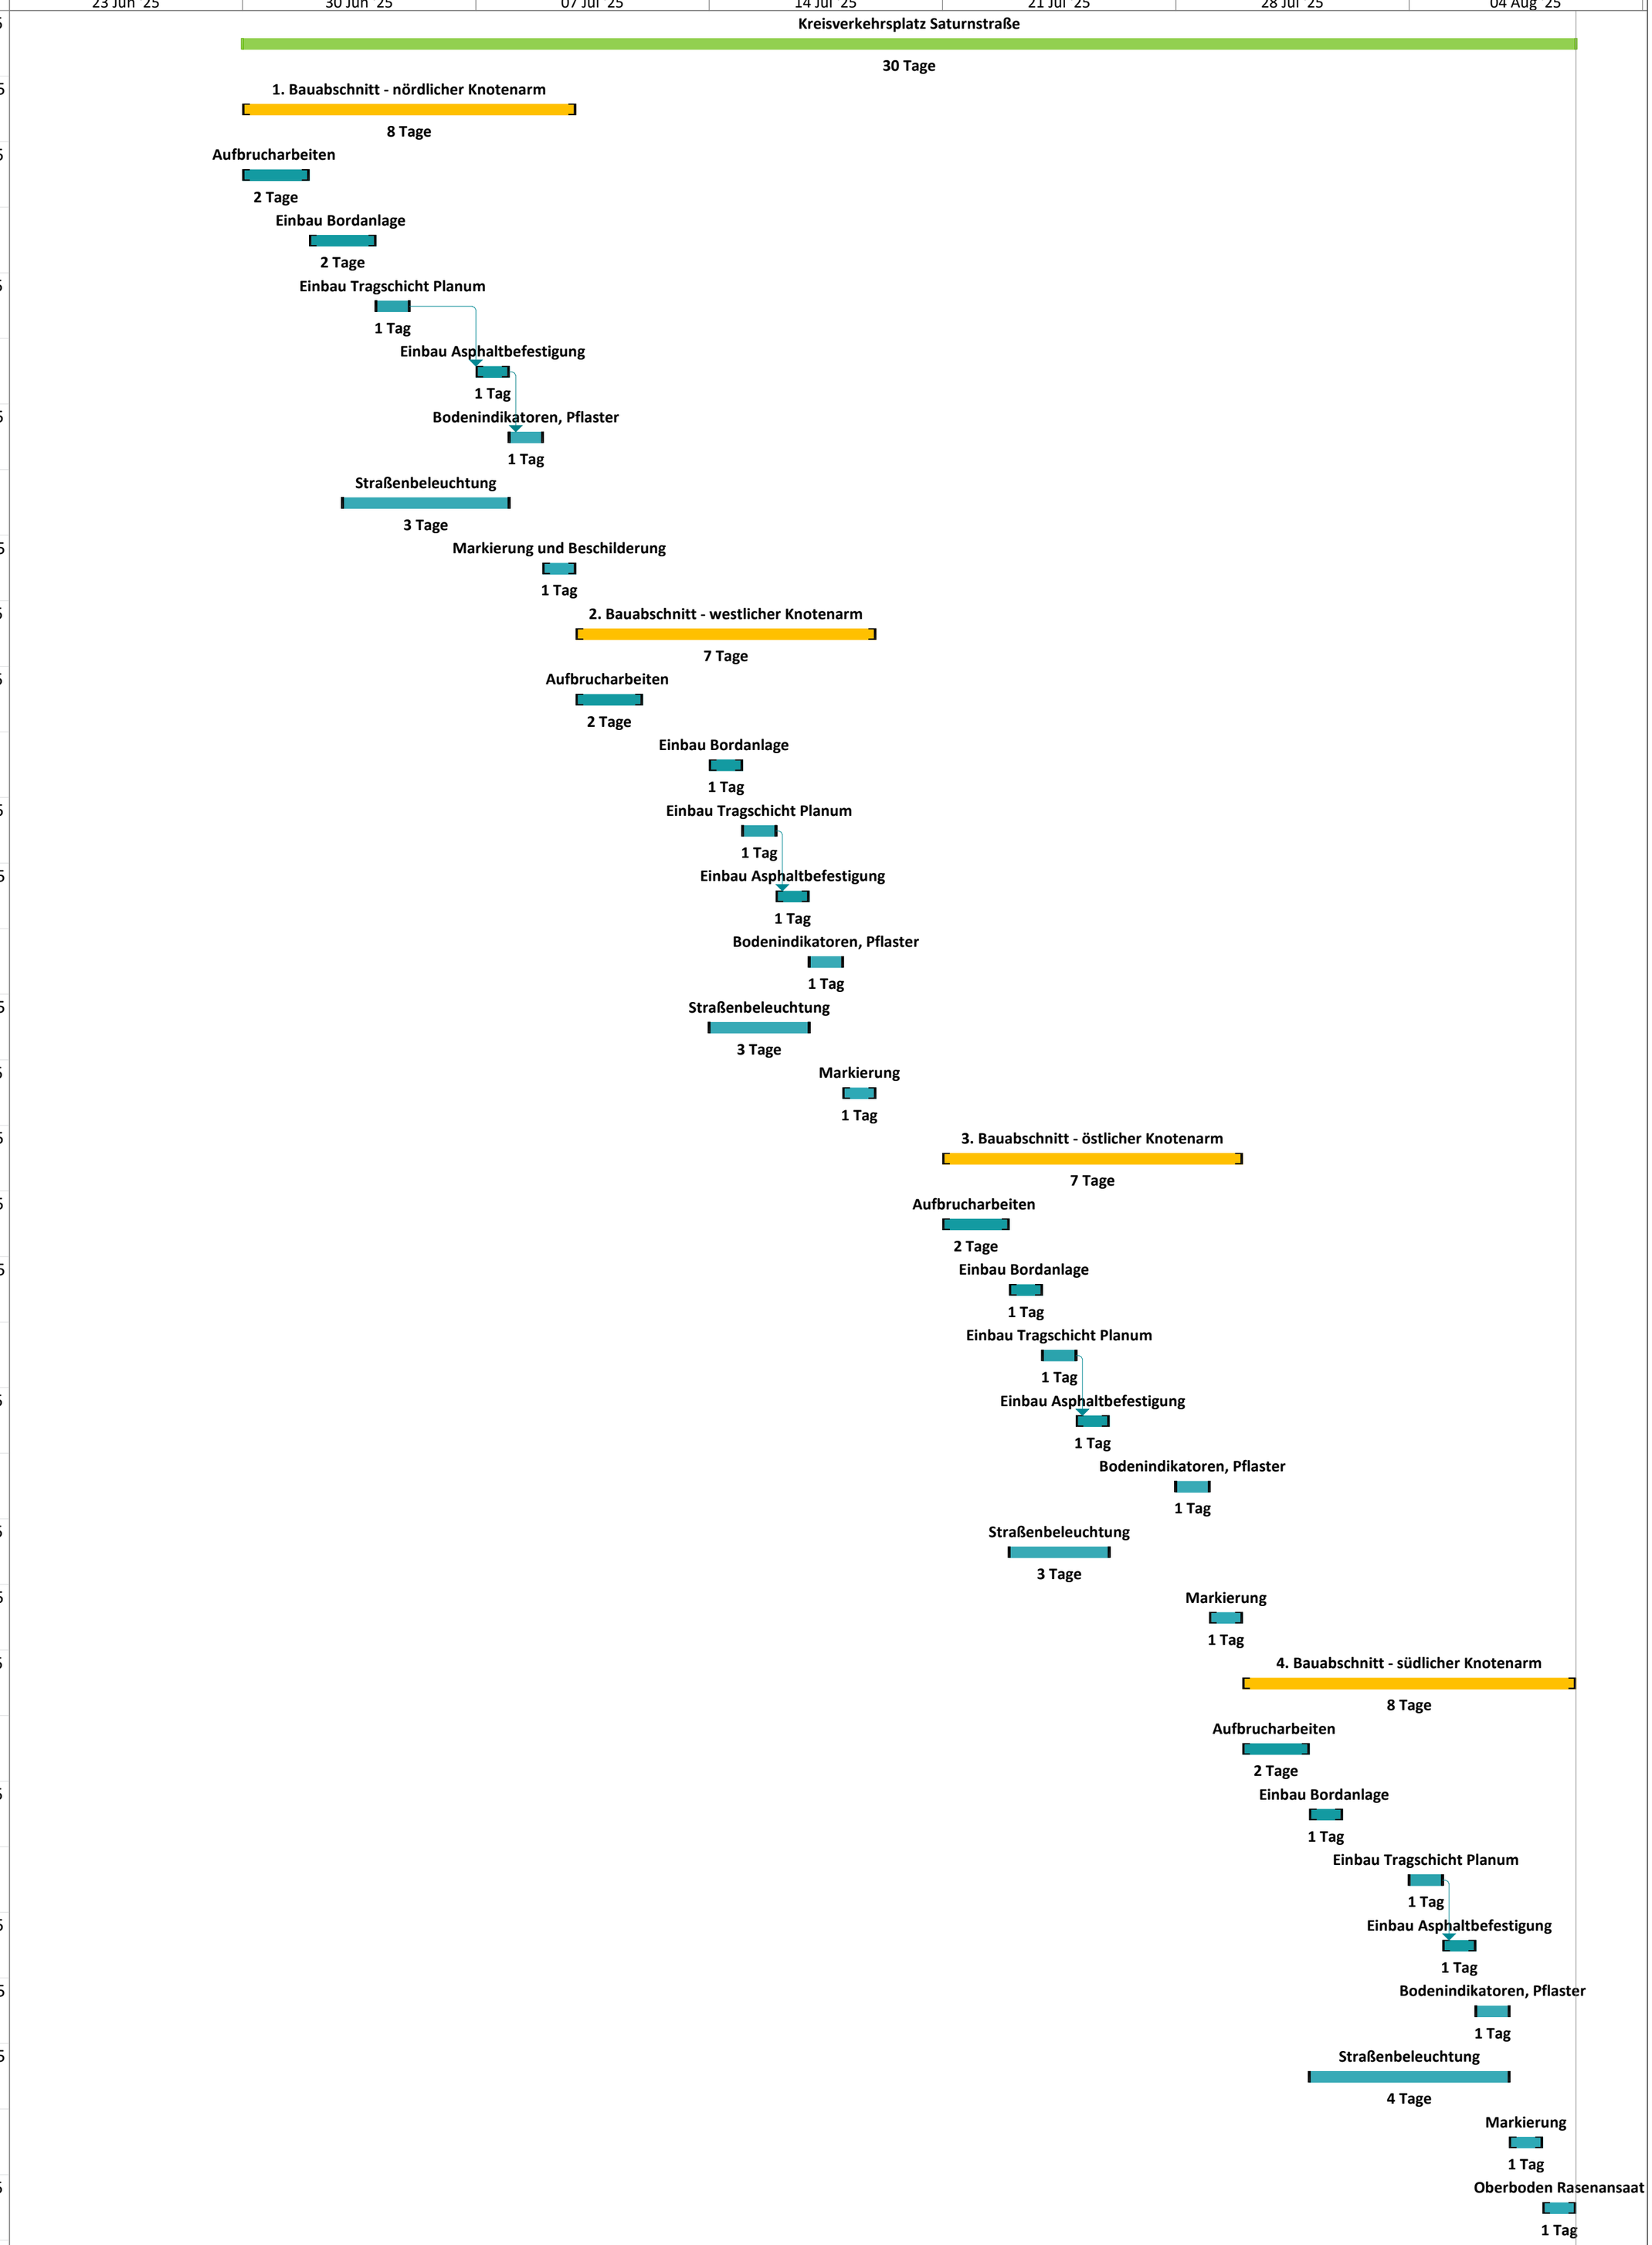
| Nr. | Anfang | Ende | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mon 30.06.25 | Fre 08.08.25 | Kreisverkehrsplatz Saturnstraße<br>30 Tage |
| 2 | Mon 30.06.25 | Mit 09.07.25 | 1. Bauabschnitt - nördlicher Knotenarm<br>8 Tage |
| 3 | Mon 30.06.25 | Die 01.07.25 | Aufbrucharbeiten<br>2 Tage |
| 4 | Mit 02.07.25 | Don 03.07.25 | Einbau Bordanlage<br>2 Tage |
| 5 | Fre 04.07.25 | Fre 04.07.25 | Einbau Tragschicht Planum<br>1 Tag |
| 6 | Mon 07.07.25 | Mon 07.07.25 | Einbau Asphaltbefestigung<br>1 Tag |
| 7 | Die 08.07.25 | Die 08.07.25 | Bodenindikatoren, Pflaster<br>1 Tag |
| 8 | Don 03.07.25 | Mon 07.07.25 | Straßenbeleuchtung<br>3 Tage |
| 9 | Mit 09.07.25 | Mit 09.07.25 | Markierung und Beschilderung<br>1 Tag |
| 10 | Don 10.07.25 | Fre 18.07.25 | 2. Bauabschnitt - westlicher Knotenarm<br>7 Tage |
| 11 | Don 10.07.25 | Fre 11.07.25 | Aufbrucharbeiten<br>2 Tage |
| 12 | Mon 14.07.25 | Mon 14.07.25 | Einbau Bordanlage<br>1 Tag |
| 13 | Die 15.07.25 | Die 15.07.25 | Einbau Tragschicht Planum<br>1 Tag |
| 14 | Mit 16.07.25 | Mit 16.07.25 | Einbau Asphaltbefestigung<br>1 Tag |
| 15 | Don 17.07.25 | Don 17.07.25 | Bodenindikatoren, Pflaster<br>1 Tag |
| 16 | Mon 14.07.25 | Mit 16.07.25 | Straßenbeleuchtung<br>3 Tage |
| 17 | Fre 18.07.25 | Fre 18.07.25 | Markierung<br>1 Tag |
| 18 | Mon 21.07.25 | Die 29.07.25 | 3. Bauabschnitt - östlicher Knotenarm<br>7 Tage |
| 19 | Mon 21.07.25 | Die 22.07.25 | Aufbrucharbeiten<br>2 Tage |
| 20 | Mit 23.07.25 | Mit 23.07.25 | Einbau Bordanlage<br>1 Tag |
| 21 | Don 24.07.25 | Don 24.07.25 | Einbau Tragschicht Planum<br>1 Tag |
| 22 | Fre 25.07.25 | Fre 25.07.25 | Einbau Asphaltbefestigung<br>1 Tag |
| 23 | Mon 28.07.25 | Mon 28.07.25 | Bodenindikatoren, Pflaster<br>1 Tag |
| 24 | Mit 23.07.25 | Fre 25.07.25 | Straßenbeleuchtung<br>3 Tage |
| 25 | Die 29.07.25 | Die 29.07.25 | Markierung<br>1 Tag |
| 26 | Mit 30.07.25 | Fre 08.08.25 | 4. Bauabschnitt - südlicher Knotenarm<br>8 Tage |
| 27 | Mit 30.07.25 | Don 31.07.25 | Aufbrucharbeiten<br>2 Tage |
| 28 | Fre 01.08.25 | Fre 01.08.25 | Einbau Bordanlage<br>1 Tag |
| 29 | Mon 04.08.25 | Mon 04.08.25 | Einbau Tragschicht Planum<br>1 Tag |
| 30 | Die 05.08.25 | Die 05.08.25 | Einbau Asphaltbefestigung<br>1 Tag |
| 31 | Mit 06.08.25 | Mit 06.08.25 | Bodenindikatoren, Pflaster<br>1 Tag |
| 32 | Fre 01.08.25 | Mit 06.08.25 | Straßenbeleuchtung<br>4 Tage |
| 33 | Don 07.08.25 | Don 07.08.25 | Markierung<br>1 Tag |
| 34 | Fre 08.08.25 | Fre 08.08.25 | Oberboden Rasenansaat<br>1 Tag |
| 35 | | | |
