Bauablaufplan Rettungswache Sdier - Projekt 701

- Fertigstellung zum 26.06.2026 -

Nr	Name	Anfang	Ende	Gewerk	Dauer(AT)	Dauer
1	**Vertragstermin LP 2**	Fr, 22.11.24	So, 01.12.24		6 Tage	10 Tage
2	**LP 2 - Vorplanung**	Do, 05.12.24	Mi, 08.01.25		15 Tage	35 Tage
3	**Vertragstermin LP 3/4**	Mo, 16.12.24	Mi, 18.12.24		3 Tage	3 Tage
4	**LP 3 - Entwurfsplanung**	Do, 09.01.25	Mi, 29.01.25		15 Tage	21 Tage
5	**LP 4 - Genehmigungsplanung**	Do, 30.01.25	Mi, 26.02.25		20 Tage	28 Tage
6	***Baugenehmigungsverfahren***	*Do, 27.02.25*	*Di, 27.05.25*		*60 Tage*	*90 Tage*
7	**LP 5 - Ausführungsplanung/ Fachplaner**	Do, 27.02.25	Di, 06.05.25		45 Tage	69 Tage
14	**Ausschreibung, alle Gewerke fortlaufend**	Mo, 31.03.25	Mo, 11.08.25		89 Tage	134 Tage
15	**Vergabe Tiefbau/ Rohbau, inkl. aller Prüf-/ Einspruchsfristen**	Mi, 28.05.25	So, 29.06.25		20 Tage	33 Tage
16	**Bauzeitfenster**	Mo, 30.06.25	So, 28.06.26		244 Tage	364 Tage
17	**erweiterter Rohbau - Herrichtung Baufeld, Aufstellung BE, Tiefbau-Grundleitungen, Rohbau**	Mo, 30.06.25	So, 12.10.25		74 Tage	105 Tage
18	**Industriefußbodenheizung, Fahrzeughalle**	Mo, 28.07.25	So, 03.08.25		5 Tage	7 Tage
19	**Deckenventilatoren, Jalousieklappe Fahrzeughalle**	Mo, 13.10.25	So, 19.10.25		5 Tage	7 Tage
20	**Gerüstbau**	Mo, 25.08.25	Mi, 06.05.26		167 Tage	255 Tage
21	**Elektro**	Mo, 13.10.25	So, 16.11.25		24 Tage	35 Tage
22	**ELT-Rohmontage**	Mo, 13.10.25	So, 16.11.25		24 Tage	35 Tage
23	**Bauheizung**	Mo, 15.12.25	So, 05.04.26		69 Tage	112 Tage
24	**ELT-Feinmontage**	Mo, 05.01.26	So, 21.06.26		115 Tage	168 Tage
25	**Fenster, Sonnenschutz**	Mo, 22.09.25	So, 03.05.26		144 Tage	224 Tage
26	**Fenster**	Mo, 22.09.25	So, 16.11.25		38 Tage	56 Tage
27	**Fensterbänke - innen**	Mo, 17.11.25	So, 23.11.25		4 Tage	7 Tage
28	**Fensterbänke - außen**	Mo, 16.02.26	So, 01.03.26		10 Tage	14 Tage
29	**Sonnenschutz**	Mo, 27.04.26	So, 03.05.26		4 Tage	7 Tage
30	**Alu-Elemente (Haus-Zwischentüren)**	Mo, 22.09.25	So, 16.11.25		38 Tage	56 Tage
31	**Sektionaltore**	Mo, 22.09.25	So, 16.11.25		38 Tage	56 Tage
32	**Torschwellen**	Mo, 17.11.25	So, 30.11.25		9 Tage	14 Tage
33	**Dachdecker**	Mo, 13.10.25	So, 03.05.26		130 Tage	203 Tage
34	**Flachdachabdichtung, Dämmung Dachfläche/ Attika**	Mo, 13.10.25	So, 23.11.25		28 Tage	42 Tage
35	**Attika, Fallrohre, Dachbekiesung**	Mo, 20.04.26	So, 03.05.26		9 Tage	14 Tage
36	**Innenputz**	Mo, 17.11.25	So, 14.12.25		19 Tage	28 Tage
37	**HLS**	Mo, 19.01.26	So, 21.06.26		105 Tage	154 Tage
38	**Vorwandinstallationen**	Mo, 19.01.26	So, 08.02.26		15 Tage	21 Tage
39	**Deckeninstallationen**	Mo, 09.02.26	So, 01.03.26		15 Tage	21 Tage
40	**FB-Heizung**	Mo, 16.03.26	So, 29.03.26		10 Tage	14 Tage
41	**Hautechnikzentrale, Lüftung**	Mo, 27.04.26	So, 07.06.26		27 Tage	42 Tage
42	**Feinmontage**	Mo, 15.06.26	So, 21.06.26		5 Tage	7 Tage
43	**Trockenbau**	Mo, 05.01.26	So, 26.04.26		78 Tage	112 Tage
44	**Wände halbseitig montieren, Gegenseite abgestellt**	Mo, 05.01.26	So, 18.01.26		10 Tage	14 Tage
45	**Wände schließen**	Mo, 09.02.26	So, 01.03.26		15 Tage	21 Tage
46	**Decken**	Mo, 06.04.26	So, 26.04.26		14 Tage	21 Tage
47	**Estrich (inkl. Abdichtung, Unterdämmung)**	Mo, 02.03.26	So, 12.04.26		28 Tage	42 Tage
48	**Abdichtung, Unterdämmung**	Mo, 02.03.26	So, 15.03.26		10 Tage	14 Tage
49	**Schnellestrich - Abbindezeit 10KT**	Mo, 30.03.26	So, 12.04.26		8 Tage	14 Tage
50	**Fliesenleger**	Mo, 13.04.26	So, 07.06.26		37 Tage	56 Tage
51	**Wandfliesen**	Mo, 13.04.26	Sa, 02.05.26		14 Tage	20 Tage
52	**Bodenfliesen**	Mo, 20.04.26	So, 17.05.26		18 Tage	28 Tage
53	**Sockelfliesen, Silikon**	Mo, 01.06.26	So, 07.06.26		5 Tage	7 Tage
54	**Tischler - Innentüren, WC-Trennwände**	Mo, 13.04.26	So, 21.06.26		47 Tage	70 Tage
55	**Zargen montieren**	Mo, 13.04.26	So, 19.04.26		5 Tage	7 Tage
56	**Umkleidekabinen, WC-Trennwände montieren**	Mo, 15.06.26	So, 21.06.26		5 Tage	7 Tage
57	**Türblätter hängen**	Mo, 15.06.26	So, 21.06.26		5 Tage	7 Tage
58	**Maler**	Mo, 04.05.26	So, 31.05.26		18 Tage	28 Tage
59	**Bodenleger**	Mo, 18.05.26	So, 14.06.26		19 Tage	28 Tage
60	**Gebäudereinigung**	Mo, 08.06.26	So, 28.06.26		12 Tage	14 Tage
61	**Möbel (Holz, Metall, Küche)**	Mo, 15.09.25	So, 21.06.26		182 Tage	280 Tage
62	**Möbel Holz**	Mo, 15.06.26	So, 21.06.26		5 Tage	7 Tage
63	**Möbel Metall**	Mo, 15.06.26	So, 21.06.26		5 Tage	7 Tage
64	**Küchenplanung/ Küchemontage**	Mo, 15.09.25	So, 21.06.26		15 Tage	21 Tage
65	**Fassade**	Mo, 02.03.26	So, 24.05.26		56 Tage	84 Tage
66	**WDVS-Haupt-Fassade**	Mo, 02.03.26	Fr, 24.04.26		38 Tage	54 Tage
67	**WDVS-Sockel**	Do, 07.05.26	So, 24.05.26		11 Tage	18 Tage
68	**Außenanlagen**	Mo, 11.05.26	So, 14.06.26		23 Tage	35 Tage
69	**befestigte Flächen**	Mo, 11.05.26	So, 14.06.26		23 Tage	35 Tage
70	**Überdachungen, Fahrradstellplatz, Beschilderung**	Mo, 01.06.26	So, 07.06.26		5 Tage	7 Tage
71	**Zaunbau**	Mo, 01.06.26	So, 07.06.26		5 Tage	7 Tage
72	**Grünflächen/ Pflanzungen im Herbst**					

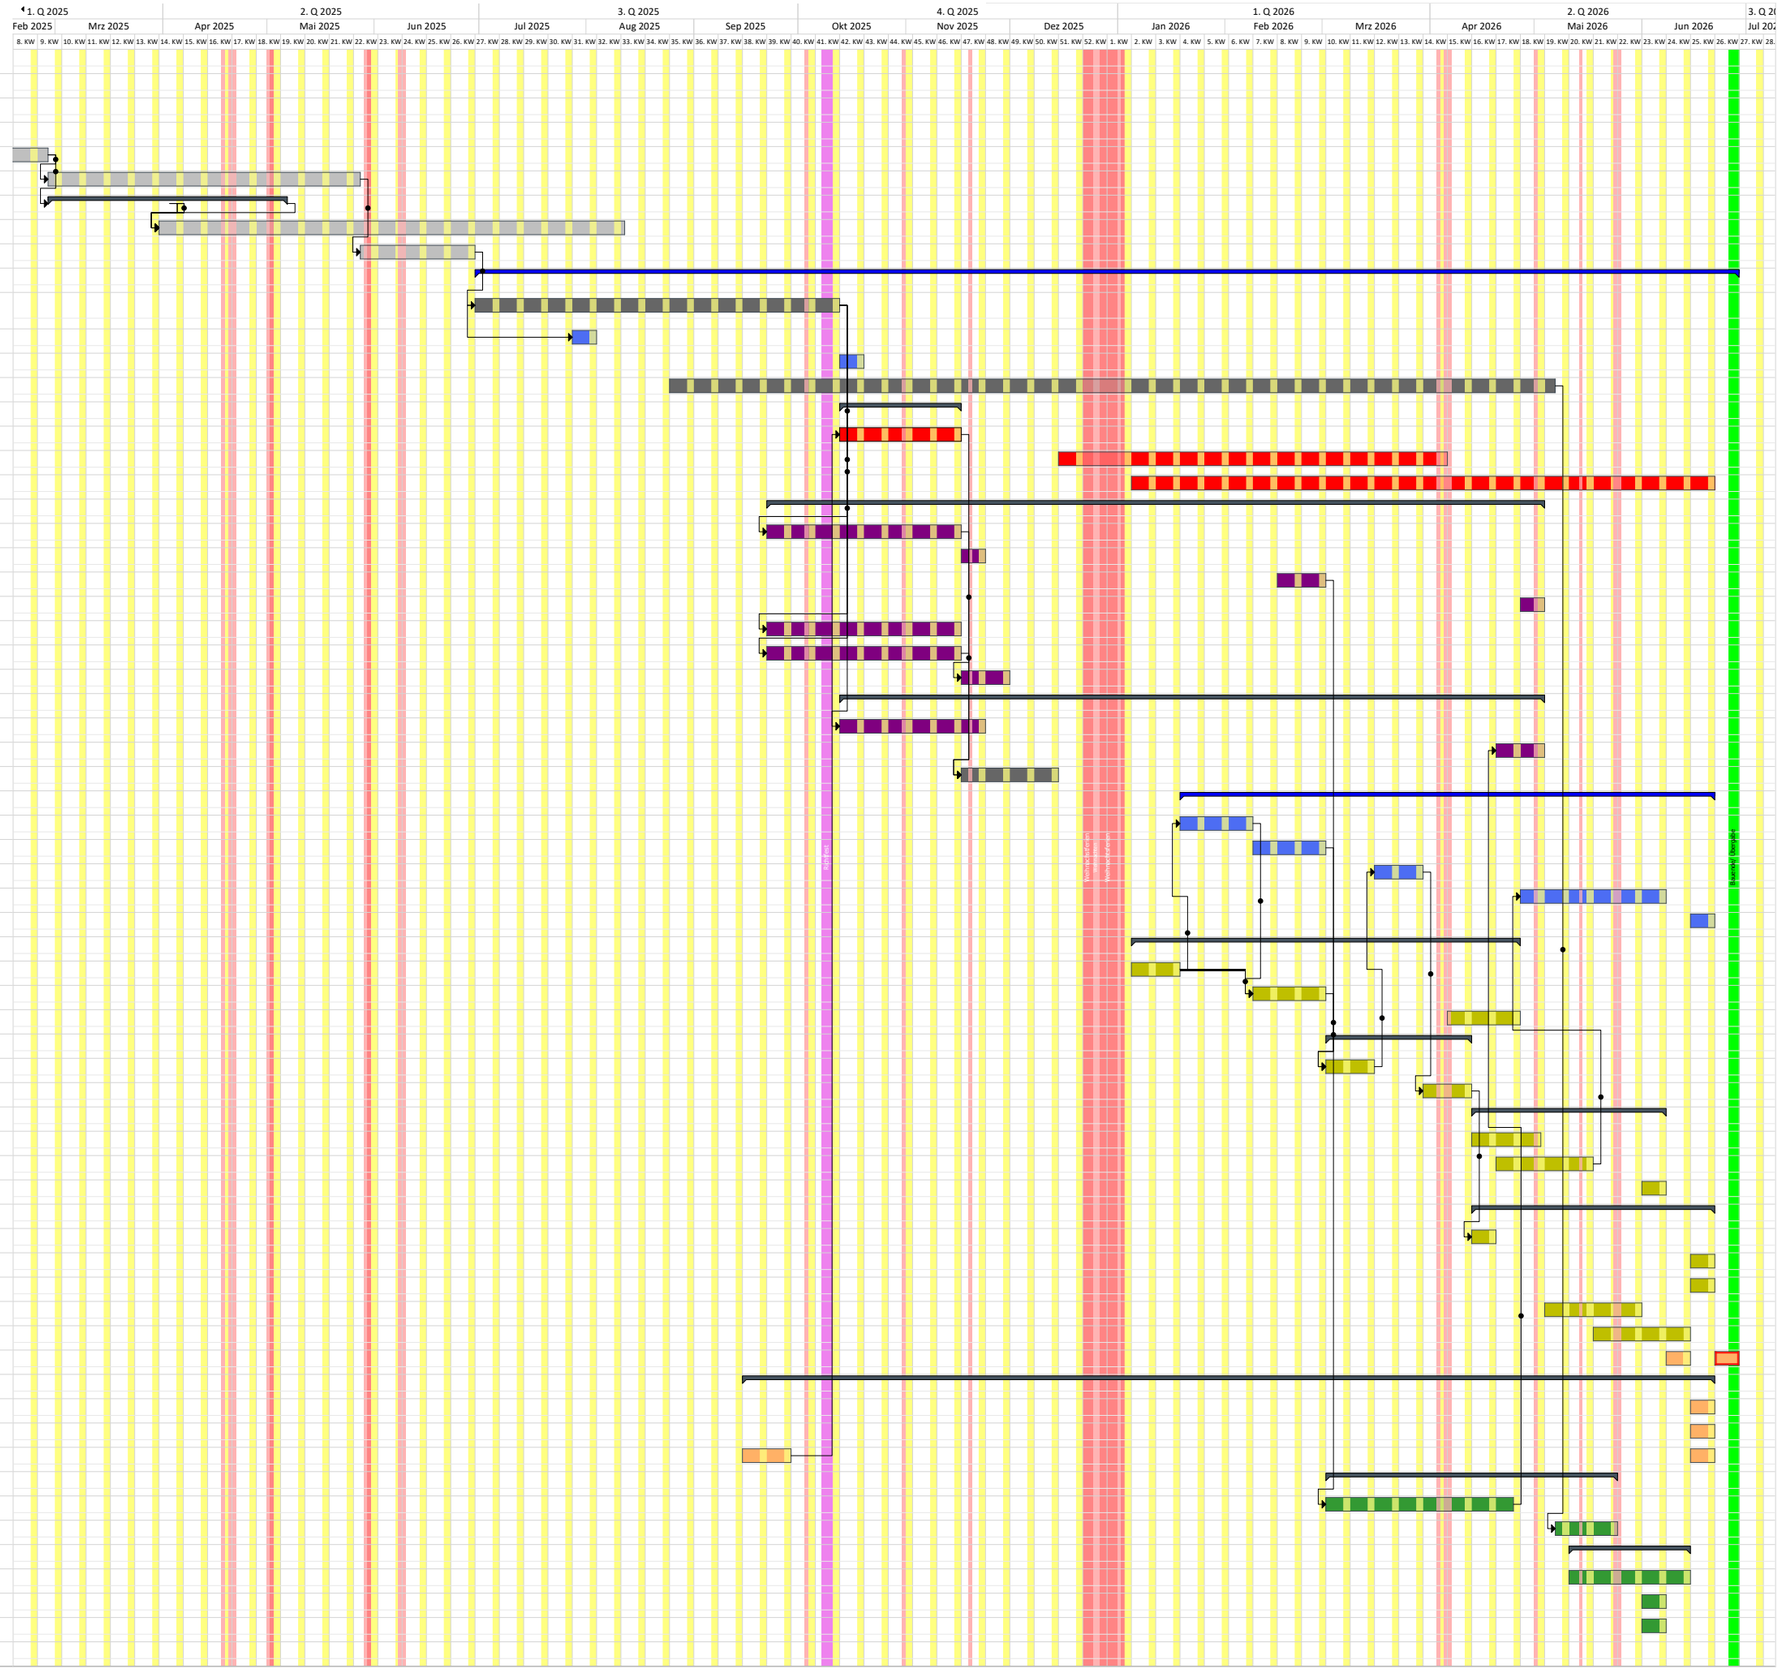
1. Q 2025
2. Q 2025
3. Q 2025
4. Q 2025
1. Q 2026
2. Q 2026
Feb 2025
Mrz 2025
Apr 2025
Mai 2025
Jun 2025
Jul 2025
Aug 2025
Sep 2025
Okt 2025
Nov 2025
Dez 2025
Jan 2026
Feb 2026
Mrz 2026
Apr 2026
Mai 2026
Jun 2026
Baustellenfenster
Bauzeitfenster
Baustellenfenster
Baustellenfenster
Baustellen
