WAHB
Kläranlage Silstedt

Bauzeitenplan Klärschlammfaulung

Stand: 10.04.2025
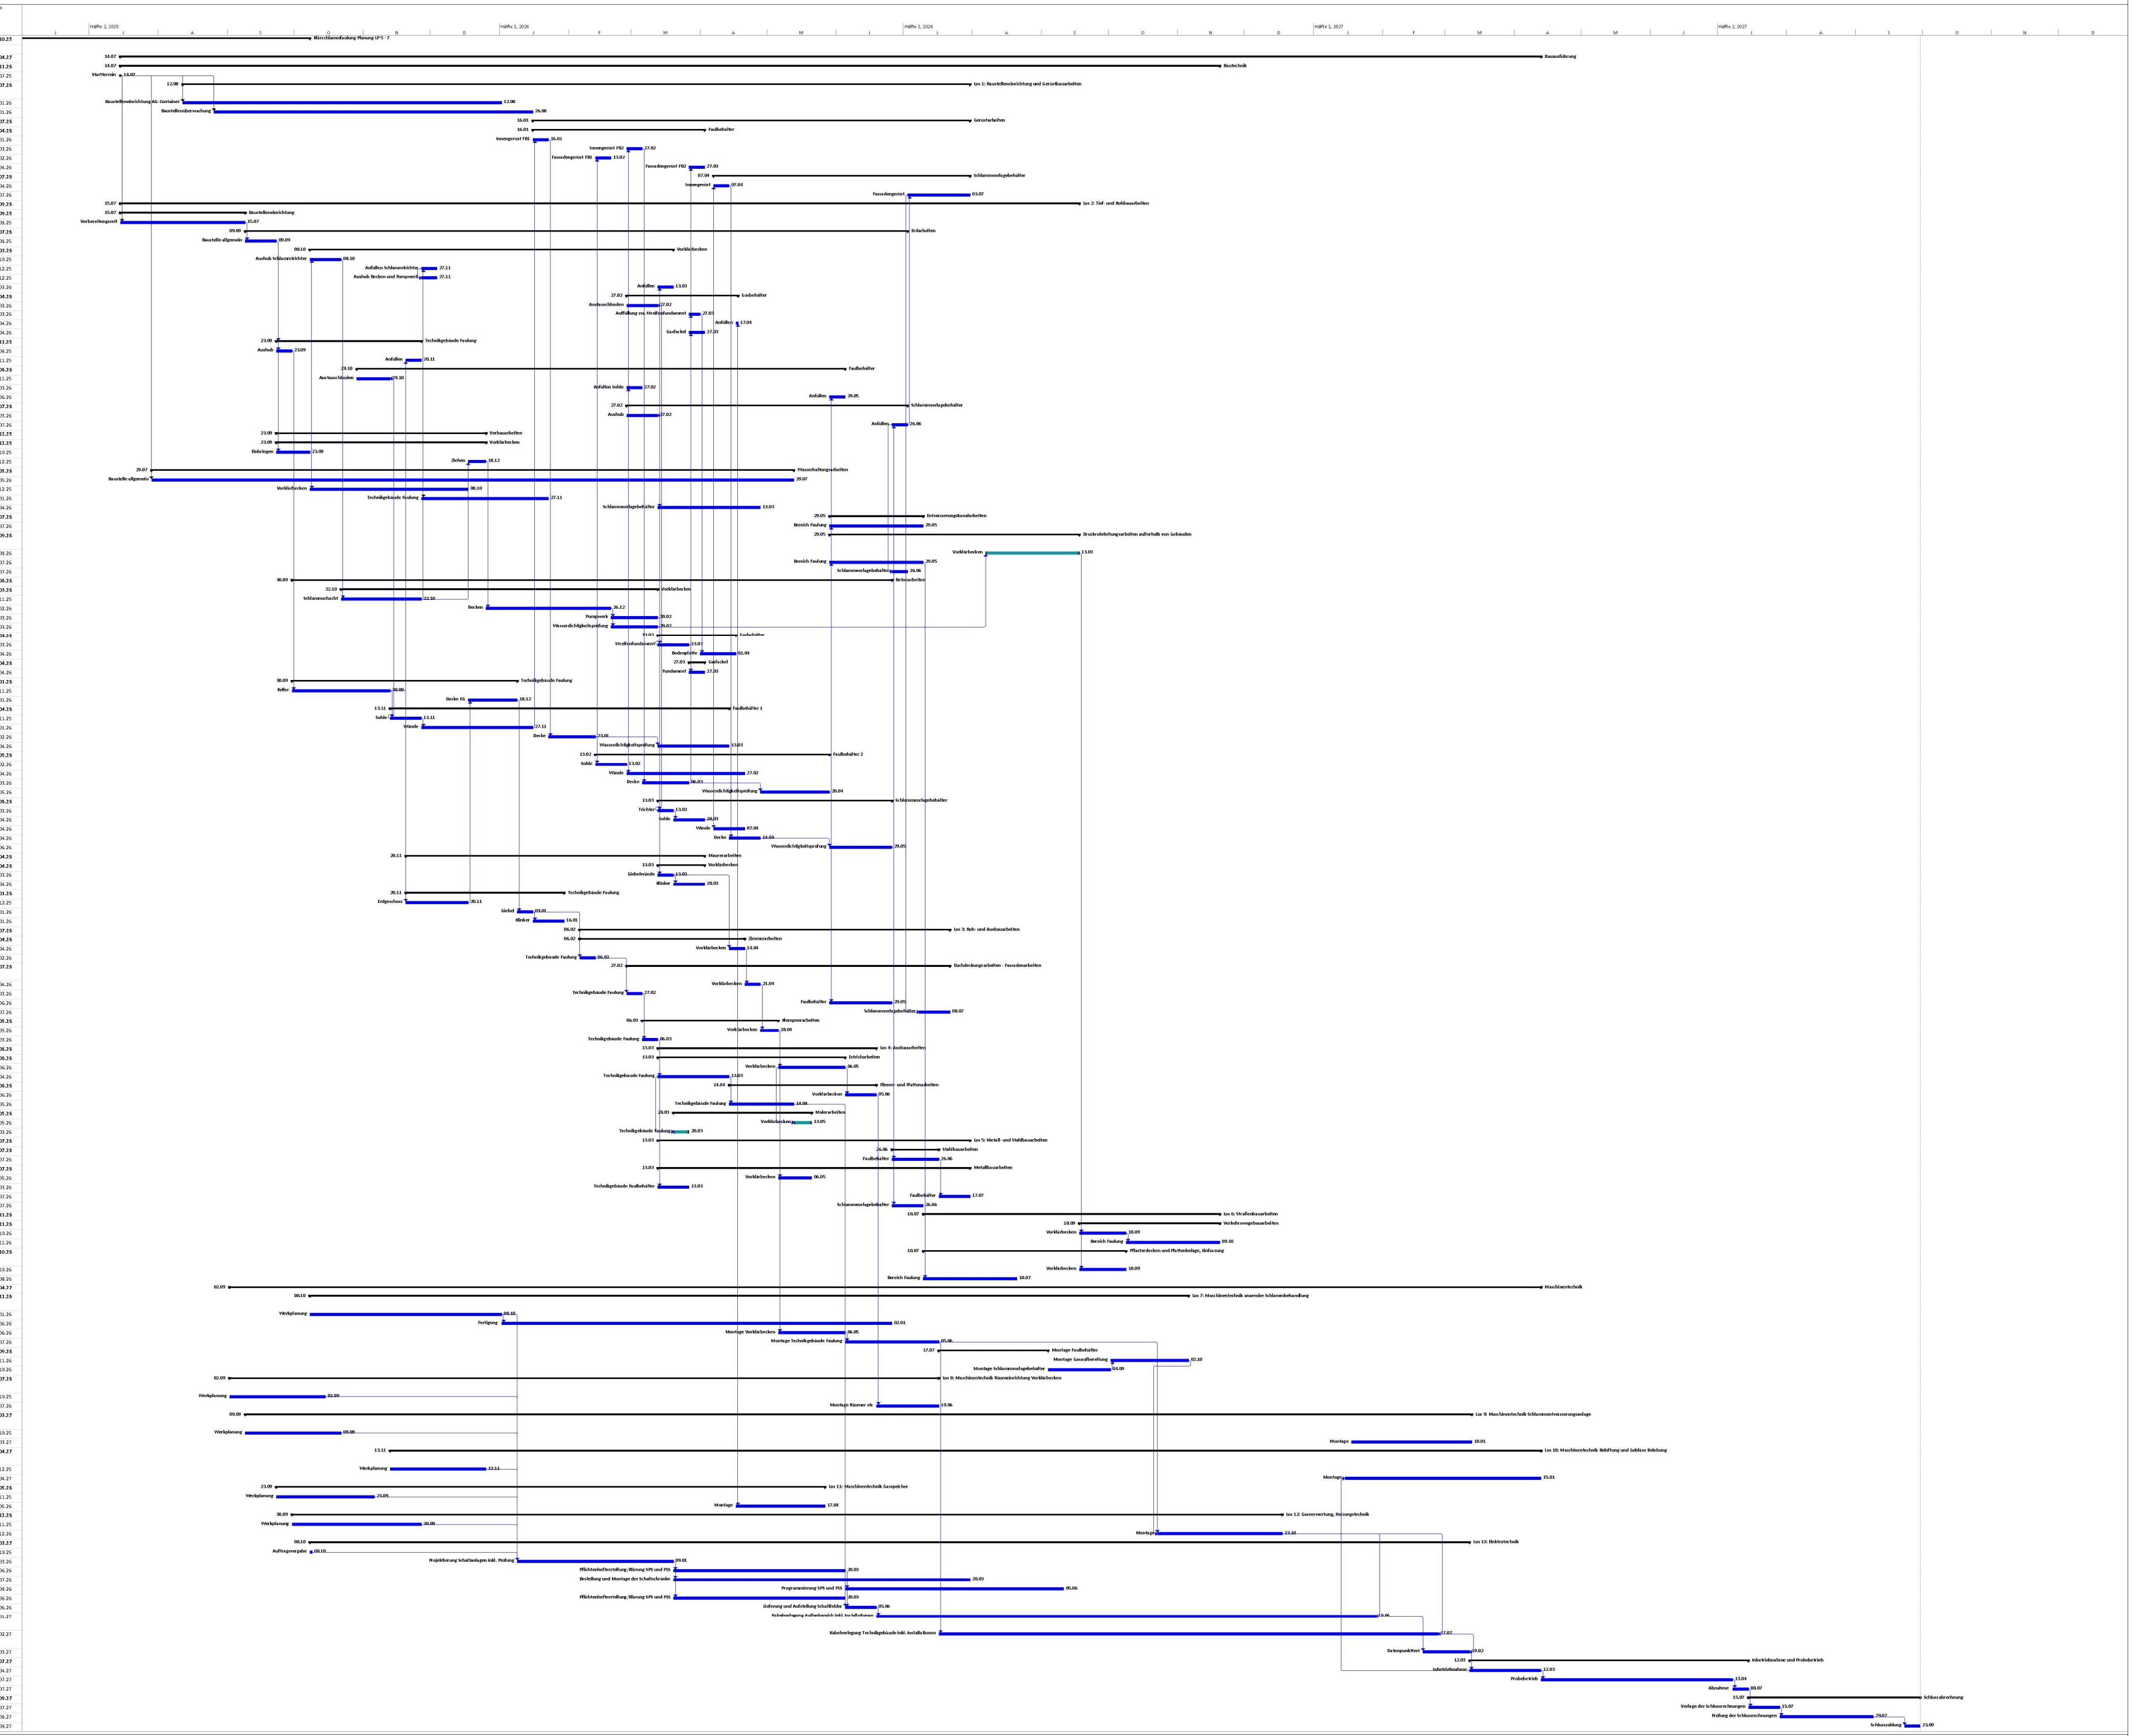
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**Klärschlammfaulung Planung LP 5 - 7**	**191 Tage**	**05.01.25**	**07.10.25**
171				
172	**Bauausführung**	**435 Tage**	**14.07.25**	**12.04.27**
173	**Bautechnik**	**345 Tage**	**14.07.25**	**19.11.26**
174	Starttermin	0 Tage	14.07.25	14.07.25
175	**Los 1: Baustelleneinrichtung und Gerüstbauarbeiten**	**245 Tage**	**12.08.25**	**30.07.26**
176	Baustelleneinrichtung AG-Container	100 Tage	12.08.25	01.01.26
177	Baustellenüberwachung	100 Tage	26.08.25	15.01.26
178	**Gerüstarbeiten**	**135 Tage**	**16.01.26**	**30.07.26**
179	**Faulbehälter**	**55 Tage**	**16.01.26**	**02.04.26**
180	Innengerüst FB1	5 Tage	16.01.26	22.01.26
181	Innengerüst FB2	5 Tage	27.02.26	05.03.26
182	Fassadengerüst FB1	5 Tage	13.02.26	19.02.26
183	Fassadengerüst FB2	5 Tage	27.03.26	02.04.26
184	**Schlammvorlagebehälter**	**80 Tage**	**07.04.26**	**30.07.26**
185	Innengerüst	5 Tage	07.04.26	13.04.26
186	Fassadengerüst	20 Tage	03.07.26	30.07.26
187	**Los 2: Tief- und Rohbauarbeiten**	**300 Tage**	**15.07.25**	**17.09.26**
188	**Baustelleneinrichtung**	**40 Tage**	**15.07.25**	**08.09.25**
189	Vorbereitungszeit	40 Tage	15.07.25	08.09.25
190	**Erdarbeiten**	**205 Tage**	**09.09.25**	**02.07.26**
191	Baustelle allgemein	10 Tage	09.09.25	22.09.25
192	**Vorklärbecken**	**115 Tage**	**08.10.25**	**19.03.26**
193	Aushub Schlammtrichter	10 Tage	08.10.25	21.10.25
194	Anfüllen Schlammtrichter	5 Tage	27.11.25	03.12.25
195	Aushub Becken und Pumpwerk	5 Tage	27.11.25	03.12.25
196	Anfüllen	5 Tage	13.03.26	19.03.26
197	**Gasbehälter**	**34 Tage**	**27.02.26**	**17.04.26**
198	Austauschboden	10 Tage	27.02.26	13.03.26
199	Auffüllung zw. Streifenfundam	3 Tage	27.03.26	31.03.26
200	Anfüllen	1 Tag	17.04.26	17.04.26
201	Gasfackel	5 Tage	27.03.26	02.04.26
202	**Technikgebäude Faulung**	**45 Tage**	**23.09.25**	**26.11.25**
203	Aushub	5 Tage	23.09.25	29.09.25
204	Anfüllen	5 Tage	20.11.25	26.11.25
205	**Faulbehälter**	**150 Tage**	**29.10.25**	**04.06.26**
206	Austauschboden	10 Tage	29.10.25	13.11.25
207	Anfüllen Sohle	5 Tage	27.02.26	05.03.26
208	Anfüllen	5 Tage	29.05.26	04.06.26
209	**Schlammvorlagebehälter**	**85 Tage**	**27.02.26**	**02.07.26**
210	Aushub	10 Tage	27.02.26	13.03.26
211	Anfüllen	5 Tage	26.06.26	02.07.26
212	**Verbauarbeiten**	**65 Tage**	**23.09.25**	**25.12.25**
213	**Vorklärbecken**	**65 Tage**	**23.09.25**	**25.12.25**
214	Einbringen	10 Tage	23.09.25	07.10.25
215	Ziehen	5 Tage	18.12.25	25.12.25
216	**Wasserhaltungsarbeiten**	**200 Tage**	**29.07.25**	**12.05.26**
217	Baustelle allgemein	200 Tage	29.07.25	12.05.26
218	Vorklärbecken	50 Tage	08.10.25	17.12.25
219	Technikgebäude Faulung	40 Tage	27.11.25	22.01.26
220	Schlammvorlagebehälter	30 Tage	13.03.26	27.04.26
221	**Entwässerungskanalarbeiten**	**30 Tage**	**29.05.26**	**09.07.26**
222	Bereich Faulung	30 Tage	29.05.26	09.07.26
223	**Druckrohrleitungsarbeiten außerhalb von Gebäuden**	**80 Tage**	**29.05.26**	**17.09.26**
224	Vorklärbecken	30 Tage	07.08.26	17.09.26
225	Bereich Faulung	30 Tage	29.05.26	09.07.26
226	Schlammvorlagebehälter	5 Tage	26.06.26	02.07.26
227	**Betonarbeiten**	**185 Tage**	**30.09.25**	**25.06.26**
228	**Vorklärbecken**	**100 Tage**	**22.10.25**	**12.03.26**
229	Schlammschacht	25 Tage	22.10.25	26.11.25
230	Becken	40 Tage	26.12.25	19.02.26
231	Pumpwerk	15 Tage	20.02.26	12.03.26
232	Wasserdichtigkeitsprüfung	15 Tage	20.02.26	12.03.26
233	**Gasbehälter**	**23 Tage**	**13.03.26**	**16.04.26**
234	Streifenfundament	10 Tage	13.03.26	26.03.26
235	Bodenplatte	10 Tage	01.04.26	16.04.26
236	**Gasfackel**	**5 Tage**	**27.03.26**	**02.04.26**
237	Fundament	5 Tage	27.03.26	02.04.26
238	**Technikgebäude Faulung**	**70 Tage**	**30.09.25**	**08.01.26**
239	Keller	30 Tage	30.09.25	12.11.25
240	Decke EG	15 Tage	18.12.25	08.01.26
241	**Faulbehälter 1**	**105 Tage**	**13.11.25**	**13.04.26**
242	Sohle	10 Tage	13.11.25	26.11.25
243	Wände	35 Tage	27.11.25	15.01.26
244	Decke	15 Tage	23.01.26	12.02.26
245	Wasserdichtigkeitsprüfung	20 Tage	13.03.26	13.04.26
246	**Faulbehälter 2**	**70 Tage**	**13.02.26**	**28.05.26**
247	Sohle	10 Tage	13.02.26	26.02.26
248	Wände	35 Tage	27.02.26	20.04.26
249	Decke	15 Tage	06.03.26	26.03.26
250	Wasserdichtigkeitsprüfung	20 Tage	28.04.26	28.05.26
251	**Schlammvorlagebehälter**	**70 Tage**	**13.03.26**	**25.06.26**
252	Trichter	5 Tage	13.03.26	19.03.26
253	Sohle	10 Tage	20.03.26	02.04.26
254	Wände	10 Tage	07.04.26	20.04.26
255	Decke	10 Tage	14.04.26	27.04.26
256	Wasserdichtigkeitsprüfung	20 Tage	29.05.26	25.06.26
257	**Maurerarbeiten**	**95 Tage**	**20.11.25**	**02.04.26**
258	**Vorklärbecken**	**15 Tage**	**13.03.26**	**02.04.26**
259	Giebelwände	5 Tage	13.03.26	19.03.26
260	Klinker	10 Tage	20.03.26	02.04.26
261	**Technikgebäude Faulung**	**50 Tage**	**20.11.25**	**29.01.26**
262	Erdgeschoss	20 Tage	20.11.25	17.12.25
263	Giebel	5 Tage	09.01.26	15.01.26
264	Klinker	10 Tage	16.01.26	29.01.26
265	**Los 3: Roh- und Ausbauarbeiten**	**113 Tage**	**06.02.26**	**21.07.26**
266	**Zimmerarbeiten**	**50 Tage**	**06.02.26**	**20.04.26**
267	Vorklärbecken	5 Tage	14.04.26	20.04.26
268	Technikgebäude Faulung	5 Tage	06.02.26	12.02.26
269	**Dachdeckungsarbeiten - Fassadenarbeiten**	**98 Tage**	**27.02.26**	**21.07.26**
270	Vorklärbecken	5 Tage	21.04.26	27.04.26
271	Technikgebäude Faulung	5 Tage	27.02.26	05.03.26
272	Faulbehälter	20 Tage	29.05.26	25.06.26
273	Schlammvorlagebehälter	10 Tage	08.07.26	21.07.26
274	**Klempnerarbeiten**	**40 Tage**	**06.03.26**	**05.05.26**
275	Vorklärbecken	5 Tage	28.04.26	05.05.26
276	Technikgebäude Faulung	5 Tage	06.03.26	12.03.26
277	**Los 4: Ausbauarbeiten**	**65 Tage**	**13.03.26**	**18.06.26**
278	**Estricharbeiten**	**55 Tage**	**13.03.26**	**04.06.26**
279	Vorklärbecken	20 Tage	06.05.26	04.06.26
280	Technikgebäude Faulung	20 Tage	13.03.26	13.04.26
281	**Fliesen- und Plattenarbeiten**	**45 Tage**	**14.04.26**	**18.06.26**
282	Vorklärbecken	10 Tage	05.06.26	18.06.26
283	Technikgebäude Faulung	20 Tage	14.04.26	12.05.26
284	**Malerarbeiten**	**40 Tage**	**20.03.26**	**20.05.26**
285	Vorklärbecken	5 Tage	13.05.26	20.05.26
286	Technikgebäude Faulung	5 Tage	20.03.26	26.03.26
287	**Los 5: Metall- und Stahlbauarbeiten**	**95 Tage**	**13.03.26**	**30.07.26**
288	**Stahlbauarbeiten**	**15 Tage**	**26.06.26**	**16.07.26**
289	Faulbehälter	15 Tage	26.06.26	16.07.26
290	**Metallbauarbeiten**	**95 Tage**	**13.03.26**	**30.07.26**
291	Vorklärbecken	10 Tage	06.05.26	20.05.26
292	Technikgebäude Faulbehälter	10 Tage	13.03.26	26.03.26
293	Faulbehälter	10 Tage	17.07.26	30.07.26
294	Schlammvorlagebehälter	10 Tage	26.06.26	09.07.26
295	**Los 6: Straßenbauarbeiten**	**95 Tage**	**10.07.26**	**19.11.26**
296	**Verkehrswegebauarbeiten**	**45 Tage**	**18.09.26**	**19.11.26**
297	Vorklärbecken	15 Tage	18.09.26	08.10.26
298	Bereich Faulung	30 Tage	09.10.26	19.11.26
299	**Pflasterdecken und Plattenbeläge, Einfassung**	**65 Tage**	**10.07.26**	**08.10.26**
300	Vorklärbecken	15 Tage	18.09.26	08.10.26
301	Bereich Faulung	30 Tage	10.07.26	20.08.26
302	**Maschinentechnik**	**400 Tage**	**02.09.25**	**12.04.27**
303	**Los 7: Maschinentechnik anaerobe Schlammbehandlung**	**275 Tage**	**08.10.25**	**05.11.26**
304	Werkplanung	60 Tage	08.10.25	01.01.26
305	Fertigung	120 Tage	02.01.26	25.06.26
306	Montage Vorklärbecken	20 Tage	06.05.26	04.06.26
307	Montage Technikgebäude Faulung	30 Tage	05.06.26	16.07.26
308	**Montage Faulbehälter**	**35 Tage**	**17.07.26**	**03.09.26**
311	Montage Gasaufbereitung	25 Tage	02.10.26	05.11.26
312	Montage Schlammvorlagebehälter	20 Tage	04.09.26	01.10.26
313	**Los 8: Maschinentechnik Räumeinrichtung Vorklärbecken**	**220 Tage**	**02.09.25**	**16.07.26**
314	Werkplanung	30 Tage	02.09.25	14.10.25
315	Montage Räumer etc	20 Tage	19.06.26	16.07.26
316	**Los 9: Maschinentechnik Schlammentwässerungsanlage**	**376 Tage**	**09.09.25**	**12.03.27**
317	Werkplanung	30 Tage	09.09.25	21.10.25
318	Montage	40 Tage	18.01.27	12.03.27
319	**Los 10: Maschinentechnik Belüftung und Gebläse Belebung**	**350 Tage**	**13.11.25**	**12.04.27**
320	Werkplanung	30 Tage	13.11.25	25.12.25
321	Montage	60 Tage	15.01.27	12.04.27
322	**Los 11: Maschinentechnik Gasspeiche**	**168 Tage**	**23.09.25**	**26.05.26**
323	Werkplanung	30 Tage	23.09.25	05.11.25
324	Montage	25 Tage	17.04.26	26.05.26
325	**Los 12: Gasverwertung, Heizungstech**	**310 Tage**	**30.09.25**	**17.12.26**
326	Werkplanung	40 Tage	30.09.25	26.11.25
327	Montage	40 Tage	23.10.26	17.12.26
328	**Los 13: Elektrotechnik**	**355 Tage**	**08.10.25**	**11.03.27**
329	Auftragsvergabe	1 Tag	08.10.25	08.10.25
330	Projektierung Schaltanlagen inkl. Pr	50 Tage	09.01.26	19.03.26
331	Pflichtenhefterstellung/Klärung SPS	50 Tage	20.03.26	04.06.26
332	Bestellung und Montage der Schalts	90 Tage	20.03.26	30.07.26
333	Programmierung SPS und PLS	70 Tage	05.06.26	10.09.26
334	Pflichtenhefterstellung/Klärung SPS	50 Tage	20.03.26	04.06.26
335	Lieferung und Aufstellung Schaltfeld	10 Tage	05.06.26	18.06.26
336	Kabelverlegung Außenbereich inkl. Installationen	150 Tage	19.06.26	28.01.27
337	Kabelverlegung Technikgebäude inkl. Installationen	150 Tage	17.07.26	25.02.27
338	Datenpunkttest	15 Tage	19.02.27	11.03.27
339	**Inbetriebnahme und Probebetrieb**	**85 Tage**	**12.03.27**	**14.07.27**
340	Inbetriebnahme	20 Tage	12.03.27	12.04.27
341	Probebetrieb	60 Tage	13.04.27	07.07.27
342	Abnahme	5 Tage	08.07.27	14.07.27
343	**Schlussabrechnung**	**55 Tage**	**15.07.27**	**29.09.27**
344	Vorlage der Schlussrechnungen	10 Tage	15.07.27	28.07.27
345	Prüfung der Schlussrechnungen	30 Tage	29.07.27	08.09.27
346	Schlusszahlung	5 Tage	23.09.27	29.09.27
