Stand: Die 22.10.24

Knoten Berliner Straße/Roscherstraße
Anbindung Planstr. C an Berliner Straße

Nr.	Vor	Vorgangsname
1		**Allgemeines**
2		Baustelleneinrichtung
3		Verkehrssicherung einrichten
4		Baustellenberäumung
5		ABNAHME
6		**Bauphase "Anbindung Planstraße C"**
7		**Vorbereitung / Erdbau**
8		Baufeldfreimachung/Rodung
9		Versetzung Säule
10		Oberbodenabtrag / Erdbau
11		**Leitungsbau**
12		Verlegung Trinkwasser
13		Verlegung Strom, SBL
14		Verlegung LSA, Herstellung Mastfundemente
15		Tieferlegung Gashochdruckleitung
16		Neubau Schächte
17		Neubau Regenwasserkanal
18		Neubau Straßenentwässrung
19		**Straßenbau**
20		Herstellung Planum
21		Herstellung ung. Tragschichten
22		Neubau Bordanlage
23		Asphalteinbau
24		Pflasterarbeiten
25		Oberbodenandeckung
26		Fahrbahnmarkierung
27		**Errichtung LSA**
28		Montage LSA
29		**Bauphase "Knoten Berliner Straße Nord"**
30		**Leitungsbau**
31		Durchörtung LVB-Gleise (LSA-Schutzrohre, Strom)
32		Verlegung LSA, Strom, Herstellung Mastfundamente
33		**Vorbereitende Maßnahmen Straßenbau**
34		Einrichtung BE
35		**Straßenbau**
36		Deckensanierung
37		Fahrbahnmarkierung
38		**Errichtung LSA**
39		Montage LSA
40		**Bauphase "Knoten Berliner Straße Süd"**
41		**Leitungsbau**
42		Desinfektion/DP und Hygieneprüfung TWL
43		Einbindung TWL
44		Anbindung Regenwasserkanal
45		Verlegung LSA, Strom
46		**Vorbereitende Maßnahmen Straßenbau**
47		Einrichtung BE
48		**Straßenbau**
49		Deckensanierung
50		Fahrbahnmarkierung
51		**Bauphase "Berliner Straße"**
52		Fahrbahnmarkierung

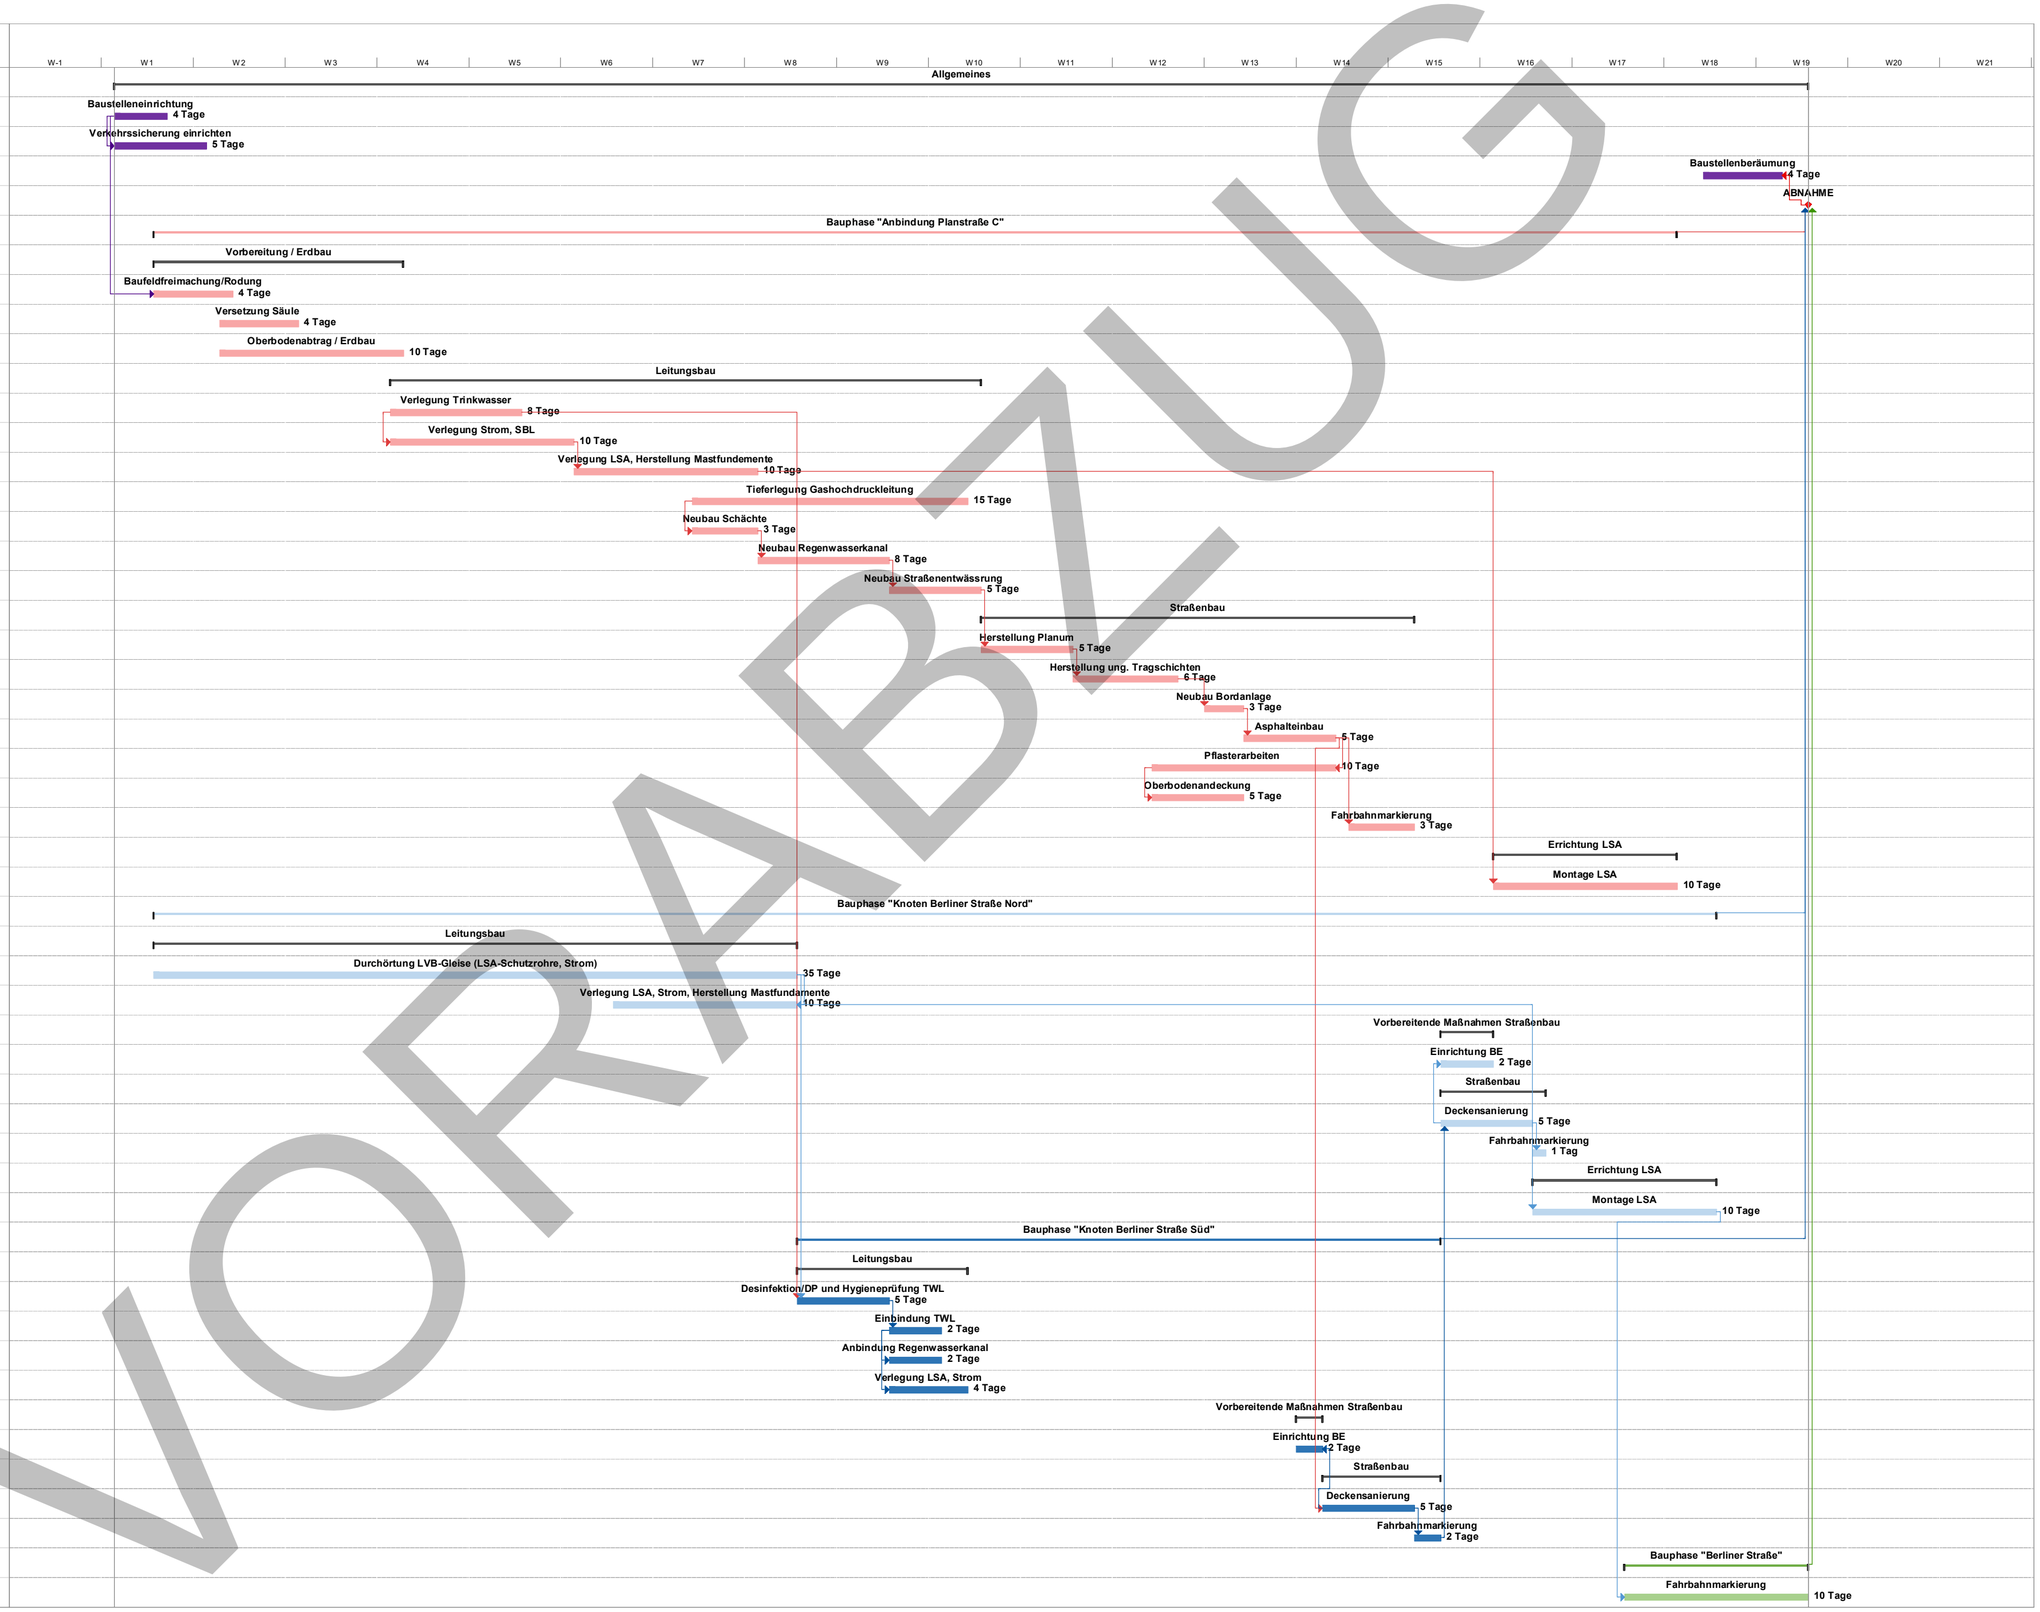

VORABZUG

Vorgang | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Inaktiver Meilenstein | Manueller Vorgang | Manueller Sammelrollup | Nur Anfang | Externe Vorgänge | Stichtag | Manueller Fortschritt
Unterbrechung | Sammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Sammelvorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Nur Ende | Externer Meilenstein | In Arbeit
