Bauzeitenplan Gymnasium Weferlingen BT A
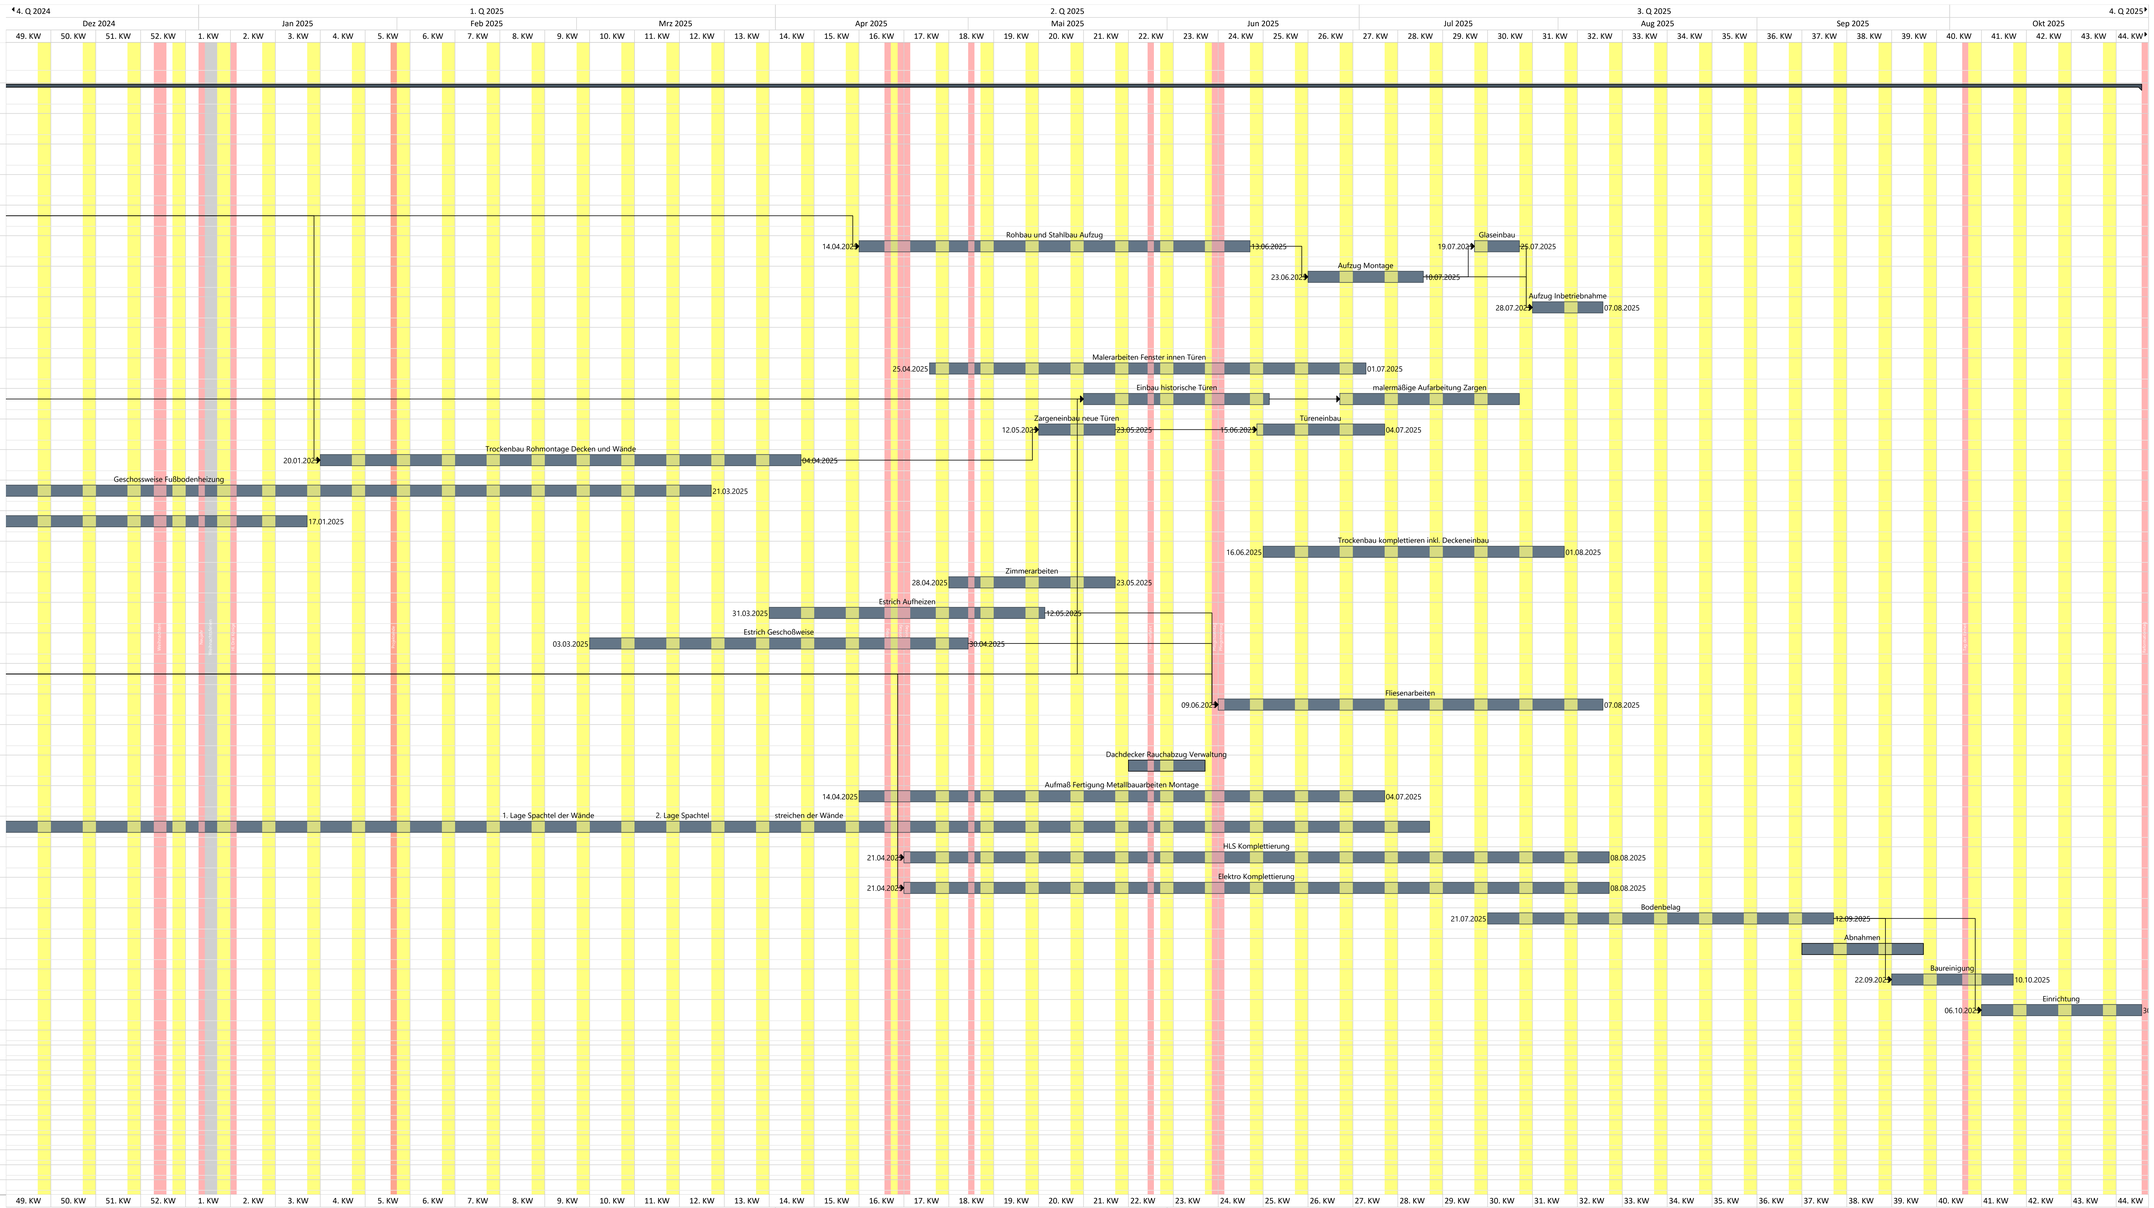
Nr	Name	Anfang	Ende	Dauer(AT)	Dauer
1	**Altbau BT A Gymn. Weferlingen**				
2	Bauteil A Gymn. Weferlingen	Mo, 24.07.23	Do, 30.10.25	572 Tage	830 Tage
2.1	Mauer- und Betonarbeiten	Mo, 24.07.23	Mi, 01.11.23	71 Tage	101 Tage
2.2	Aufzug Planung	Mo, 07.08.23	Fr, 15.09.23	30 Tage	40 Tage
2.3	Schadstoffsanierung und Türen Vergabe	Mo, 18.12.23	Fr, 23.02.24	47 Tage	68 Tage
2.4	Schadstoffsanierung Ausführung	Do, 29.02.24	Fr, 12.07.24	66 Tage	97 Tage
2.5	Rohbau und Stahlbau Aufzug	Mo, 14.04.25	Fr, 25.07.25	45 Tage	68 Tage
2.6	Aufzug Montage	Mo, 23.06.25	Do, 10.07.25	14 Tage	18 Tage
2.7	Aufzug Inbetriebnahme	Mo, 28.07.25	Do, 07.08.25	9 Tage	11 Tage
2.8	Malerarbeiten Fenster Türen	Mo, 12.08.24	Fr, 18.10.24	49 Tage	68 Tage
2.9	Malerarbeiten Fenster Türen	Fr, 25.04.25	Di, 01.07.25	45 Tage	68 Tage
2.10	Tischler Türen und Aufarbeitung Innentüren	Do, 29.02.24	Fr, 25.07.25	103 Tage	145 Tage
2.11	Zargeneinbau neue Türen	Mo, 12.05.25	Fr, 04.07.25	25 Tage	32 Tage
2.12	Trockenbau Rohmontage	Mo, 20.01.25	Fr, 04.04.25	55 Tage	75 Tage
2.13	HLS Rohinstallation	Mo, 26.08.24	Fr, 21.03.25	144 Tage	208 Tage
2.14	Elektro Rohinstallation	Mo, 10.06.24	Fr, 17.01.25	154 Tage	222 Tage
2.15	Trockenbau komplettieren inkl. Deckeneinbau	Mo, 16.06.25	Fr, 01.08.25	35 Tage	47 Tage
2.16	Zimmerarbeiten	Mo, 28.04.25	Fr, 23.05.25	19 Tage	26 Tage
2.17	Estrich Aufheizen	Mo, 31.03.25	Mo, 12.05.25	28 Tage	43 Tage
2.18	Estrich	Mo, 03.03.25	Mi, 30.04.25	41 Tage	59 Tage
2.19	Innenputz	Mo, 22.07.24	Fr, 04.10.24	54 Tage	75 Tage
2.20	Fliesenarbeiten	Mo, 09.06.25	Do, 07.08.25	43 Tage	60 Tage
2.21	Dachdeckerarbeiten	Fr, 27.09.24	Fr, 18.10.24	15 Tage	22 Tage
2.22	Dachdeckerarbeiten	Mo, 26.05.25	Fr, 06.06.25	9 Tage	12 Tage
2.23	Metallbauarbeiten	Mo, 14.04.25	Fr, 04.07.25	55 Tage	82 Tage
2.24	Maler Innenräume	Mo, 18.11.24	Fr, 11.07.25	161 Tage	236 Tage
2.25	HLS Komplettierung	Mo, 21.04.25	Fr, 08.08.25	76 Tage	110 Tage
2.26	Elektro Komplettierung	Mo, 21.04.25	Fr, 08.08.25	76 Tage	110 Tage
2.27	Bodenbelag	Mo, 21.07.25	Fr, 12.09.25	40 Tage	54 Tage
2.28	Abnahmen	Mo, 08.09.25	Fr, 26.09.25	15 Tage	19 Tage
2.29	Baureinigung	Mo, 22.09.25	Fr, 10.10.25	14 Tage	19 Tage
2.30	Einrichtung	Mo, 06.10.25	Do, 30.10.25	19 Tage	25 Tage
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13
