Kurmittelhaus Bad Schlema

2.Bauabschnitt

23.03.2023

Michael Gäbler

Nr.	Bezeichnung	Start	Dauer	Ende
1	**Vorbereitung**	**17.10.2022**	**290t**	**11.12.2023**
2	Ausschreibung	17.10.2022	15t	07.11.2022
3	Angebotsphase	08.11.2022	20t	06.12.2022
4	Prüfung	07.12.2022	10t	20.12.2022
5	Vergabe	29.12.2022		29.12.2022
6	Baubeginn	12.01.2023		12.01.2023
7	**Therapiebecken 3**	**02.01.2023**	**238t**	**11.12.2023**
8	Beräumung	02.01.2023	5t	06.01.2023
9	Rückbau Salzgrotte	12.01.2023	14t	31.01.2023
10	Durchbrüche zu 2.UG	01.02.2023	5t	07.02.2023
11	Stützen 2.UG	08.02.2023	20t	07.03.2023
12	Wände Zugang MW+TB	08.02.2023	15t	28.02.2023
13	Werkplanung Becken	12.01.2023	10t	25.01.2023
14	technische Freigabe Becken	26.01.2023	5t	01.02.2023
15	Fertigung Becken	02.02.2023	51t	17.04.2023
16	Montage Becken	18.04.2023	9t	28.04.2023
17	Rohbau Therapieraum	17.04.2023	15t	08.05.2023
18	Flurwände	09.05.2023	25t	14.06.2023
19	HLSE Unterputz	17.04.2023	2t	18.04.2023
20	Putzarbeiten	15.06.2023	10t	28.06.2023
21	Verglasung	29.06.2023	10t	12.07.2023
22	HLSE Rohinstallation	29.06.2023	20t	26.07.2023
23	Estrich	27.07.2023	10t	09.08.2023
24	HLSE Feininstallation	17.08.2023	5t	23.08.2023
25	Maler	24.08.2023	15t	13.09.2023
26	Boden Flur	14.09.2023	5t	20.09.2023
27	Abdichtungsarbeiten	14.09.2023	5t	20.09.2023
28	Fliesen	21.09.2023	20t	19.10.2023
29	Geländer	20.10.2023	5t	26.10.2023
30	Einrichtung	27.10.2023	5t	03.11.2023
31	HLSE Fertiginstallation	06.11.2023	10t	17.11.2023
32	Reinigung	20.11.2023	5t	27.11.2023
33	Beckenfüllung	27.10.2023	5t	03.11.2023
34	Start Umwälzung	06.11.2023		06.11.2023
35	Abnahmen	28.11.2023	5t	04.12.2023
36	Mängelbeseitigung	05.12.2023	5t	11.12.2023
37	Fertigstellung	11.12.2023		11.12.2023
38	Wasserproben	06.11.2023	15t	27.11.2023
39	Inbetriebnahme	11.12.2023		11.12.2023
40	**2. Bauabschnitt**	**01.08.2022**	**541t**	**23.09.2024**
41	**Lph 5-7**	**01.08.2022**	**251t**	**31.07.2023**
42	Ausführungsplanung	01.08.2022	150t	02.03.2023
43	Ausschreibung	06.01.2023	80t	02.05.2023
44	Angebotsphase	26.05.2023	20t	23.06.2023
45	Prüfung	26.06.2023	10t	07.07.2023
46	Vergabe	17.07.2023		17.07.2023
47	Baubeginn	31.07.2023		31.07.2023
48	**Bauausführung**	**31.07.2023**	**290t**	**23.09.2024**
49	**Fassade**	**11.03.2024**	**65t**	**14.06.2024**
50	Gerüst	11.03.2024	10t	22.03.2024
51	Dachklempner	25.03.2024	10t	09.04.2024
52	Überarbeitung WDVS	10.04.2024	20t	08.05.2024
53	Anstrich	10.05.2024	15t	31.05.2024
54	Abnahmen	31.05.2024		31.05.2024
55	Mängelbeseitigung	03.06.2024	5t	07.06.2024
56	Gerüstabbau	10.06.2024	5t	14.06.2024
57	Fertigstellung	14.06.2024		14.06.2024
58	**Badehalle II**	**02.01.2024**	**185t**	**23.09.2024**
59	Betrieb einstellen	02.01.2024		02.01.2024
60	Beräumung	02.01.2024		02.01.2024
61	Beckenleerung	02.01.2024		02.01.2024
62	Begutachtung Becken	02.01.2024	5t	08.01.2024
63	Sicherungsmaßnahmen	09.01.2024	5t	15.01.2024
64	HLSE Rückbau	16.01.2024	5t	22.01.2024
65	Sanierung Technik 2.UG	15.01.2024	84t	15.05.2024
66	Abbruch	23.01.2024	5t	29.01.2024
67	Entwässerung	30.01.2024	10t	12.02.2024
68	Estrich	13.02.2024	5t	19.02.2024
69	Gerüstbau	27.02.2024	5t	04.03.2024
70	HLSE Unterputz	05.03.2024	5t	11.03.2024
71	Putzarbeiten	12.03.2024	5t	18.03.2024
72	HLSE Rohinstallation I	19.03.2024	10t	03.04.2024
73	Malerarbeiten I	04.04.2024	5t	10.04.2024
74	Decke	11.04.2024	10t	24.04.2024
75	HLSE Fertiginstallation Decke	18.04.2024	10t	02.05.2024
76	Gerüstabbau	03.05.2024	5t	10.05.2024
77	HLSE Feininstallation	13.05.2024	5t	17.05.2024
78	Malerarbeiten II	21.05.2024	5t	27.05.2024
79	Beckensanierung	03.05.2024	15t	27.05.2024
80	Einbauteile Becken	13.05.2024	5t	17.05.2024
81	Feininstallation MSR 2.UG	17.05.2024	40t	12.07.2024
82	Abdichtungsarbeiten	28.05.2024	15t	17.06.2024
83	Fliesen	18.06.2024	15t	08.07.2024
84	Einrichtung	09.07.2024	5t	15.07.2024
85	HLSE Fertiginstallation	09.07.2024	10t	22.07.2024
86	Reinigung	23.07.2024	5t	29.07.2024
87	Beckenfüllung	30.07.2024	5t	05.08.2024
88	Start Umwälzung	06.08.2024		06.08.2024
89	Abnahmen	30.07.2024	5t	05.08.2024
90	Mängelbeseitigung	06.08.2024	5t	12.08.2024
91	Fertigstellung	12.08.2024		12.08.2024
92	Wasserproben	03.09.2024	15t	23.09.2024
93	Inbetriebnahme	23.09.2024		23.09.2024
94	**Badehalle I**	**31.07.2023**	**290t**	**23.09.2024**
95	Betrieb einstellen	31.07.2023		31.07.2023
96	Beräumung	31.07.2023	5t	04.08.2023
97	Beckenleerung	04.08.2023		04.08.2023
98	Begutachtung Becken	07.08.2023	5t	11.08.2023
99	Sicherungsmaßnahmen	14.08.2023	10t	25.08.2023
100	Rückbau	28.08.2023	10t	08.09.2023
101	HLSE Rückbau	28.08.2023	5t	01.09.2023
102	Abbruch	11.09.2023	20t	09.10.2023
103	Rohbau	10.10.2023	5t	16.10.2023
104	Entwässerung	10.10.2023	15t	30.10.2023
105	Sanierung Technik im 2.UG	10.10.2023	80t	05.02.2024
106	Estrich	01.11.2023	10t	14.11.2023
107	Gerüstbau	30.11.2023	15t	20.12.2023
108	HLSE Unterputz	21.12.2023	10t	08.01.2024
109	Putzarbeiten	09.01.2024	10t	22.01.2024
110	Malerarbeiten I	23.01.2024	15t	12.02.2024
111	HLSE Rohinstallation I	13.02.2024	15t	04.03.2024
112	Decke	05.03.2024	20t	03.04.2024
113	HLSE Fertiginstallation	19.03.2024	15t	10.04.2024
114	Gerüstabbau	04.04.2024	10t	17.04.2024
115	HLSE Feinstallation	18.04.2024	15t	10.05.2024
116	Malerarbeiten II	13.05.2024	10t	27.05.2024
117	Beckensanierung	25.04.2024	15t	17.05.2024
118	Einbauteile Becken	03.05.2024	5t	10.05.2024
119	Abdichtungsarbeiten	28.05.2024	15t	17.06.2024
120	Fliesen	18.06.2024	25t	22.07.2024
121	Feininstallation MSR 2.UG	16.05.2024	40t	11.07.2024
122	HLSE Fertiginstallation	16.07.2024	20t	12.08.2024
123	Einrichtung	23.07.2024	10t	05.08.2024
124	Reinigung	13.08.2024	10t	26.08.2024
125	Beckenfüllung	27.08.2024	5t	02.09.2024
126	Start Umwälzung	03.09.2024		03.09.2024
127	Abnahmen	06.08.2024	5t	12.08.2024
128	Mängelbeseitigung	13.08.2024	10t	26.08.2024
129	Fertigstellung	03.09.2024		03.09.2024
130	Wasserproben	03.09.2024	15t	23.09.2024
131	Inbetriebnahme	23.09.2024		23.09.2024
132	**Umkleide**	**31.07.2023**	**290t**	**23.09.2024**
133	Betrieb einstellen	31.07.2023		31.07.2023
134	Beräumung	31.07.2023	5t	04.08.2023
135	Rückbau	07.08.2023	10t	18.08.2023
136	Rückbau HLSE	21.08.2023	5t	25.08.2023
137	Technik 2.UG	21.08.2023	120t	12.02.2024
138	Abbruch	21.08.2023	10t	01.09.2023
139	Maurerarbeiten	04.09.2023	10t	15.09.2023
140	HLSE Schacht	04.09.2023	20t	29.09.2023
141	Schacht schließen	02.10.2023	5t	09.10.2023
142	HLSE Unterputz	02.10.2023	10t	16.10.2023
143	Putzarbeiten	17.10.2023	10t	30.10.2023
144	Trockenbau I	01.11.2023	10t	14.11.2023
145	HLSE Rohinstallation	15.11.2023	20t	13.12.2023
146	Trockenbau II	14.12.2023	10t	29.12.2023
147	Estrich	02.01.2024	10t	15.01.2024
148	HLSE Feininstallation	23.01.2024	5t	29.01.2024
149	Maler	30.01.2024	15t	19.02.2024
150	Decke	20.02.2024	15t	11.03.2024
151	Abdichtungsarbeiten	12.03.2024	5t	18.03.2024
152	Fliesen	19.03.2024	20t	17.04.2024
153	Feininstallation MSR 2UG	23.02.2024	60t	23.05.2024
154	Einrichtung	18.04.2024	15t	10.05.2024
155	HLSE Fertiginstallation	13.05.2024	10t	27.05.2024
156	Reinigung	28.05.2024	10t	10.06.2024
157	Abnahmen	28.05.2024	15t	17.06.2024
158	Mängelbeseitigung	18.06.2024	10t	01.07.2024
159	Fertigstellung	01.07.2024		01.07.2024
160	Wasserproben	03.09.2024	15t	23.09.2024
161	Inbetriebnahme	23.09.2024		23.09.2024
162	**Gastro**	**31.07.2023**	**290t**	**23.09.2024**
163	Betrieb einstellen	31.07.2023		31.07.2023
164	Beräumung	31.07.2023	5t	04.08.2023
165	Rückbau	07.08.2023	10t	18.08.2023
166	Rückbau HLSE	07.08.2023	10t	18.08.2023
167	Abbruch	21.08.2023	15t	08.09.2023
168	Technik 2.UG	21.08.2023	120t	12.02.2024
169	Dach	04.09.2023	20t	29.09.2023
170	Fassade	02.10.2023	15t	23.10.2023
171	Putz / WDVS außen	24.10.2023	35t	13.12.2023
172	Maurerarbeiten	02.10.2023	10t	16.10.2023
173	HLSE Unterputz	24.10.2023	15t	14.11.2023
174	Putzarbeiten	15.11.2023	10t	29.11.2023
175	Trockenbau I	30.11.2023	10t	13.12.2023
176	HLSE Rohinstallation	14.12.2023	25t	22.01.2024
177	Trockenbau II	23.01.2024	10t	05.02.2024
178	Entwässerung	06.02.2024	5t	12.02.2024
179	Estrich	13.02.2024	10t	26.02.2024
180	HLSE Feinstallation	05.03.2024	10t	18.03.2024
181	Maler	12.03.2024	15t	03.04.2024
182	Decke	04.04.2024	25t	10.05.2024
183	Fliesen	13.05.2024	20t	10.06.2024
184	Feininstallation Technik 2.UG	23.02.2024	60t	23.05.2024
185	Einrichtung	11.06.2024	25t	15.07.2024
186	HLSE Fertiginstallaion	13.05.2024	35t	01.07.2024
187	Reinigung	25.06.2024	10t	08.07.2024
188	Abnahmen	02.07.2024	15t	22.07.2024
189	Mängelbeseitigung	23.07.2024	10t	05.08.2024
190	Fertigstellung	05.08.2024		05.08.2024
191	Wasserproben	03.09.2024	15t	23.09.2024
192	Inbetriebnahme	23.09.2024		23.09.2024
193	**Außenanlagen**	**15.04.2024**	**75t**	**31.07.2024**
194	Rückbau Baustraßen	15.04.2024	10t	26.04.2024
195	Rinnen + Borde	29.04.2024	20t	29.05.2024
196	HLSE Außenanlagen	30.05.2024	15t	19.06.2024
197	Plattenbeläge	20.06.2024	15t	10.07.2024
198	Beläge Treppe	20.06.2024	20t	17.07.2024
199	Abnahmen	18.07.2024	5t	24.07.2024
200	Mängelbeseitigung	25.07.2024	5t	31.07.2024
201	Fertigstellung	31.07.2024		31.07.2024

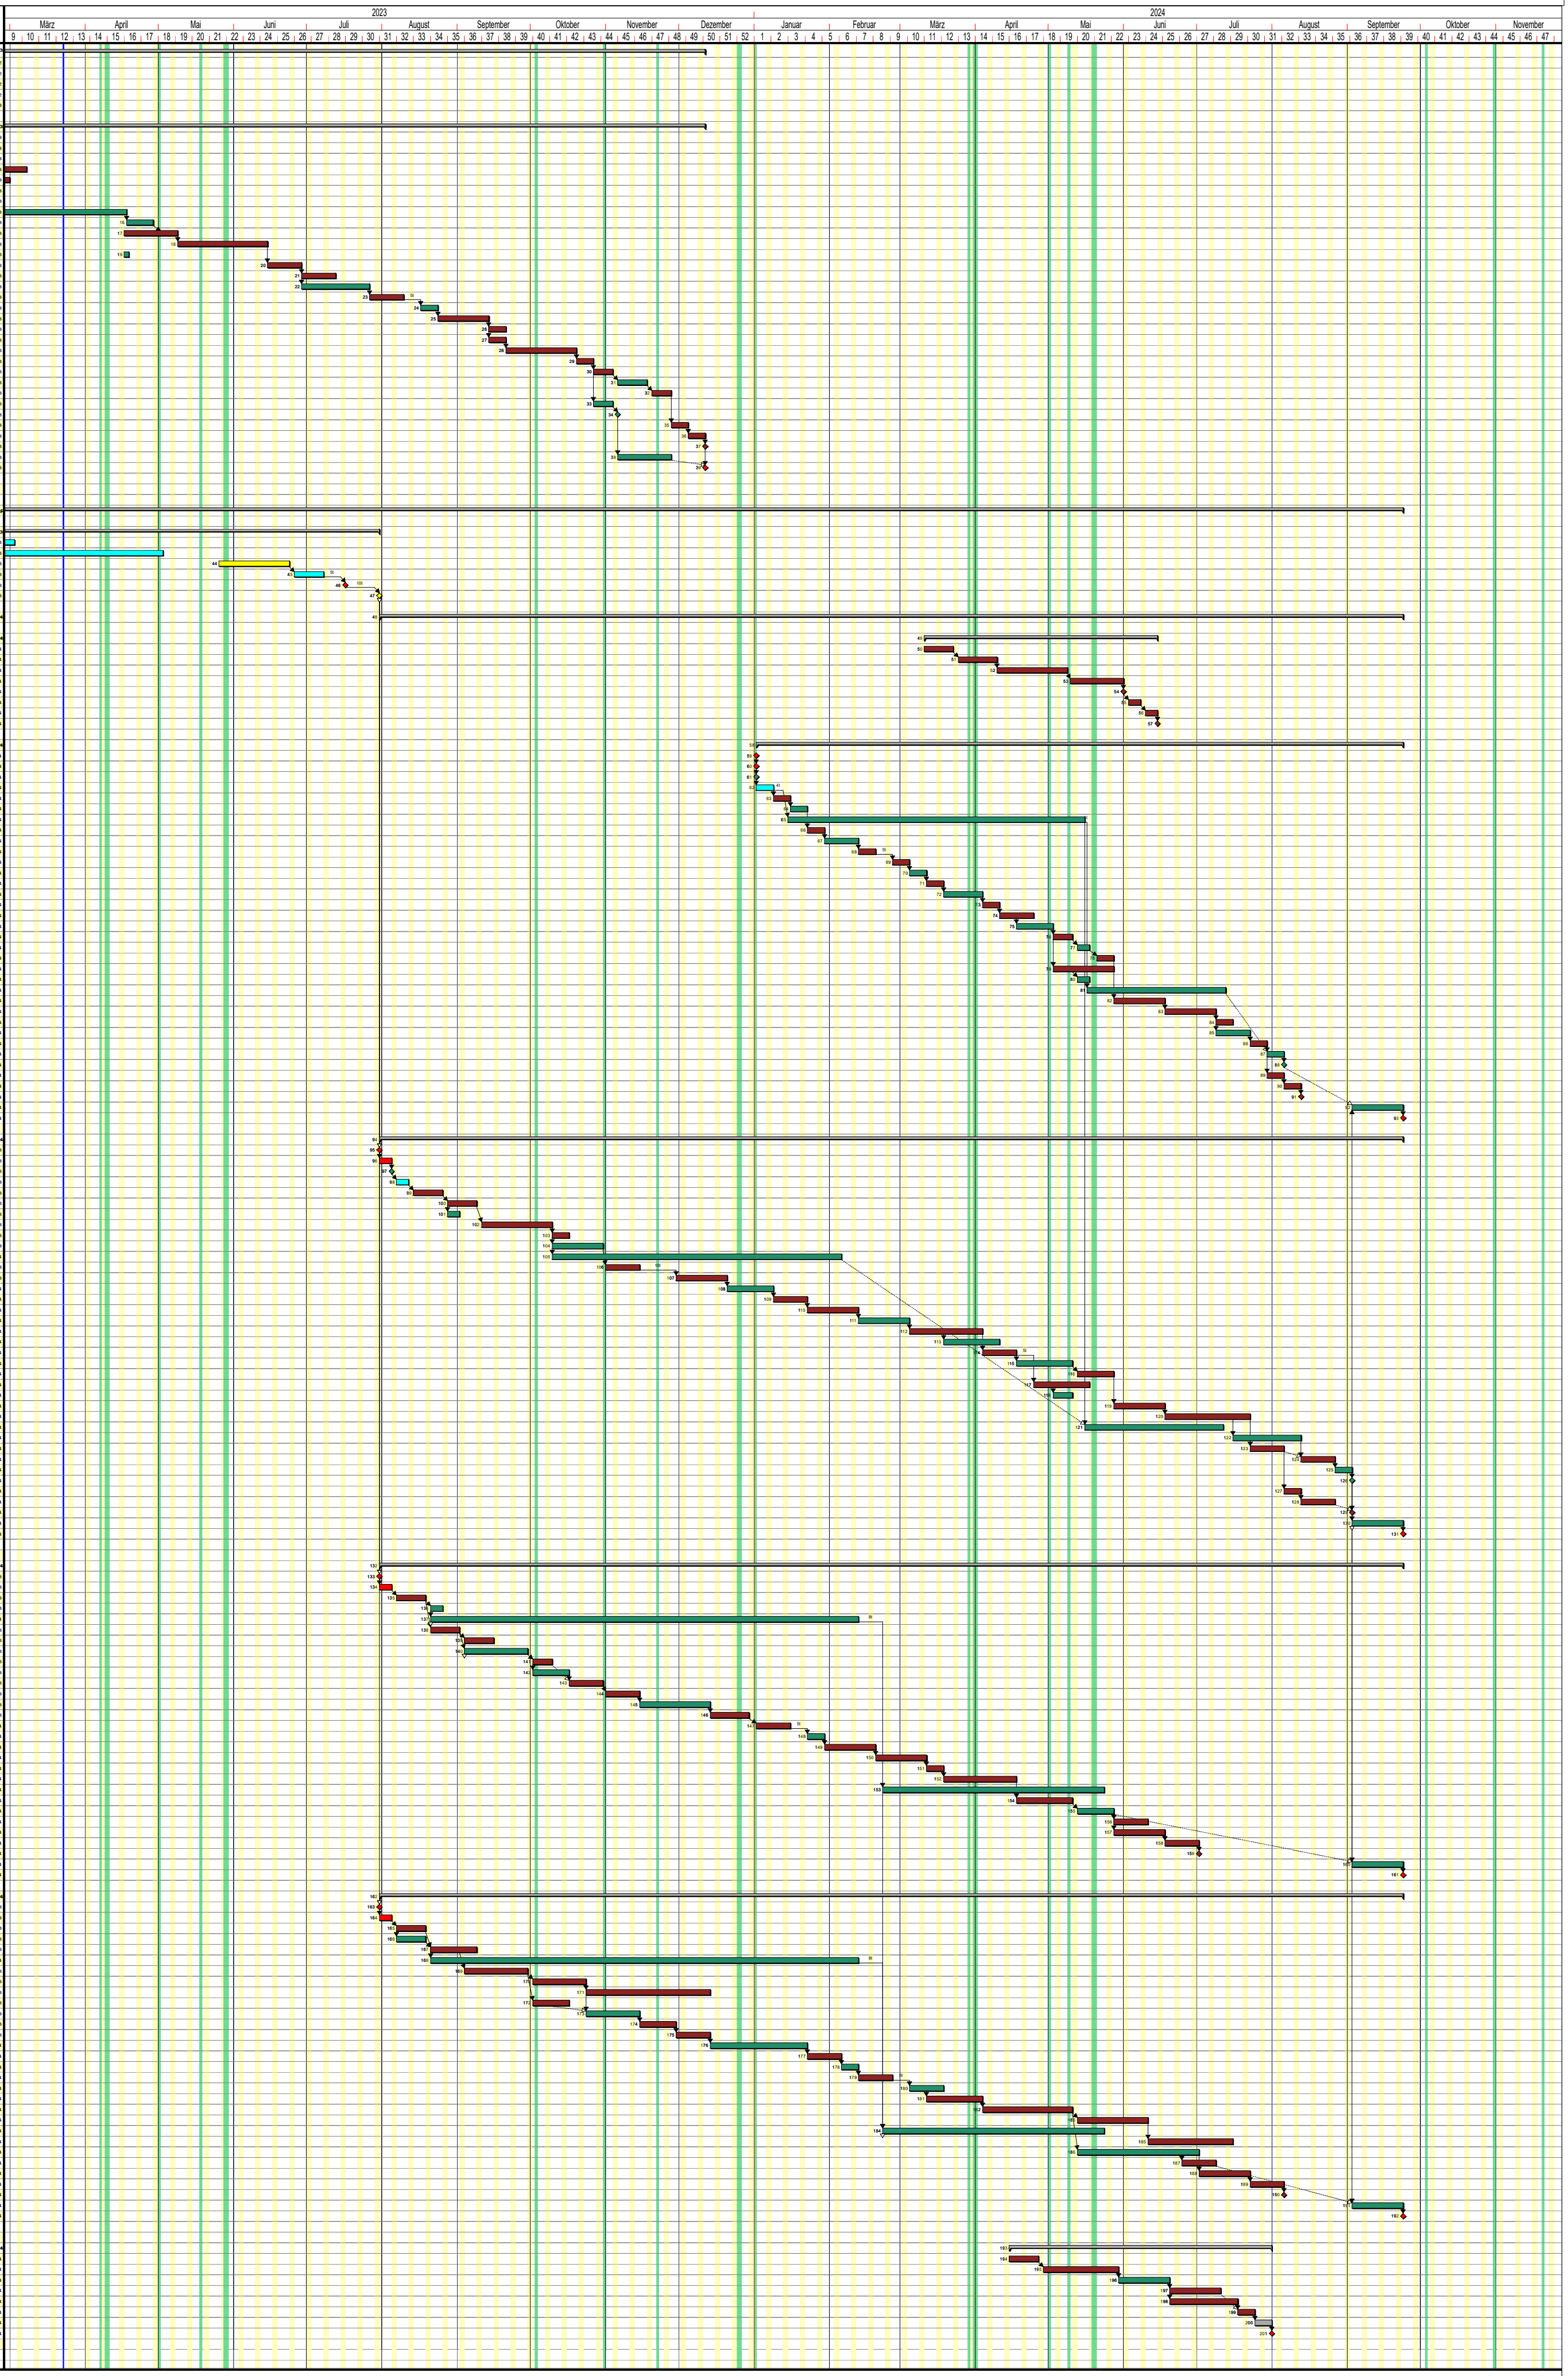

Firmen: Planer, Auftragnehmer, Bauherr, Gebäude, Haustechnik
