Kurmittelhaus Bad Schlema

3. Bauabschnitt

17.09.2024

Michael Gäbler

Nr.	Bezeichnung	Start	Dauer	Ende
1	**Planung**	**09.09.2024**	**170t**	**16.05.2025**
2	**Sauna**	**02.06.2025**	**265t**	**23.06.2026**
3	Betrieb einstellen	02.06.2025		02.06.2025
4	Beräumung	02.06.2025	5t	06.06.2025
5	Baustellenzugang	10.06.2025	5t	16.06.2025
6	Rückbau	10.06.2025	10t	23.06.2025
7	Rückbau HLSE	10.06.2025	15t	30.06.2025
8	Abbruch	24.06.2025	20t	21.07.2025
9	Maurerarbeiten	22.07.2025	10t	04.08.2025
10	HLSE Schacht	22.07.2025	30t	01.09.2025
11	Schacht schließen	02.09.2025	5t	08.09.2025
12	HLSE Unterputz	05.08.2025	15t	25.08.2025
13	Putzarbeiten	26.08.2025	10t	08.09.2025
14	Trockenbau I	09.09.2025	15t	29.09.2025
15	HLSE Rohinstallation	30.09.2025	20t	28.10.2025
16	Trockenbau II	29.10.2025	15t	20.11.2025
17	Entwässerung	21.11.2025	5t	27.11.2025
18	Estrich	28.11.2025	15t	18.12.2025
19	HLSE Feininstallation	30.12.2025	20t	27.01.2026
20	Decke	28.01.2026	15t	17.02.2026
21	Maler	18.02.2026	15t	10.03.2026
22	Abdichtungsarbeiten	18.02.2026	20t	17.03.2026
23	Fliesen	18.03.2026	20t	16.04.2026
24	Einrichtung	17.04.2026	35t	09.06.2026
25	HLSE Fertiginstallation	18.03.2026	30t	30.04.2026
26	Maler II	04.05.2026	10t	18.05.2026
27	Baustellenzugang schließen	19.05.2026	5t	26.05.2026
28	Reinigung	19.05.2026	10t	02.06.2026
29	Probebetrieb	03.06.2026	10t	16.06.2026
30	Abnahmen	19.05.2026	15t	09.06.2026
31	Mängelbeseitigung	10.06.2026	10t	23.06.2026
32	Fertigstellung	23.06.2026		23.06.2026
33	Wasserproben	03.06.2026	15t	23.06.2026
34	Freigabe	23.06.2026		23.06.2026
35	**Wellness**	**02.06.2025**	**105t**	**28.10.2025**
36	Betrieb einstellen	02.06.2025		02.06.2025
37	Beräumung	02.06.2025	5t	06.06.2025
38	Rückbau / Abbruch	10.06.2025	10t	23.06.2025
39	Fenster	24.06.2025	5t	30.06.2025
40	Trockenbau I	01.07.2025	5t	07.07.2025
41	HLSE Rohinstallation	08.07.2025	5t	14.07.2025
42	Trockenbau II	15.07.2025	10t	28.07.2025
43	HLSE Feininstallation	29.07.2025	10t	11.08.2025
44	Maler	12.08.2025	10t	25.08.2025
45	Bodenbelag	26.08.2025	10t	08.09.2025
46	Einrichtung	09.09.2025	5t	15.09.2025
47	HLSE Fertiginstallation	16.09.2025	10t	29.09.2025
48	Reinigung	30.09.2025	5t	07.10.2025
49	Abnahmen	08.10.2025	5t	14.10.2025
50	Mängelbeseitigung	15.10.2025	10t	28.10.2025
51	Fertigstellung	28.10.2025		28.10.2025
52	**Technik 2.UG**	**17.06.2025**	**220t**	**30.04.2026**
53	Technik 2:UG	17.06.2025	160t	03.02.2026
54	Feininstallation Technik 2.UG	04.02.2026	60t	30.04.2026
	Warmwasserbereitung TW+BW			
	Mischwasseranlagen			
	Rohrleitungen tauschen Sanitär			
	MSR/GA tauschen			
	Ertüchtigung Brandschutz			
	Kanalreinigung			
	Feldgeräte HZ tauschen			
55	**Umkleide 2.UG**	**02.06.2025**	**130t**	**04.12.2025**
56	Betrieb einstellen	02.06.2025		02.06.2025
57	Beräumung	02.06.2025	5t	06.06.2025
58	Rückbau Abbruch	10.06.2025	5t	16.06.2025
59	Rückbau HLSE	17.06.2025	5t	23.06.2025
60	Trockenbau I	24.06.2025	10t	07.07.2025
61	HLSE Rohinstallation	08.07.2025	15t	28.07.2025
62	Trockenbau II	29.07.2025	10t	11.08.2025
63	HLSE Feininstallation	12.08.2025	10t	25.08.2025
64	Maler	26.08.2025	5t	01.09.2025
65	Decke	02.09.2025	25t	07.10.2025
66	Einrichtung	08.10.2025	5t	14.10.2025
67	HLSE Fertiginstallation	15.10.2025	10t	28.10.2025
68	Reinigung	29.10.2025	5t	05.11.2025
69	Abnahmen	06.11.2025	10t	20.11.2025
70	Mängelbeseitigung	21.11.2025	10t	04.12.2025
71	Fertigstellung	04.12.2025		04.12.2025
72	Wasserproben	06.11.2025	15t	27.11.2025
73	Freigabe	04.12.2025		04.12.2025
74	**Außensaunen**	**14.07.2025**	**10t**	**25.07.2025**
75	Installation Wasser Außensaunen	14.07.2025	10t	25.07.2025
76	**Therapiebecken 3**	**01.12.2025**	**135t**	**17.06.2026**
77	Betrieb einstellen	01.12.2025		01.12.2025
78	Beräumung	01.12.2025	5t	05.12.2025
79	Rückbau Flur	08.12.2025	5t	12.12.2025
80	Rückbau HLSE	08.12.2025	5t	12.12.2025
81	HLSE Unterputz	15.12.2025	5t	19.12.2025
82	Putzarbeiten	22.12.2025	10t	07.01.2026
83	Trockenbau I	08.01.2026	5t	14.01.2026
84	HLSE Rohinstallation	15.01.2026	10t	28.01.2026
85	Trockenbau II	29.01.2026	10t	11.02.2026
86	Estrich	12.02.2026	10t	25.02.2026
87	HLSE Feininstallation	26.02.2026	10t	11.03.2026
88	Maler	12.03.2026	10t	25.03.2026
89	Decke	26.03.2026	15t	17.04.2026
90	Fliesen	20.04.2026	10t	04.05.2026
91	HLSE Fertiginstallation	05.05.2026	10t	19.05.2026
92	Reinigung	12.05.2026	5t	19.05.2026
93	Abnahmen	20.05.2026	10t	03.06.2026
94	Mängelbeseitigung	04.06.2026	10t	17.06.2026
95	Fertigstellung	17.06.2026		17.06.2026
96	Wasserproben	20.05.2026	15t	10.06.2026
97	Freigabe	17.06.2026		17.06.2026
98	**Therapie EG**	**15.09.2025**	**164t**	**13.05.2026**
99	Rückbau Decken	15.09.2025	10t	26.09.2025
100	Rückbau HLSE	04.11.2025	70t	13.02.2026
101	Trockenbau I	11.11.2025	70t	20.02.2026
102	HLSE Rohinstallation	18.11.2025	70t	27.02.2026
103	Trockenbau II	26.11.2025	70t	06.03.2026
104	Maler	03.12.2025	70t	13.03.2026
105	Decke	10.12.2025	70t	20.03.2026
106	Fliesen	17.12.2025	70t	27.03.2026
107	HLSE Fertiginstallation	24.12.2025	70t	07.04.2026
108	Reinigung	05.01.2026	70t	14.04.2026
109	Probebetrieb	12.01.2026	70t	21.04.2026
110	Abnahmen	19.01.2026	70t	28.04.2026
111	Mängelbeseitigung	26.01.2026	70t	06.05.2026
112	Wasserproben	02.02.2026	70t	13.05.2026
113	**Außenanlagen**	**24.06.2026**	**120t**	**09.12.2026**
114	Rückbau Baustelleneinrichtung	24.06.2026	10t	07.07.2026
115	Erdarbeiten Geländemodellierung	08.07.2026	15t	28.07.2026
116	Grundleitungen / Elektroleitungen	29.07.2026	10t	11.08.2026
117	Oberboden	12.08.2026	10t	25.08.2026
118	Vegetationsarbeiten	26.08.2026	10t	08.09.2026
119	Rückbau Zufahrtsstraße	09.09.2026	15t	29.09.2026
120	Borde	30.09.2026	15t	20.10.2026
121	Pflasterarbeiten Zufahrtsstraße	21.10.2026	20t	17.11.2026
122	Abnahmen	19.11.2026	5t	25.11.2026
123	Mängelbeseitigung	26.11.2026	10t	09.12.2026
124	Fertigstellung	09.12.2026		09.12.2026

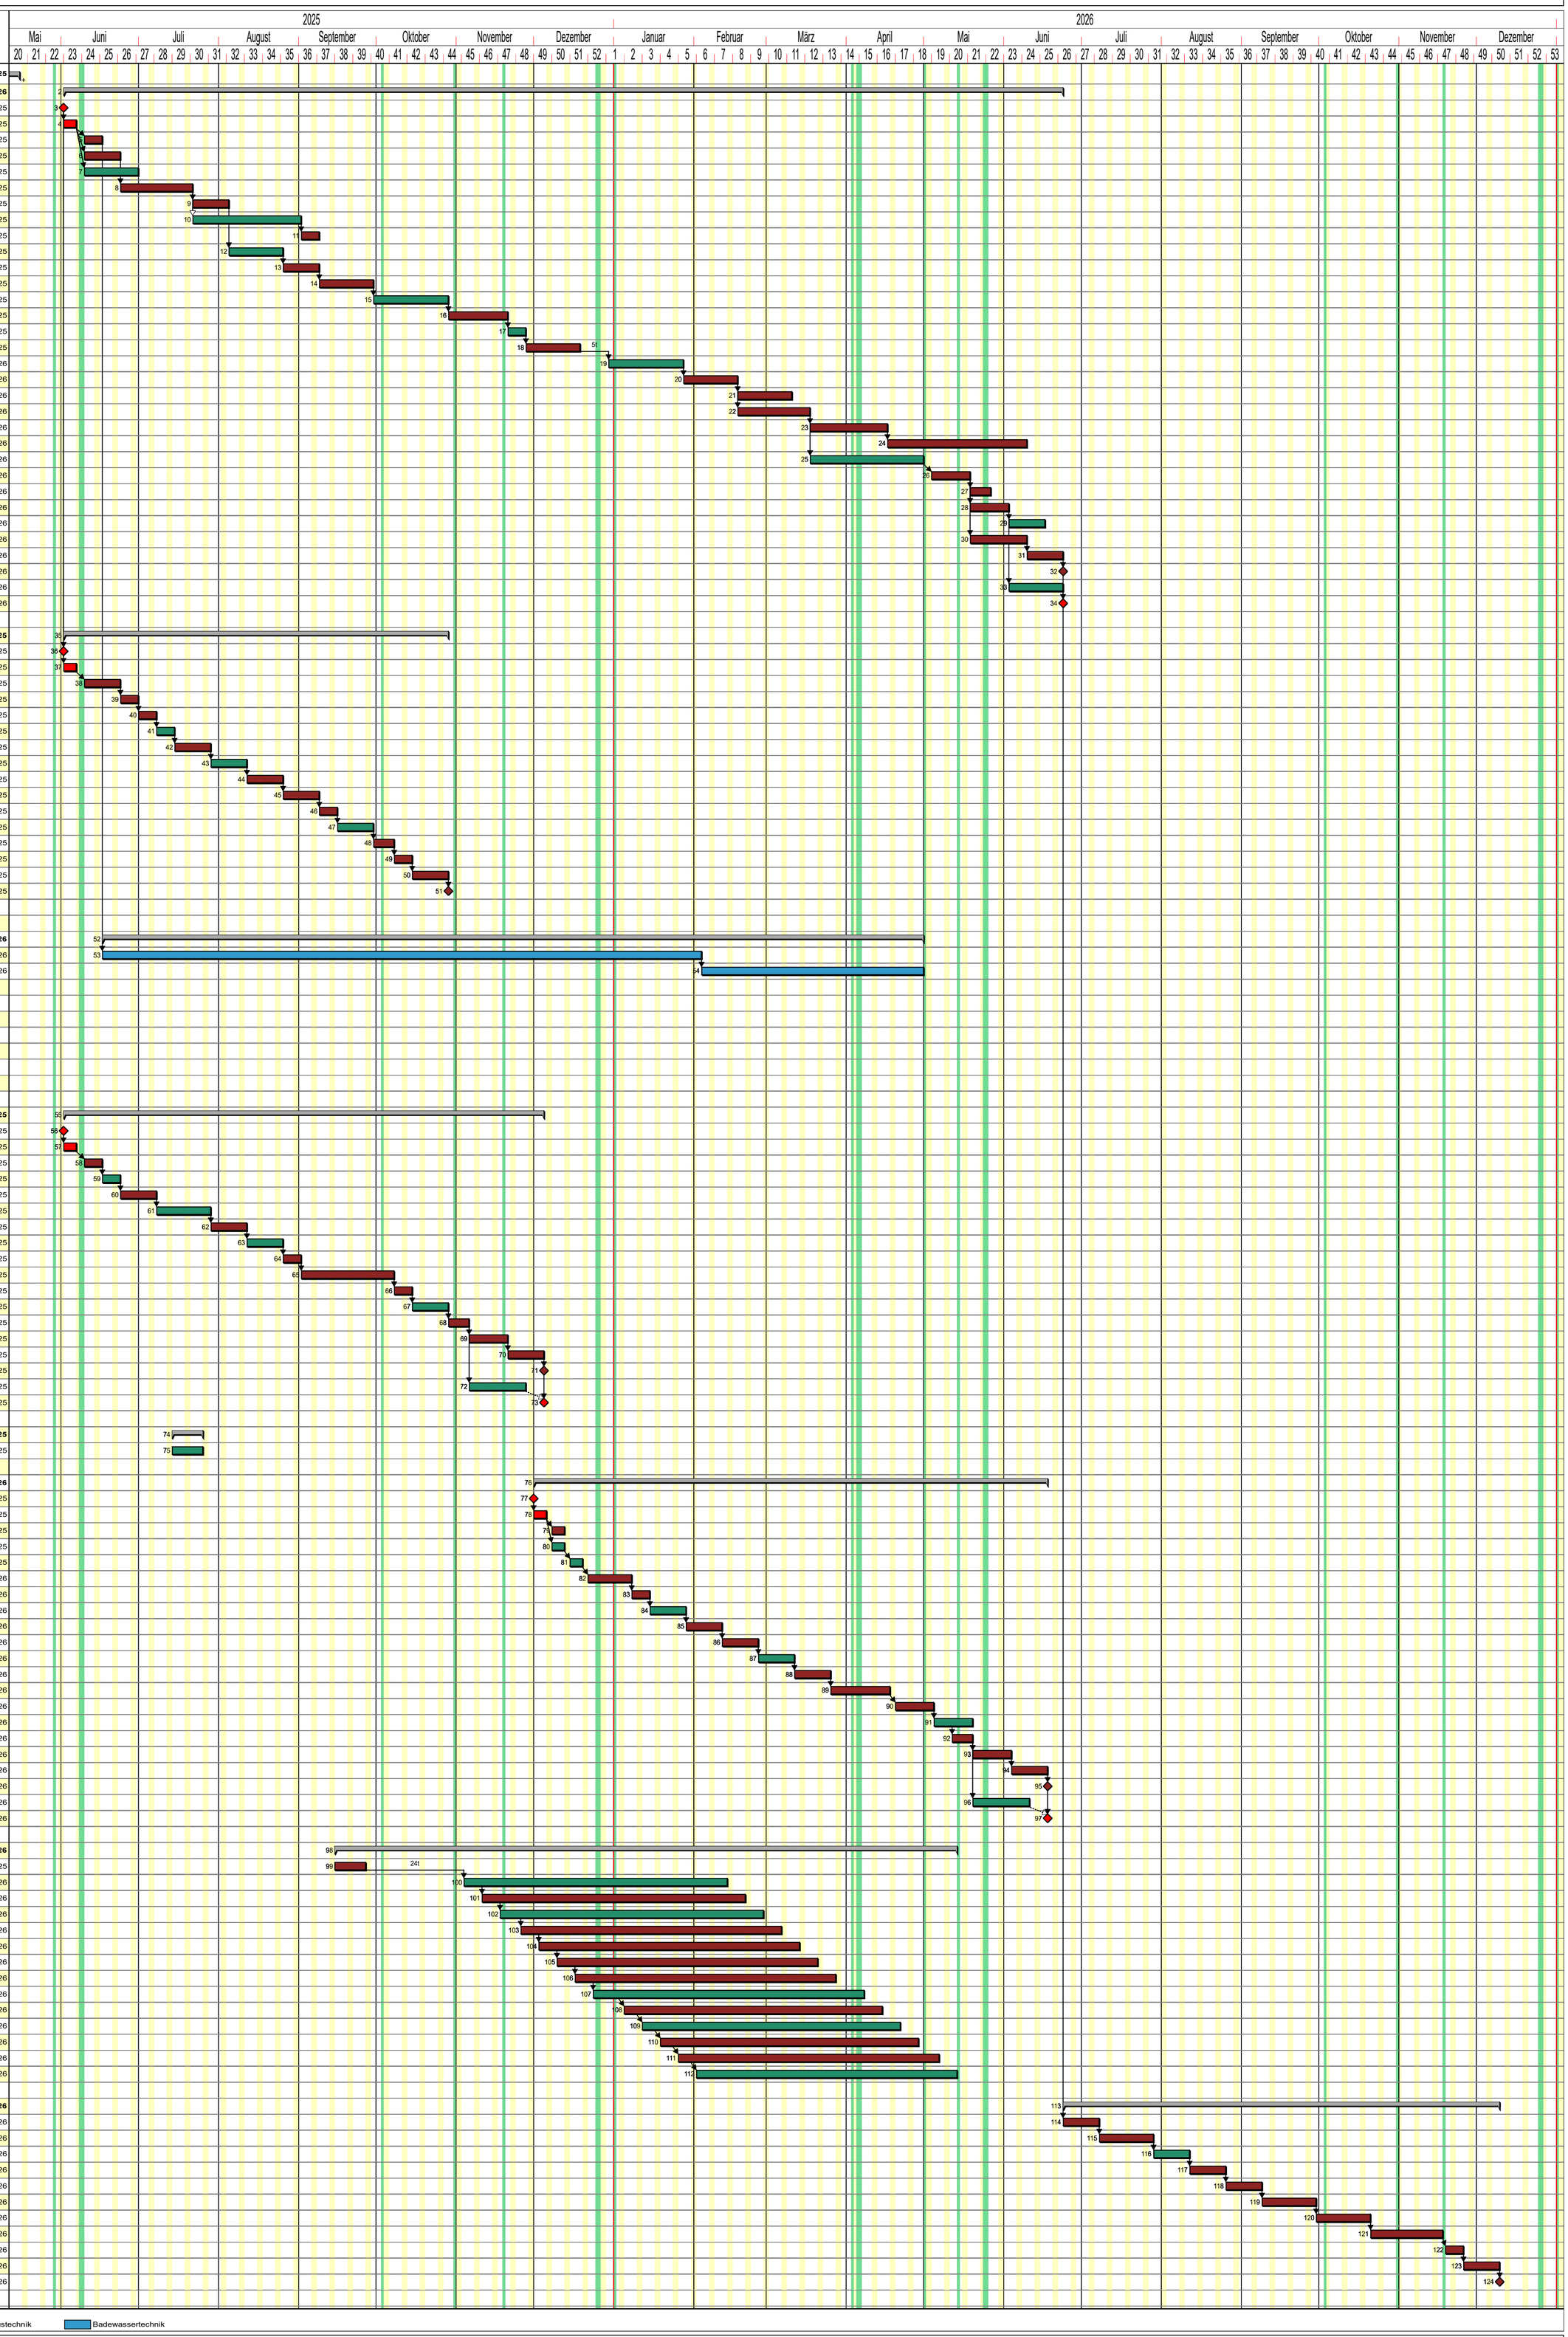

Firmen
Bauherr | Gebäude | Haustechnik | Badewassertechnik

Projektdatei: L:\1 Projektverwaltung\201817 Bad Schlema Modernisierung Kurmittelhaus\07 Termine\Rahmenterminplan 3.BA_2024-09-17.pp

Asta Powerproject
