Neubau eines Feuerwehrhauses für die FF Lütau

Ausführungsphase_Bauzeit

21.10.2024 | Gemeinde Lütau,-Der Bürgermeister-, c/o Amt Lütau, Planung, Bauberatung, Klimaschutz, Amtsplatz 1, 21481 Lauenburg | K.- A. Samsz

Nr.	Bezeichnung	Start	Dauer	Ende
1	Abrucharbeiten	13.01.2025	20t	07.02.2025
2	Verfüllen der Baugrube	10.02.2025	10t	21.02.2025
3	Entwässerungskanalarbeiten (Grundleitung unter Gebäude)	24.02.2025	10t	07.03.2025
4	Entwässerungskanalarbeiten außerhalb Gebäude	10.03.2025	25t	11.04.2025
5	Fundamente/Bodenplatte	10.03.2025	25t	11.04.2025
6	Blitzschutz	24.03.2025	10t	14.11.2025
7	Rohbauarbeiten	14.04.2025	155t	14.11.2025
8	Zimmer- und Holzbauarbeiten	01.09.2025	25t	03.10.2025
9	Dachdeckungs-, Dachabdichtungs-, Abdichtungs- und Klempnerarbeiten	06.10.2025	25t	07.11.2025
10	Metallbauarbeiten	03.11.2025	20t	28.11.2025
11	Fassadenarbeiten	01.12.2025	10t	12.12.2025
12	Elektroinst_Photovoltaik_Dach	01.12.2025	10t	12.12.2025
13	Elektroinstallationen (Rohmontage)	01.12.2025	15t	19.12.2025
14	RLT (Rohmontage)	01.12.2025	15t	19.12.2025
15	Tischler Innentür Zargen	05.01.2026	10t	16.01.2026
16	Trockenbau Trennwände,Wärmedämmarbeiten	19.01.2026	20t	13.02.2026
17	Weihnachtspause	22.12.2025	10t	02.01.2026
18	Putz- und Stuckarbeiten	16.02.2026	20t	13.03.2026
19	Sanitärinstallationen (Rohmontage)	16.03.2026	25t	17.04.2026
20	Heizungsinstallationen(Rohmontage)	30.03.2026	20t	24.04.2026
21	Estricharbeiten	27.04.2026	10t	08.05.2026
22	Trocknungszeit mit Aufheizzeit	11.05.2026	30t	19.06.2026
23	Platten- und Fliesenarbeiten	01.06.2026	30t	10.07.2026
24	Aufzugsmontage	06.07.2026	10t	17.07.2026
25	Maler- und Tapezierarbeiten	06.07.2026	20t	31.07.2026
26	Trockenbau, Decken und Akustik	27.07.2026	15t	14.08.2026
27	RLT Endmontage etc.	10.08.2026	10t	21.08.2026
28	Bodenbelagsarbeiten	17.08.2026	10t	28.08.2026
29	Elektroinstallationen (Endmontage)	31.08.2026	9t	10.09.2026
30	Heizungsinstallatioen (Endmontage)	31.08.2026	10t	11.09.2026
31	Sanitäre Installationen (Endmontage)	31.08.2026	15t	18.09.2026
32	Tischler Innentüren	21.09.2026	10t	02.10.2026
33	Gebäudereinigungsarbeiten	05.10.2026	5t	09.10.2026
34	Außenanlagen	31.08.2026	30t	09.10.2026

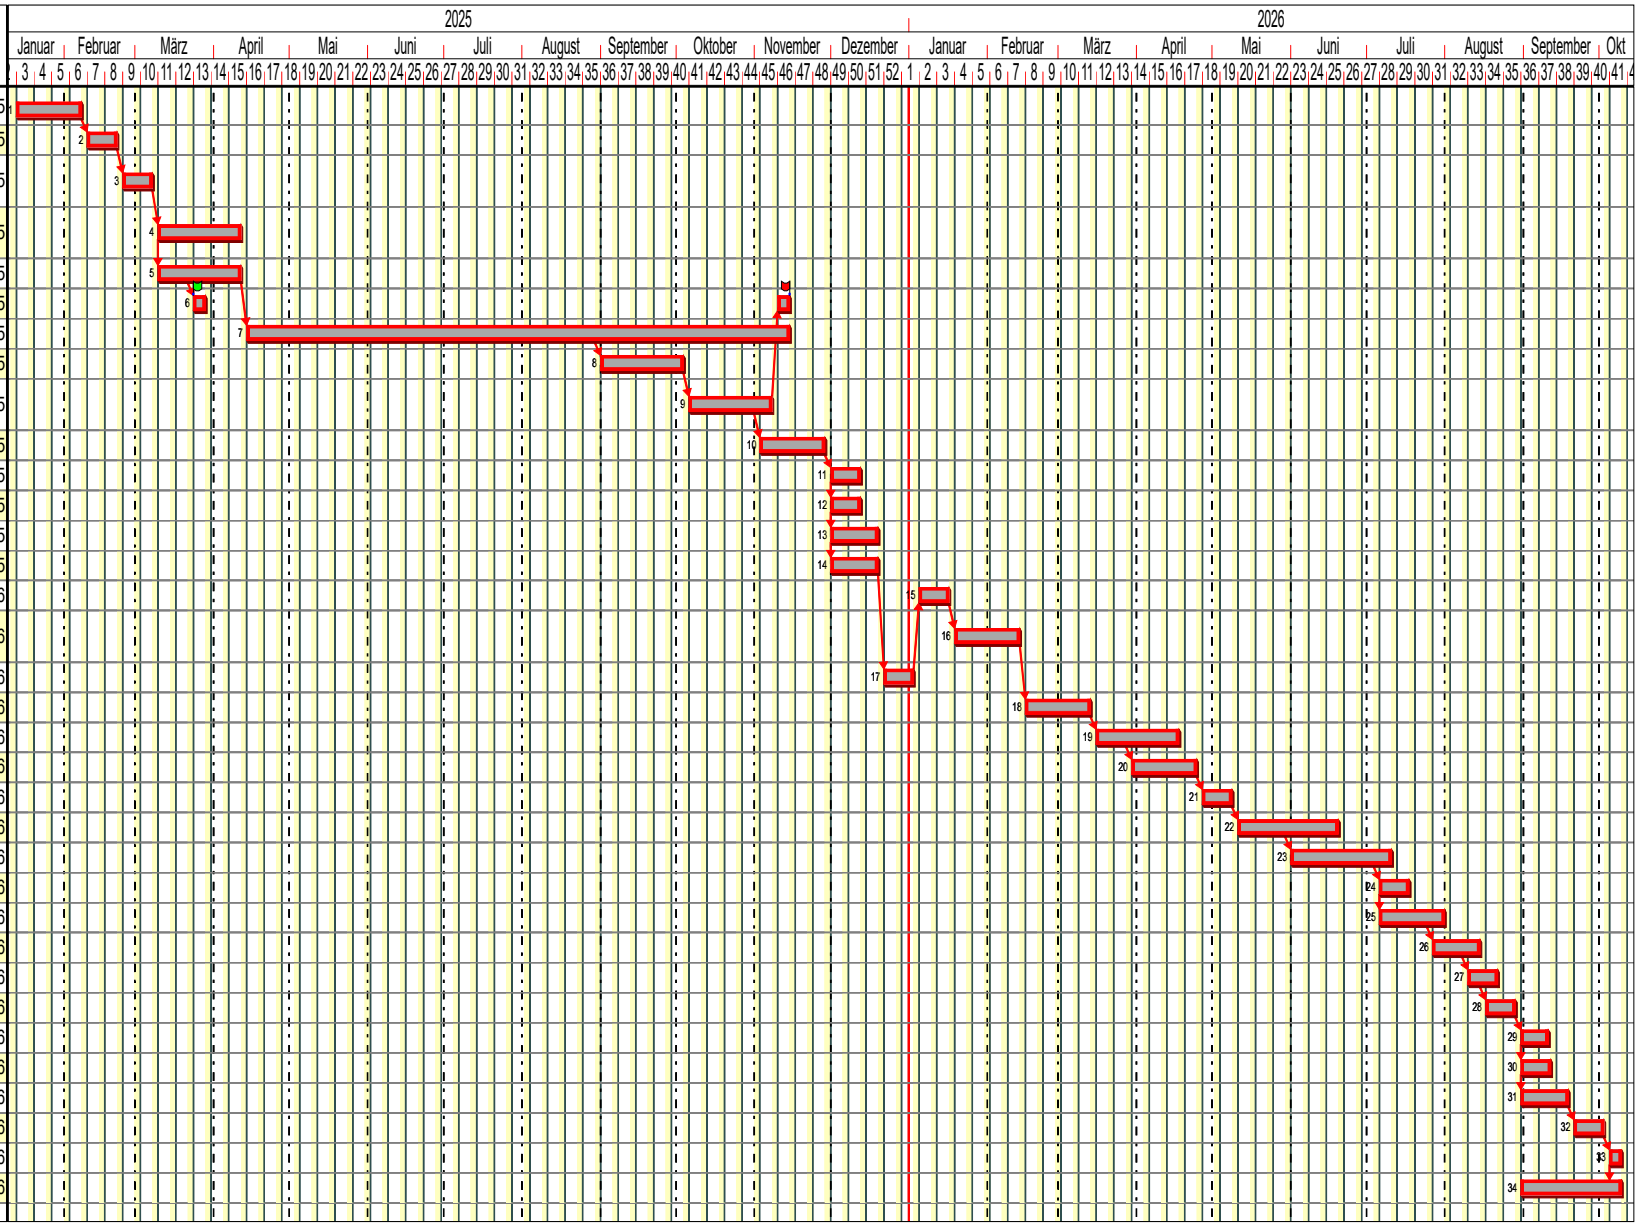

Projektdatei: C:\Users\kas\Documents\Asta Powerproject\Projekte\IFC-Beispiele\S-19-06 NB FF Lütau 2024-10-21_2.pp

Powerproject
