


- Temporäre Beschilderung
- Stationäre Beschilderung
- stationäre Beschilderung während der Bauzeit abdecken
- Zonen für Haltverbote (V.83/V.26) inkl. 1-2 Zusatzzeichen 3 volle Tage vor Baubeginn stellen
- Schienersatzverkehr (SEV) / Bus
- Baufeld-/ Verkehrsicherungsbereiche (die auszuführenden Bauleistungen und deren zeitliche Abfolge sind den Bauphasenplänen und dem Grobbauplan zu entnehmen)
- temporäre Befestigungen auf Grünflächen, im Gleisbereich etc.
- Wanderbaustelle für Arbeiten an den Schächten/Leuchte etc. im Verkehrsbereich - Länge zwischen 5,0m -max.10,0 m; Durchfahrtsbreite von min. 3,0 m muss stets gewährleistet werden.

Dem Fußgänger/ Radfahrerverkehr ist, sofern nicht anders ausgewiesen, eine mind. 1,5m breite, gesicherte, behindertengerechte befestigte Trasse zum Queren des Baufeldes vorzuhalten. Vorh. Grünstreifen im Queringebereich sind ebenfalls temp. zu befestigen. An den Bordkanten sind entspr. Anrampung vorzusehen. Die Querung über offene Leistungsgräben ist sicherzustellen (z.B. Fußgängerbrücke, Überfahrplatten- rutschfest!). Die Lage der kann in Abhängigkeit vom Baufortschritt variieren.



Das Erreichen der Grundstücke mit Kraftfahrzeugen ist außerhalb von Zeiten der Bautätigkeit (abends, nachts und an den Wochenenden) im Rahmen des Baufortschritts zu ermöglichen.

Für Rettungsfahrzeuge ist stets eine mindestens 3,00 m breite , befestigte und gesicherte Trasse im Bereich der Baufelder vorzuhalten. Kopfächer/ Gräben müssen ggf. unverzüglich mit Stahlplatten/ Überfahrplatten abzudecken sein. Entsprechendes Gerät ist ständig vorzuhalten. Im Bereich der Fahrgasse dürfen keine Materialien gelagert oder Baufahrzeuge abgestellt sein. In Zeiten der Bauruhe ist die Trasse so aufzubereiten das Fahrzeuge (bis ca. 16t) diese befahren können. Die Fahrgasse ist mit Baken (V605-42/43) in einem Abstand von ca. 5,0 m abzusichern! Dies gilt auch für notwendige Fahrgassen und Überfahrten durch den SEV/Bus!




Plan dient nur zu Kalkulationszwecken!

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name
	bearbeitet	05.11.24	HMa
Blattgröße:		900 x 420 mm	


Bauherr: Stadt Leipzig
Bauvorhaben: Prager Straße zwischen An der Tabaksmühle und Friedhofsgärtnerei (P.-Nr. 90617)
Ausschreibungsunterlage: Verkehrsführung während der Bauzeit
Verkehrsführungsphase 1A: geplanter Zeitraum: 14.04.25-24.06.25
Baubereich Detailplan 1

Maßstab: 1:500
Unterlage/ Blatt-Nr.: VF1A-D 01

Kartengrundlage: DGSK 1:1000 © Stadt Leipzig [06/2023] und Entwurfsvermessung [09/2023]

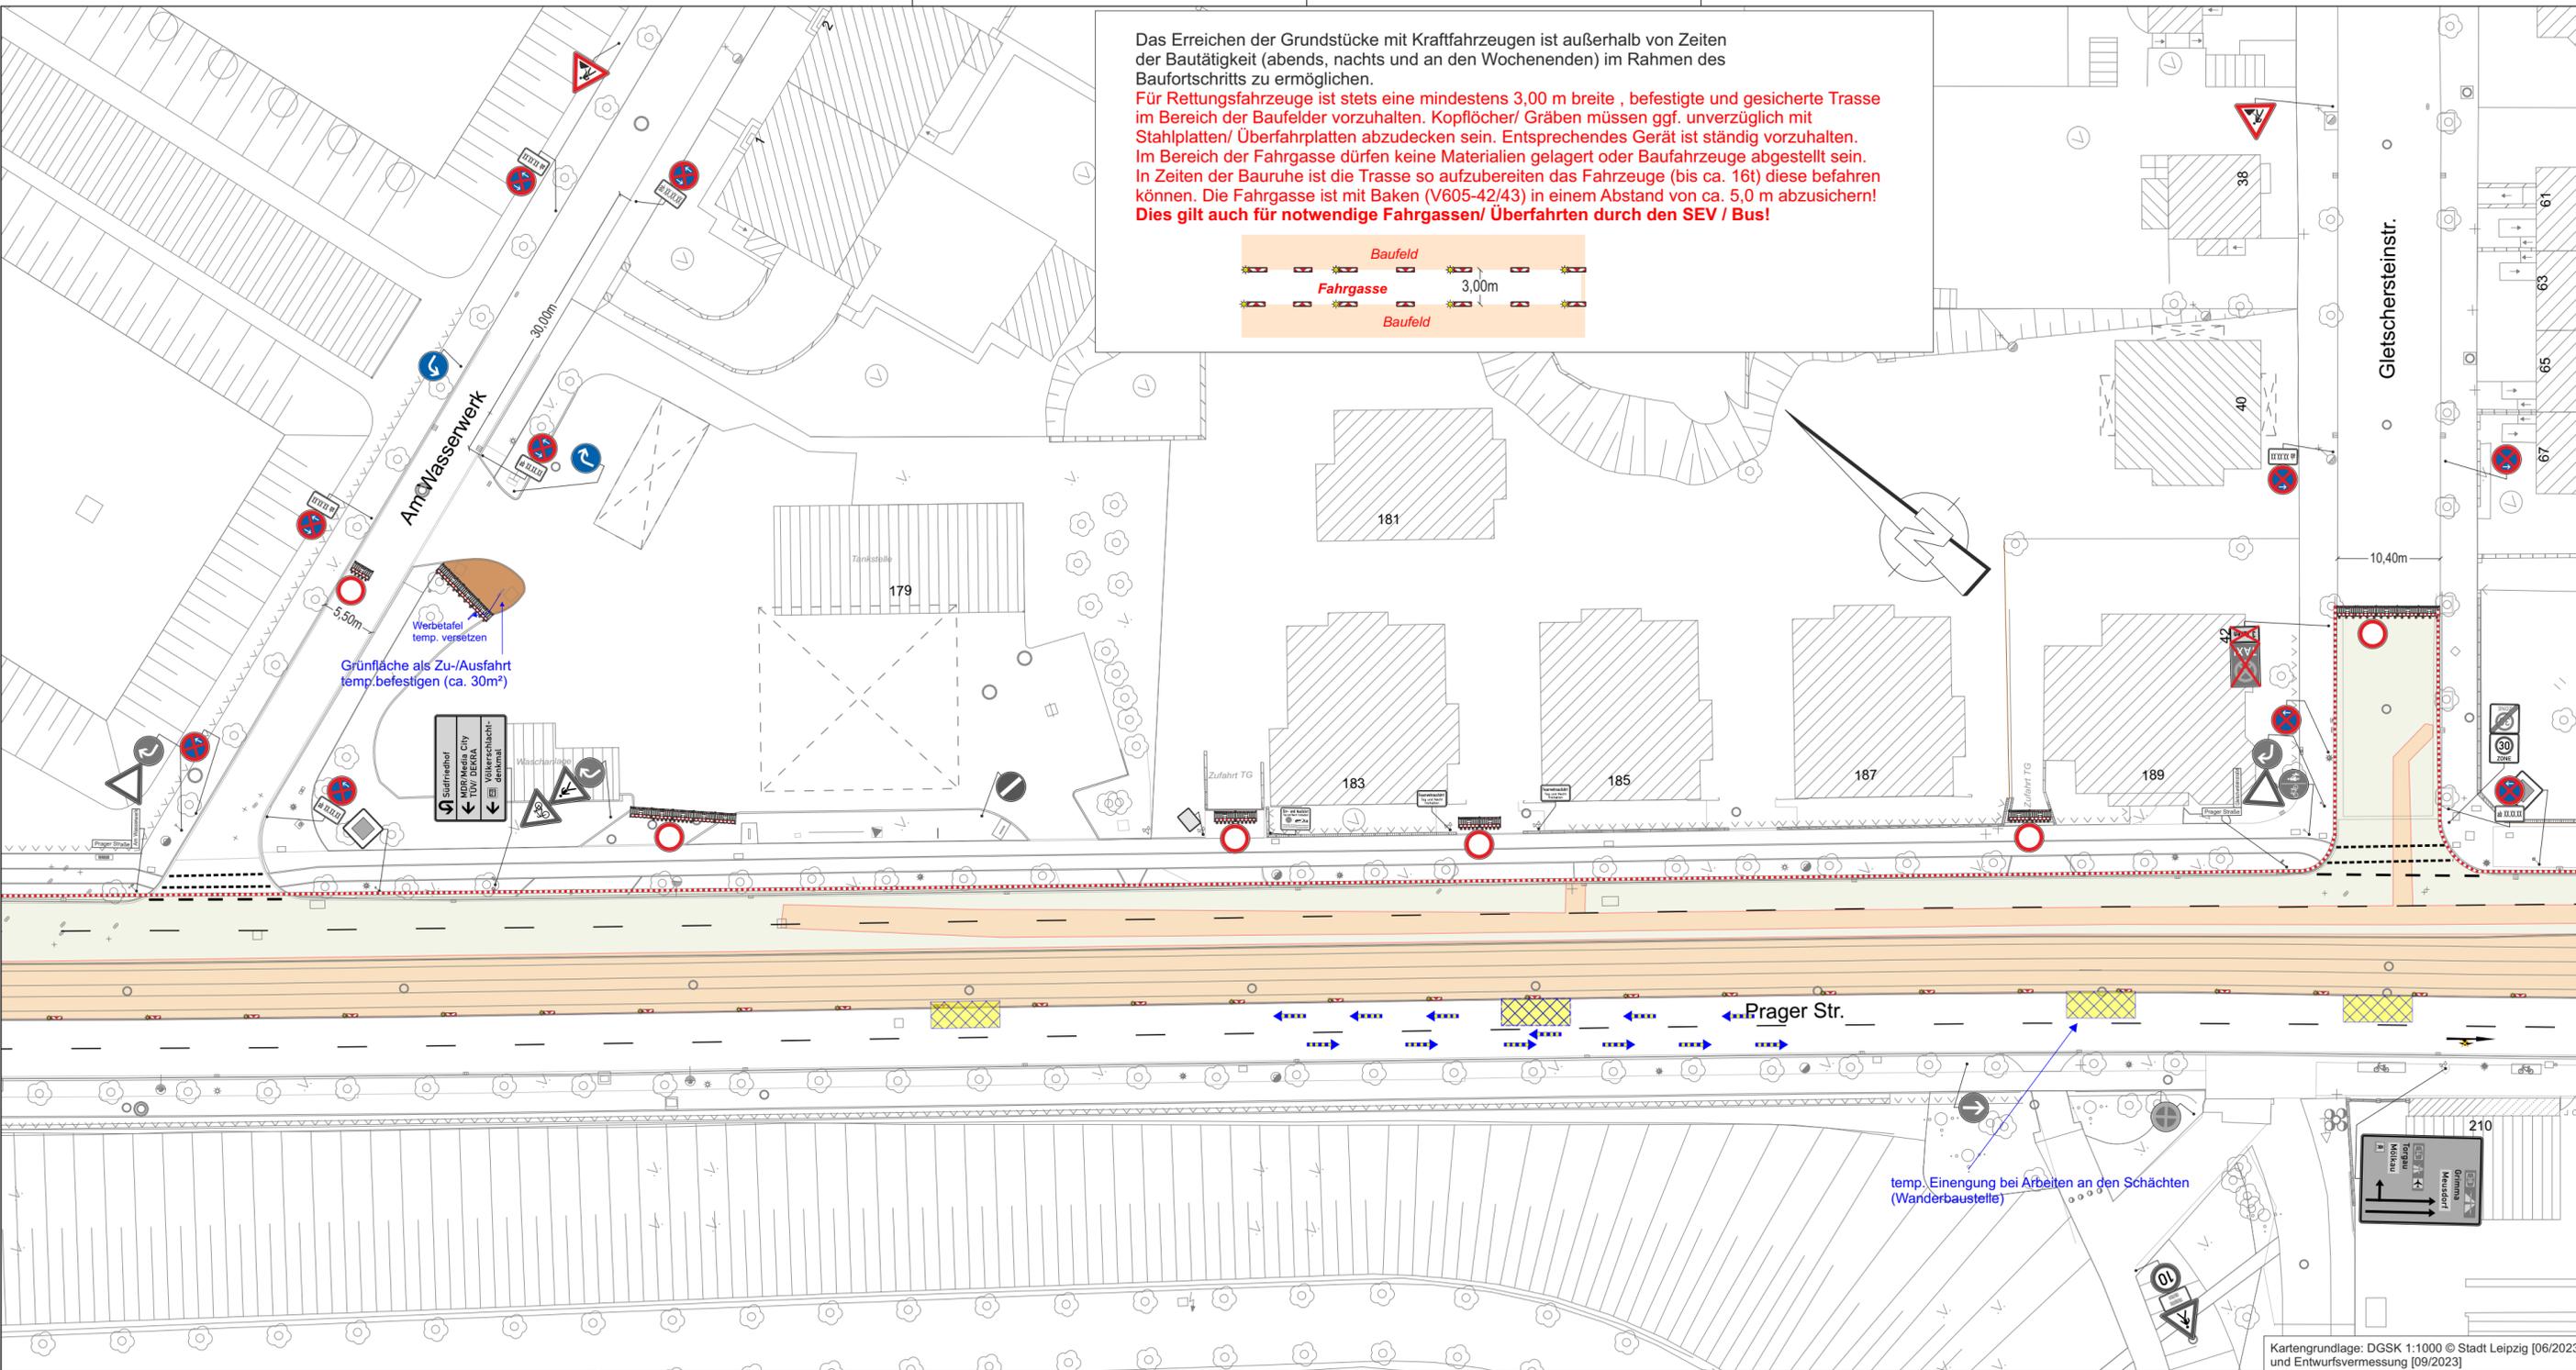

Das Erreichen der Grundstücke mit Kraftfahrzeugen ist außerhalb von Zeiten der Bautätigkeit (abends, nachts und an den Wochenenden) im Rahmen des Baufortschritts zu ermöglichen.
 Für Rettungsfahrzeuge ist stets eine mindestens 3,00 m breite , befestigte und gesicherte Trasse im Bereich der Baufelder vorzuhalten. Kopflöcher/ Gräben müssen ggf. unverzüglich mit Stahlplatten/ Überfahrplatten abzudecken sein. Entsprechendes Gerät ist ständig vorzuhalten. Im Bereich der Fahrgasse dürfen keine Materialien gelagert oder Baufahrzeuge abgestellt sein. In Zeiten der Bauruhe ist die Trasse so aufzubereiten das Fahrzeuge (bis ca. 16t) diese befahren können. Die Fahrgasse ist mit Baken (V605-42/43) in einem Abstand von ca. 5,0 m abzusichern! **Dies gilt auch für notwendige Fahrgassen/ Überfahrten durch den SEV / Bus!**



- Temporäre Beschilderung
- Stationäre Beschilderung
- stationäre Beschilderung während der Bauzeit abdecken
- Zonen für Haltverbote
Haltverbote (V.83/V.26) inkl. 1-2 Zusatzzeichen
3 volle Tage vor Baubeginn stellen
- Schienersatzverkehr (SEV) / Bus
- Baufeld-/ Verkehrsicherungsbereiche
(die auszuführenden Bauleistungen und deren zeitliche Abfolge sind den Bauphasenplänen und dem Grobablaufplan zu entnehmen)
- temporäre Befestigungen auf Grünflächen, im Gleisbereich etc.
- Wanderbaustelle für Arbeiten an den Schächten/Leuchte etc.
im Verkehrsbereich - Länge zwischen 5,0m - max.10,0 m;
Durchfahrtsbreite von min. 3,0 m muss stets gewährleistet werden.

Plan dient nur zu Kalkulationszwecken!

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name
		05.11.24	HMa

Blattgröße: 730 x 297 mm

Leipziger Verkehrsbetriebe
LVB GmbH
Georgiring 3 | 04103 Leipzig

Stadt Leipzig
Mobilitäts- und Tiefbauamt
Prager Straße 118-136 | 04317 Leipzig

Bauherr: **Stadt Leipzig**

Bauvorhaben: **Prager Straße**
zwischen An der Tabakmühle und Friedhofsgärtnerei
(P.-Nr. 90617)

Ausschreibungsunterlage: **Verkehrsführung während der Bauzeit**


Verkehrsführungsphase **1A** geplanter Zeitraum: 14.04.25-24.06.25

Baubereich Detailplan 2



Maßstab: **1:500**
Unterlage/ Blatt-Nr.: **VF1A-D02**

Kartengrundlage: DGSK 1:1000 © Stadt Leipzig [06/2023] und Entwurfsvermessung [09/2023]

Dem Fußgänger./ Radfahrerverkehr ist, sofern nicht anders ausgewiesen, eine mind. 1,5m breite, gesicherte, behindertengerechte befestigte Trasse zum Queren des Baufeldes vorzuhalten.
Vorh. Grünstreifen im Querungsbereich sind ebenfalls temp. zu befestigen. An den Bordkanten sind entspr. Anrampungen vorzusehen. Die Querung über offene Leistungsrinnen ist sicherzustellen (z.B. Fußgängerbrücke, Überfahrplatten- rutschfest!). Die Lage der kann in Abhängigkeit vom Baufortschritt variieren.



Das Erreichen der Grundstücke mit Kraftfahrzeugen ist außerhalb von Zeiten der Bautätigkeit (abends, nachts und an den Wochenenden) im Rahmen des Baufortschritts zu ermöglichen.
Für Rettungsfahrzeuge ist stets eine mindestens 3,00 m breite , befestigte und gesicherte Trasse im Bereich der Baufelder vorzuhalten. Kopfflächen/ Gräben müssen ggf. unverzüglich mit Stahlplatten/ Überfahrplatten abzudecken sein. Entsprechendes Gerät ist ständig vorzuhalten. Im Bereich der Fahrgasse dürfen keine Materialien gelagert oder Baufahrzeuge abgestellt sein. In Zeiten der Bauruhe ist die Trasse so aufzubereiten das Fahrzeuge (bis ca. 16t) diese befahren können. Die Fahrgasse ist mit Baken (V605-42/43) in einem Abstand von ca. 5,0 m abzusichern! Dies gilt auch für notwendige Fahrgassen/ Überfahrten durch den SEV / Bus!

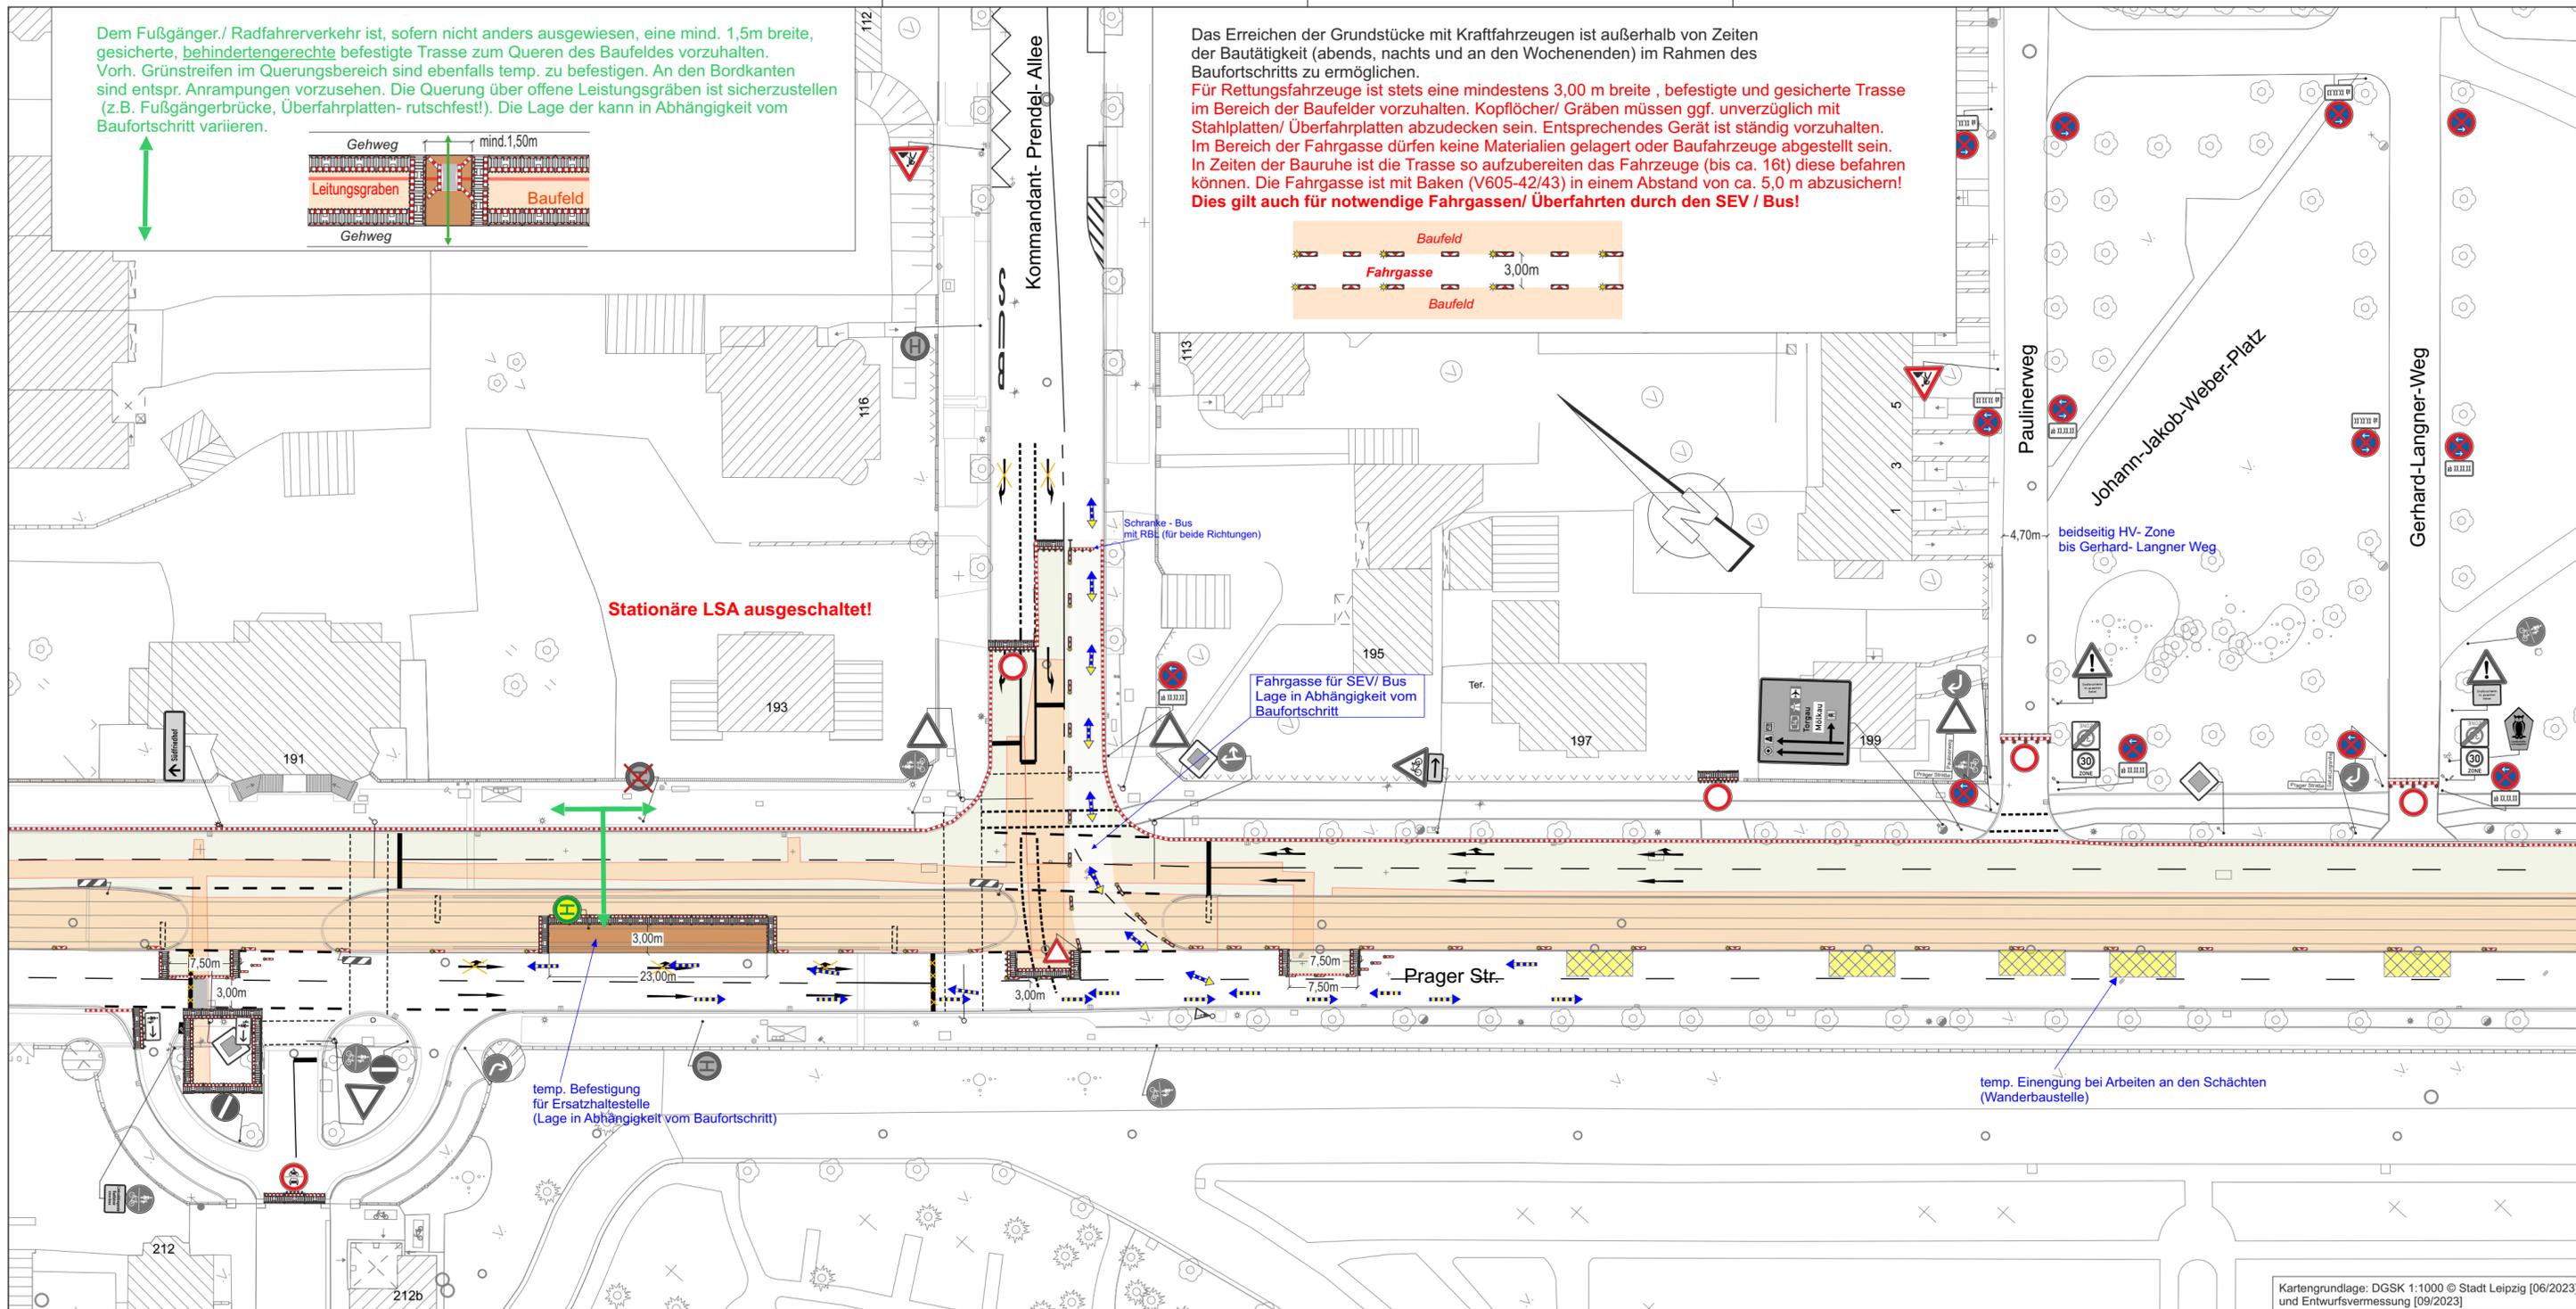


- Temporäre Beschilderung
- Stationäre Beschilderung
- stationäre Beschilderung während der Bauzeit abdecken
- Zonen für Haltverbote
Haltverbote (V.83/V.26) inkl. 1-2 Zusatzzeichen
3 volle Tage vor Baubeginn stellen
- Schienersatzverkehr (SEV) / Bus
- Baufeld-/ Verkehrssicherungsbereiche
(die auszuführenden Bauleistungen und deren zeitliche Abfolge sind den Bauphasenplänen und dem Grobbauplan zu entnehmen)
- temporäre Befestigungen auf Grünflächen, im Gleisbereich etc.
- Wanderbaustelle für Arbeiten an den Schächten/Leuchte etc.
im Verkehrsbereich - Länge zwischen 5,0m - max.10,0 m;
Durchfahrtsbreite von min. 3,0 m muss stets gewährleistet werden.

Plan dient nur zu Kalkulationszwecken!


Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

Bauherr:		Stadt Leipzig Mobilitäts- und Tiefbauamt Prager Straße 118-136 04317 Leipzig	
Prager Straße zwischen An der Tabakmühle und Friedhofsgärtnerei (P.-Nr. 90617)			
Bauvorhaben:		Ausschreibungsunterlage: Verkehrsführung während der Bauzeit	
Verkehrsführungsphase 1A		geplanter Zeitraum: 14.04.25-24.06.25	
Baubereich Detailplan 3		Maßstab: 1:500 Unterlage/ Blatt-Nr.: VF1A-D 03	

Kartengrundlage: DGSK 1:1000 © Stadt Leipzig [06/2023] und Entwurfsvermessung [09/2023]

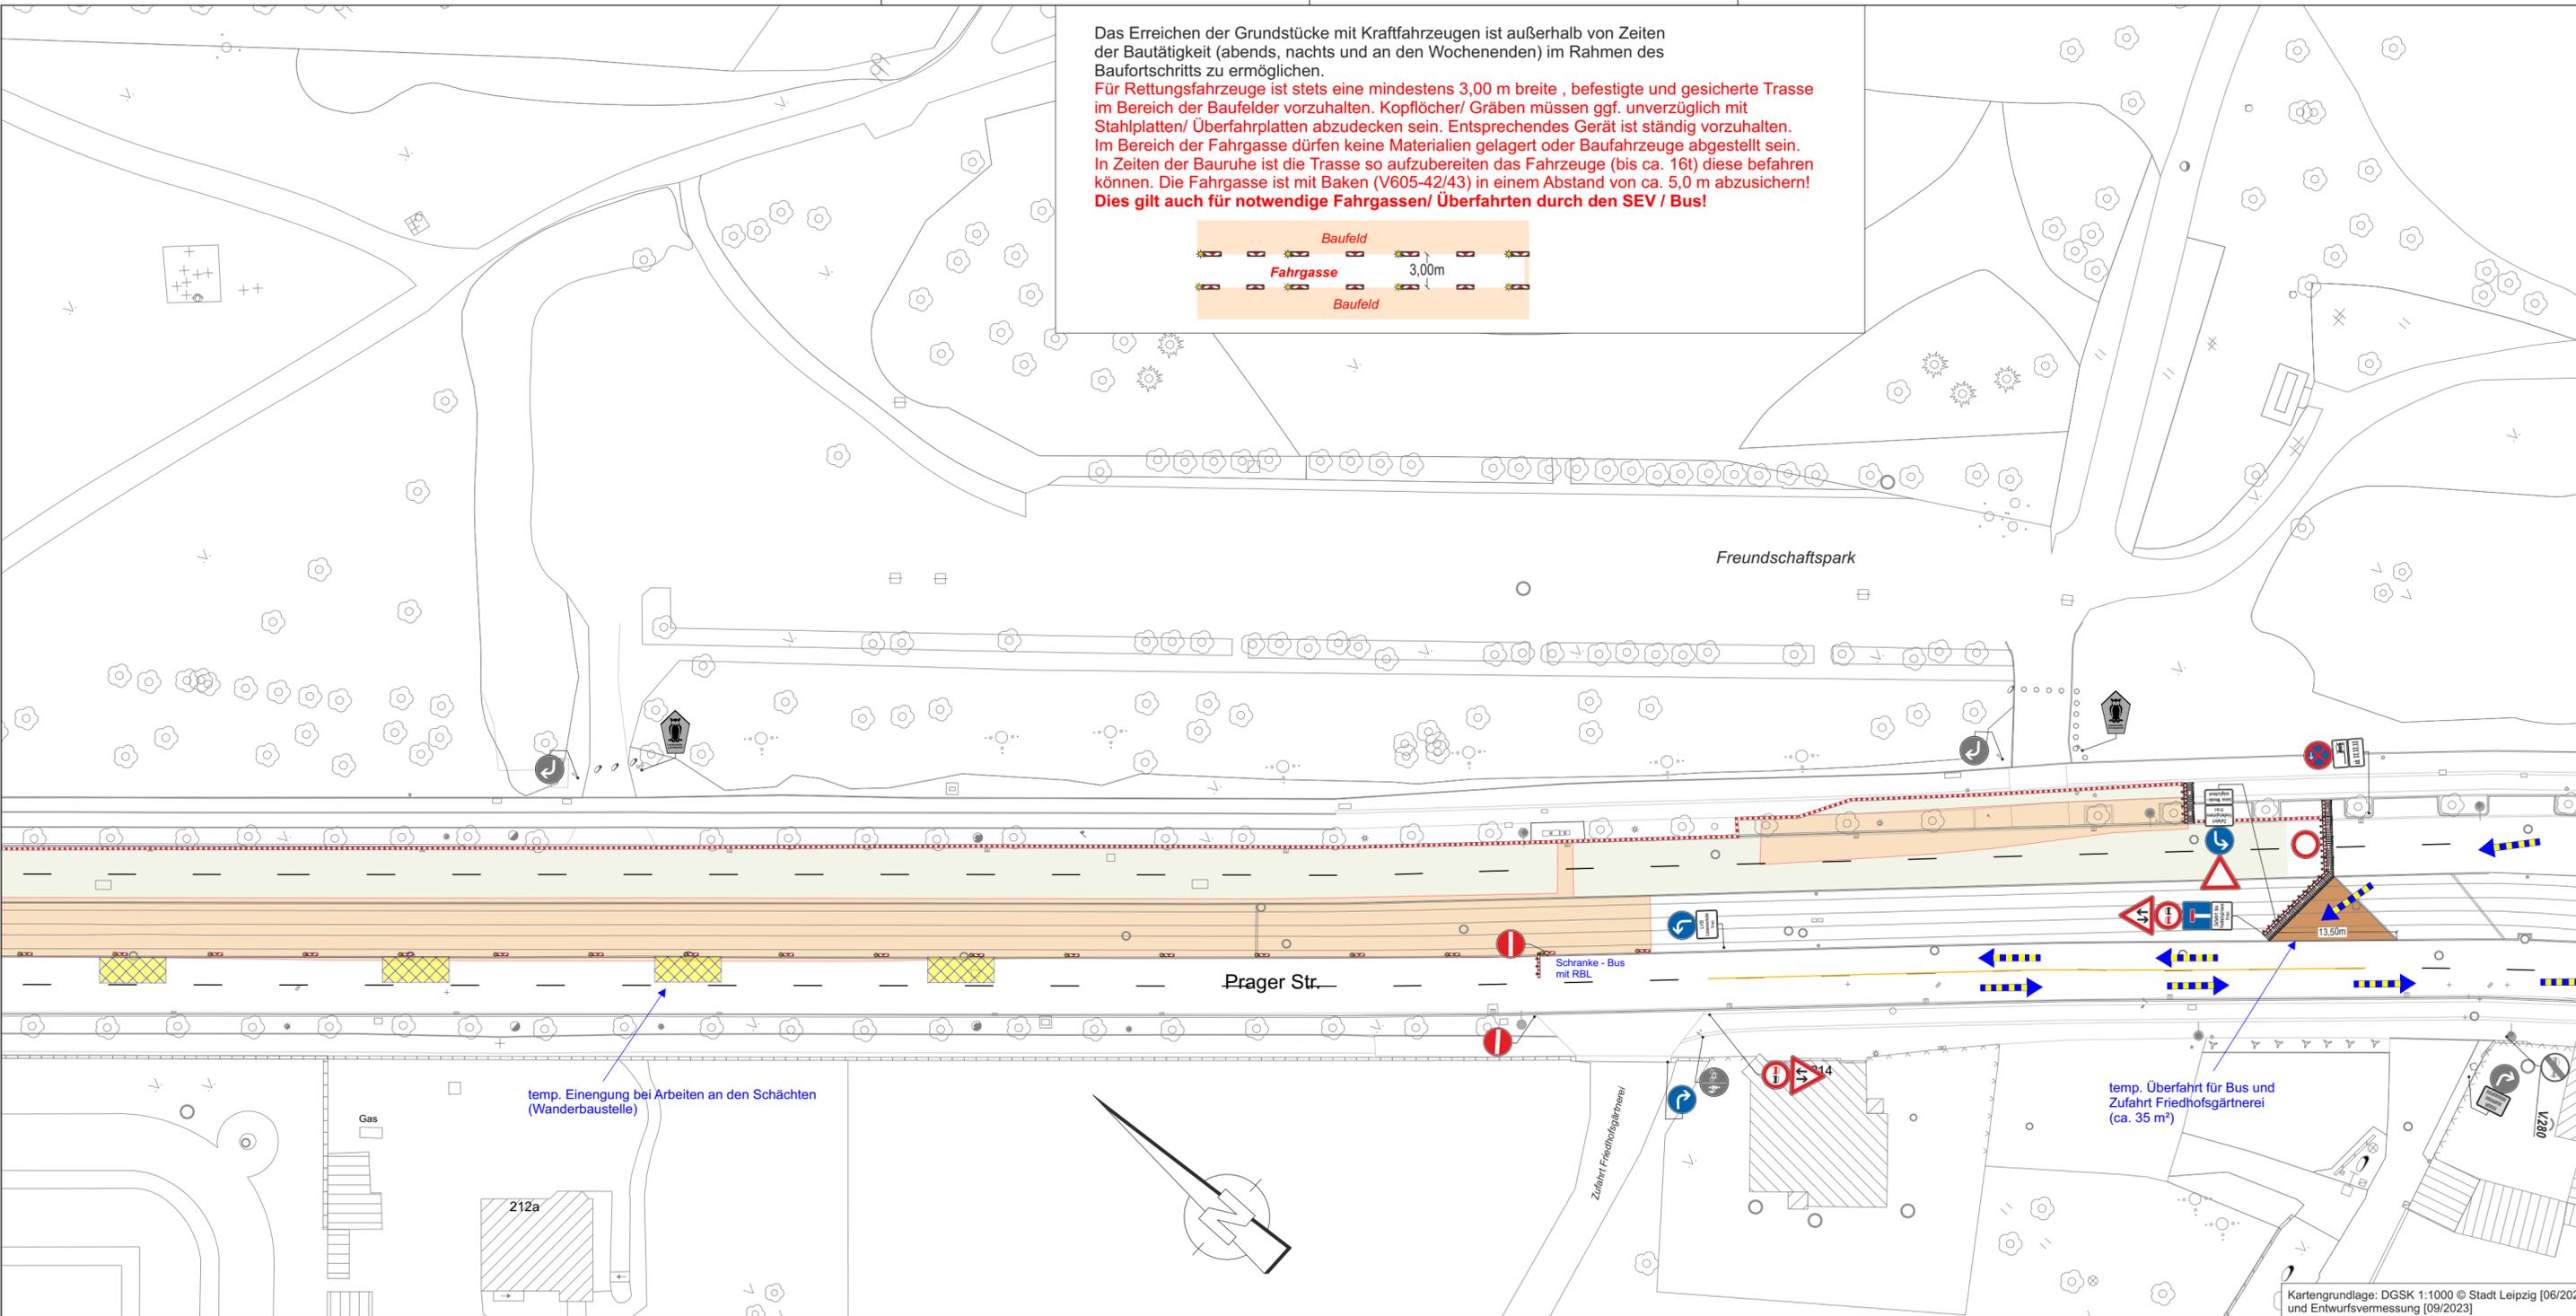

Das Erreichen der Grundstücke mit Kraftfahrzeugen ist außerhalb von Zeiten der Bautätigkeit (abends, nachts und an den Wochenenden) im Rahmen des Baufortschritts zu ermöglichen.
Für Rettungsfahrzeuge ist stets eine mindestens 3,00 m breite , befestigte und gesicherte Trasse im Bereich der Baufelder vorzuhalten. Kopflöcher/ Gräben müssen ggf. unverzüglich mit Stahlplatten/ Überfahrplatten abzudecken sein. Entsprechendes Gerät ist ständig vorzuhalten. Im Bereich der Fahrgasse dürfen keine Materialien gelagert oder Baufahrzeuge abgestellt sein. In Zeiten der Bauruhe ist die Trasse so aufzubereiten das Fahrzeuge (bis ca. 16t) diese befahren können. Die Fahrgasse ist mit Baken (V605-42/43) in einem Abstand von ca. 5,0 m abzusichern! Dies gilt auch für notwendige Fahrgassen/ Überfahrten durch den SEV / Bus!



- Temporäre Beschilderung
- Stationäre Beschilderung
- stationäre Beschilderung während der Bauzeit abdecken
- Zonen für Haltverbote
Haltverbote (V.83/V.26) inkl. 1-2 Zusatzzeichen
3 volle Tage vor Baubeginn stellen
- Schienersatzverkehr (SEV) / Bus
- Baufeld-/ Verkehrssicherungsbereiche
(die auszuführenden Bauleistungen und deren zeitliche Abfolge sind den Bauphasenplänen und dem Grobabaufplan zu entnehmen)
- temporäre Befestigungen auf Grünflächen, im Gleisbereich etc.
- Wanderbaustelle für Arbeiten an den Schächten/Leuchte etc.
im Verkehrsbereich - Länge zwischen 5,0m - max.10,0 m;
Durchfahrtsbreite von min. 3,0 m muss stets gewährleistet werden.

Plan dient nur zu Kalkulationszwecken!


Nr.	Art der Änderung	Datum	Name
	bearbeitet	05.11.24	HMa
Blattgröße:		750 x 297 mm	

Leipziger Verkehrsbetriebe LVB GmbH Georgiring 3 04103 Leipzig	Stadt Leipzig Mobilitäts- und Tiefbauamt Prager Straße 118-136 04317 Leipzig		
Bauherr:			
Prager Straße zwischen An der Tabakmühle und Friedhofsgärtnerei (P-Nr. 90617)			
Bauvorhaben:	Ausschreibungsunterlage	Verkehrsführung während der Bauzeit	Maßstab:
Verkehrsführungsphase 1A		geplanter Zeitraum: 14.04.25-24.06.25	1:500
Baubereich Detailplan 4			Unterlage/ Blatt-Nr.: VF1A-D 04

Kartengrundlage: DGSK 1:1000 © Stadt Leipzig [06/2023] und Entwurfsvermessung [09/2023]



-  Temporäre Beschilderung
-  Stationäre Beschilderung
-  stationäre Beschilderung während der Bauzeit abdecken
-  Zonen für Haltverbote
Haltverbote (V.83/V.26) inkl. 1-2 Zusatzzeichen
3 volle Tage vor Baubeginn stellen
-  Schienersatzverkehr (SEV) / Bus
-  Baufeld-/ Verkehrssicherungsbereiche
(die auszuführenden Bauleistungen und deren zeitliche Abfolge sind den Bauphasenplänen und dem Grobbauplan zu entnehmen)
-  temporäre Befestigungen auf Grünflächen, im Gleisbereich etc.
-  Wanderbaustelle für Arbeiten an den Schächten/Leuchte etc.
im Verkehrsbereich - Länge zwischen 5,0m - max.10,0 m;
Durchfahrtsbreite von min. 3,0 m muss stets gewährleistet werden.



Plan dient nur zu Kalkulationszwecken!

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name
	bearbeitet	05.11.24	HMa
Blattgröße:		850 x 297 mm	

Leipziger Verkehrsbetriebe
LVB GmbH
Georgiring 3 | 04103 Leipzig

Stadt Leipzig
Mobilitäts- und Tiefbauamt
Prager Straße 118-136 | 04317 Leipzig

Bauherr:

Prager Straße
zwischen An der Tabakmühle und Friedhofsgärtnerei
(P.-Nr. 90617)

Bauvorhaben:	Verkehrsführung während der Bauzeit	Maßstab:
Ausschreibungsunterlage	geplanter Zeitraum: 14.04.25-24.06.25	1:500
Verkehrsführungsphase 1A		Unterlage/ Blatt-Nr.:
Baubereich Detailplan 5		VF1A-D 05

Kartengrundlage: DGSK 1:1000 © Stadt Leipzig [06/2023] und Entwurfsvermessung [09/2023]



 Temporäre Beschilderung
  stationäre Beschilderung während der Bauzeit abdecken
 Stationäre Beschilderung
 Hinweis:
 Haltverbote sind 3 volle Tage vor Baubeginn mit entspr. Zusatzzeichen zu stellen. Eine Dokumentation ist anzufertigen.

Plan dient nur zu Kalkulationszwecken!

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name
	bearbeitet	05.11.24	HMa
	Blattgröße:	800 x 297 mm	


 Leipziger Verkehrsbetriebe LVB GmbH Georgiring 3 04103 Leipzig	 Stadt Leipzig Mobilitäts- und Tiefbauamt Prager Straße 118-136 04317 Leipzig
---	---

Bauherr:
Prager Straße
 zwischen An der Tabakmühle und Friedhofsgärtnerei
 (P.-Nr. 90617)

Bauvorhaben:	Ausschreibungsunterlage	Verkehrsführung während der Bauzeit	Maßstab:
	Verkehrsführungsphase 1A	geplanter Zeitraum: 14.04.25-24.06.25	1:500
Detailplan Anschluss an Baubereich Schönbachstr./ Naunhofer Str.			Unterlage/ Blatt-Nr.: VF1A-D 06

 Temporäre Beschilderung
  stationäre Beschilderung während der Bauzeit abdecken
 Stationäre Beschilderung

Hinweis:
 Haltverbote sind 3 volle Tage vor Baubeginn mit entspr. Zusatzzeichen zu stellen. Eine Dokumentation ist anzufertigen.

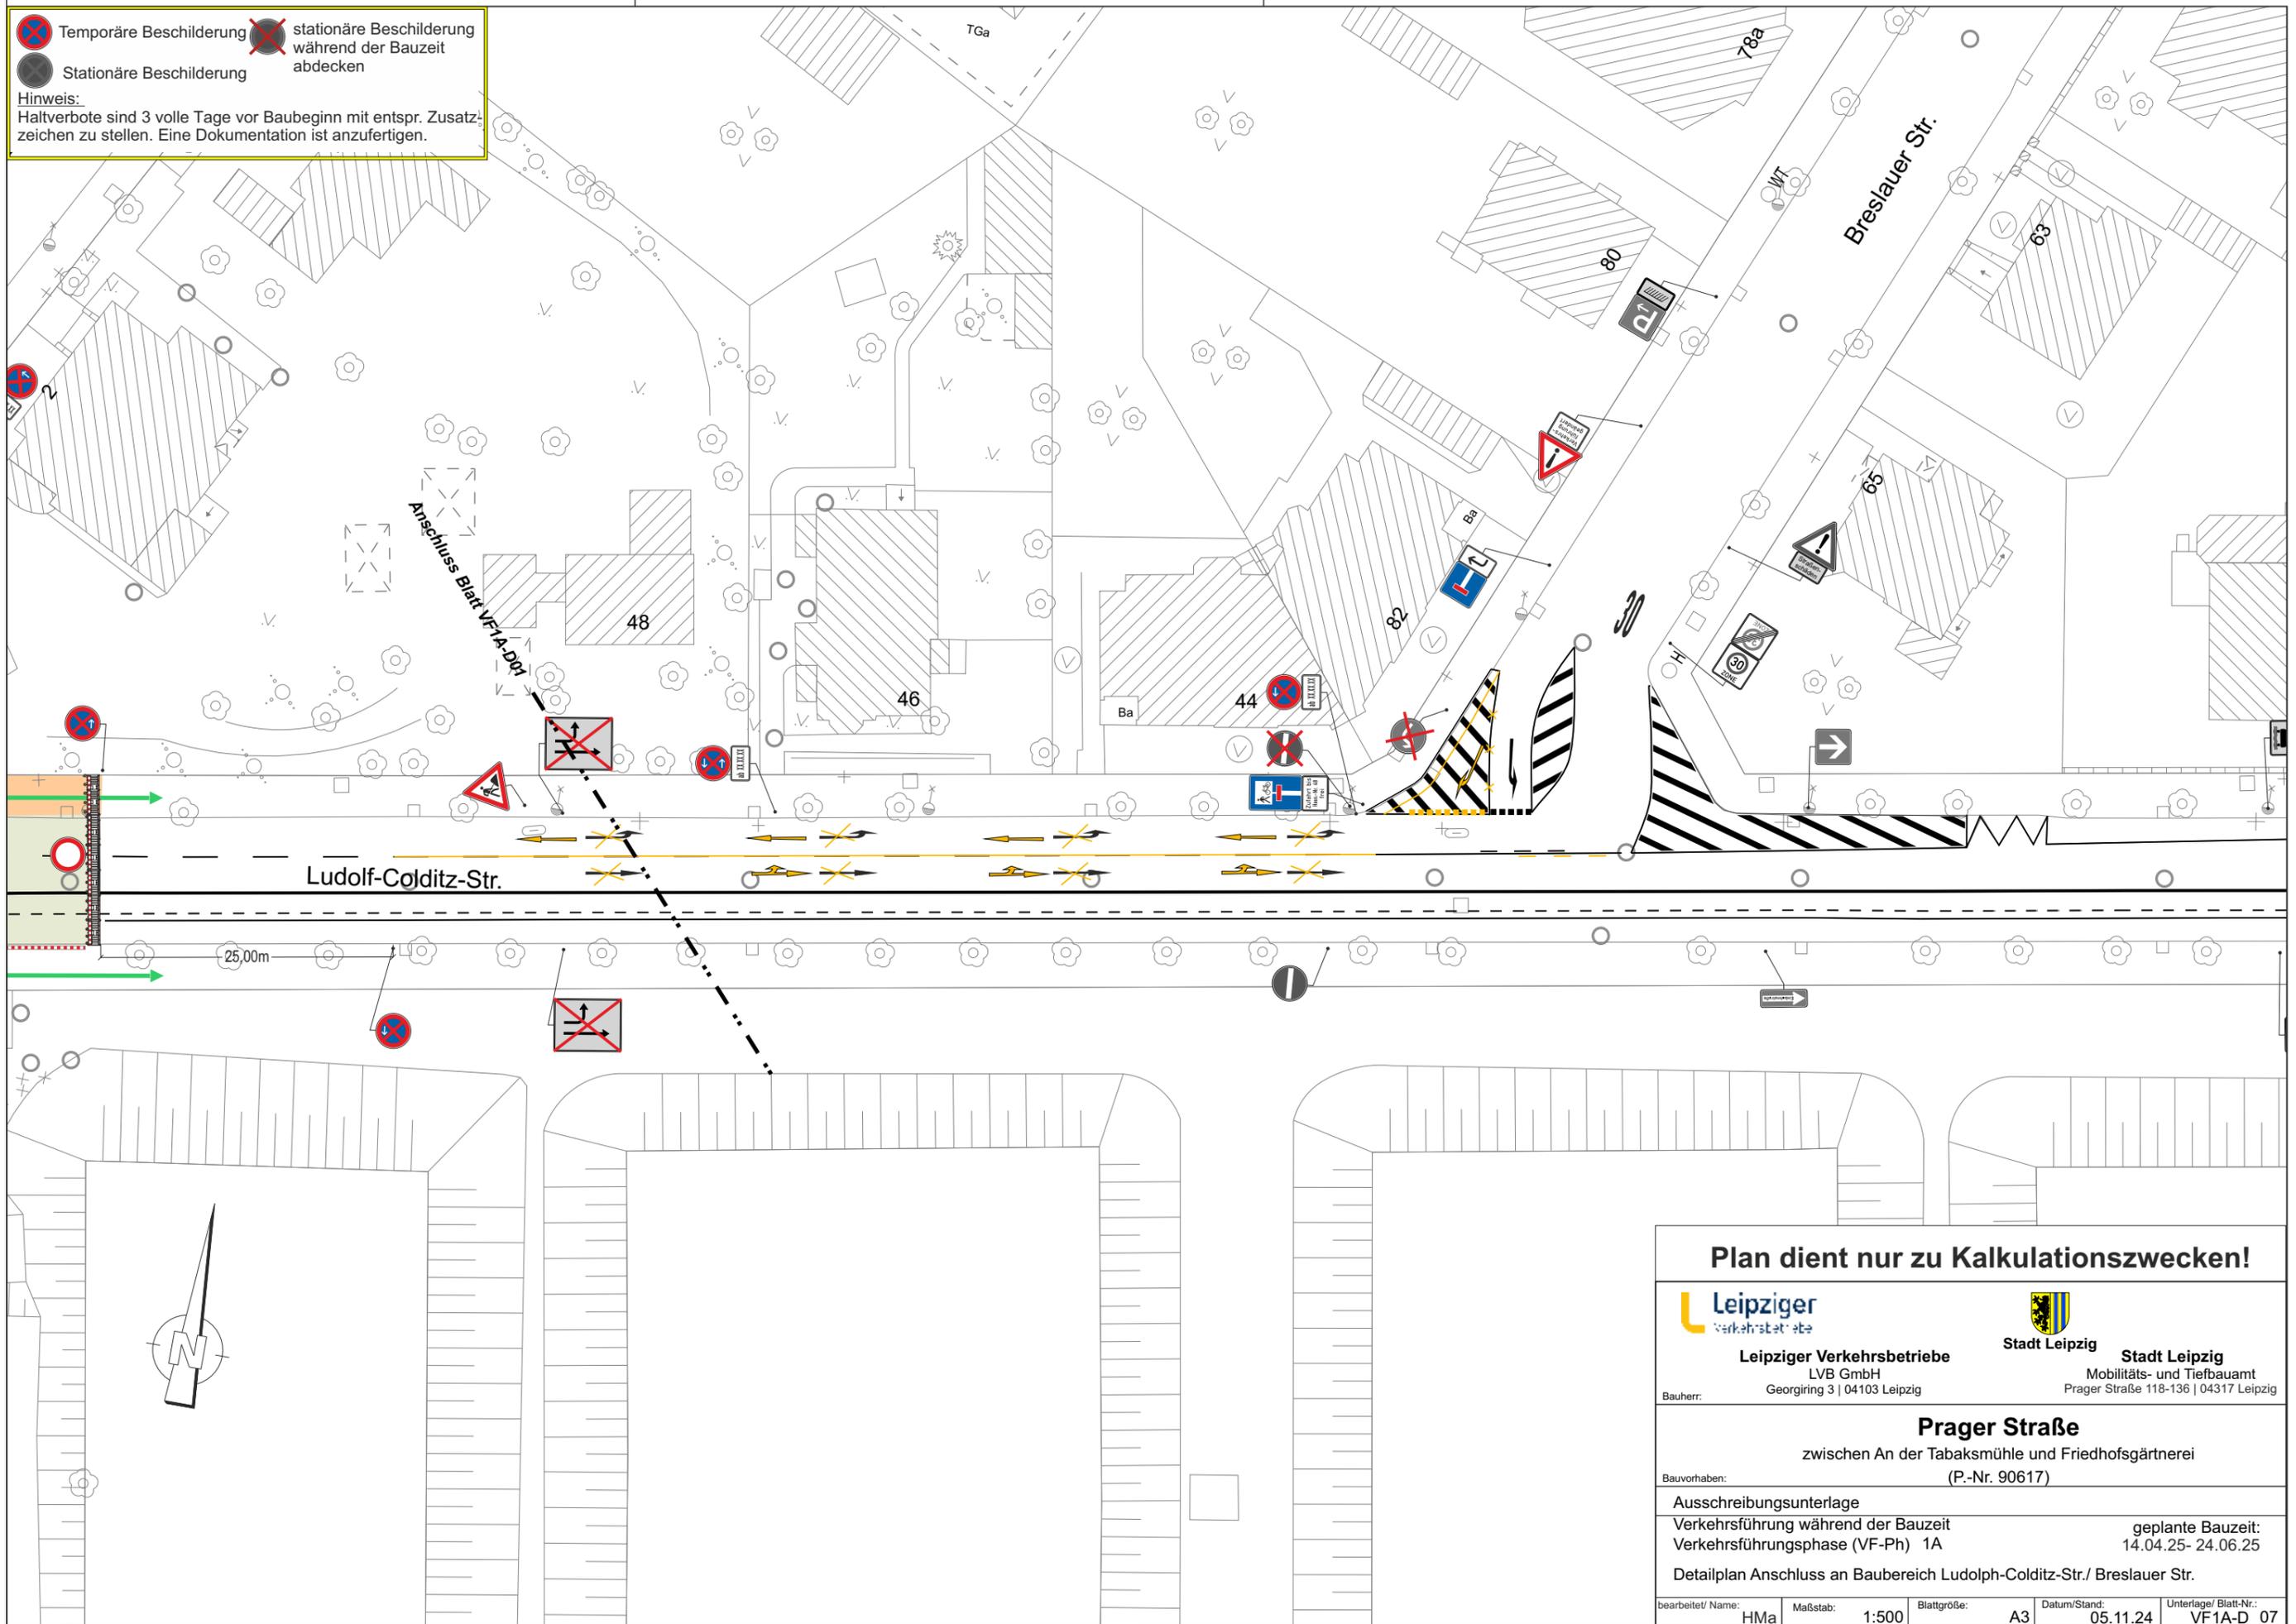

Plan dient nur zu Kalkulationszwecken!

 Leipziger Verkehrsbetriebe Leipziger Verkehrsbetriebe LVB GmbH Georgiring 3 04103 Leipzig	 Stadt Leipzig Stadt Leipzig Mobilitäts- und Tiefbauamt Prager Straße 118-136 04317 Leipzig
--	---


Prager Straße
 zwischen An der Tabakmühle und Friedhofsgärtnerei
 (P.-Nr. 90617)

Bauvorhaben:

Ausschreibungsunterlage	geplante Bauzeit:
Verkehrsführung während der Bauzeit	14.04.25- 24.06.25
Verkehrsführungsphase (VF-Ph) 1A	

Detailplan Anschluss an Baubereich Ludolph-Colditz-Str./ Breslauer Str.

bearbeitet/ Name:	Maßstab:	Blattgröße:	Datum/Stand:	Unterlage/ Blatt-Nr.:
HMa	1:500	A3	05.11.24	VF1A-D 07

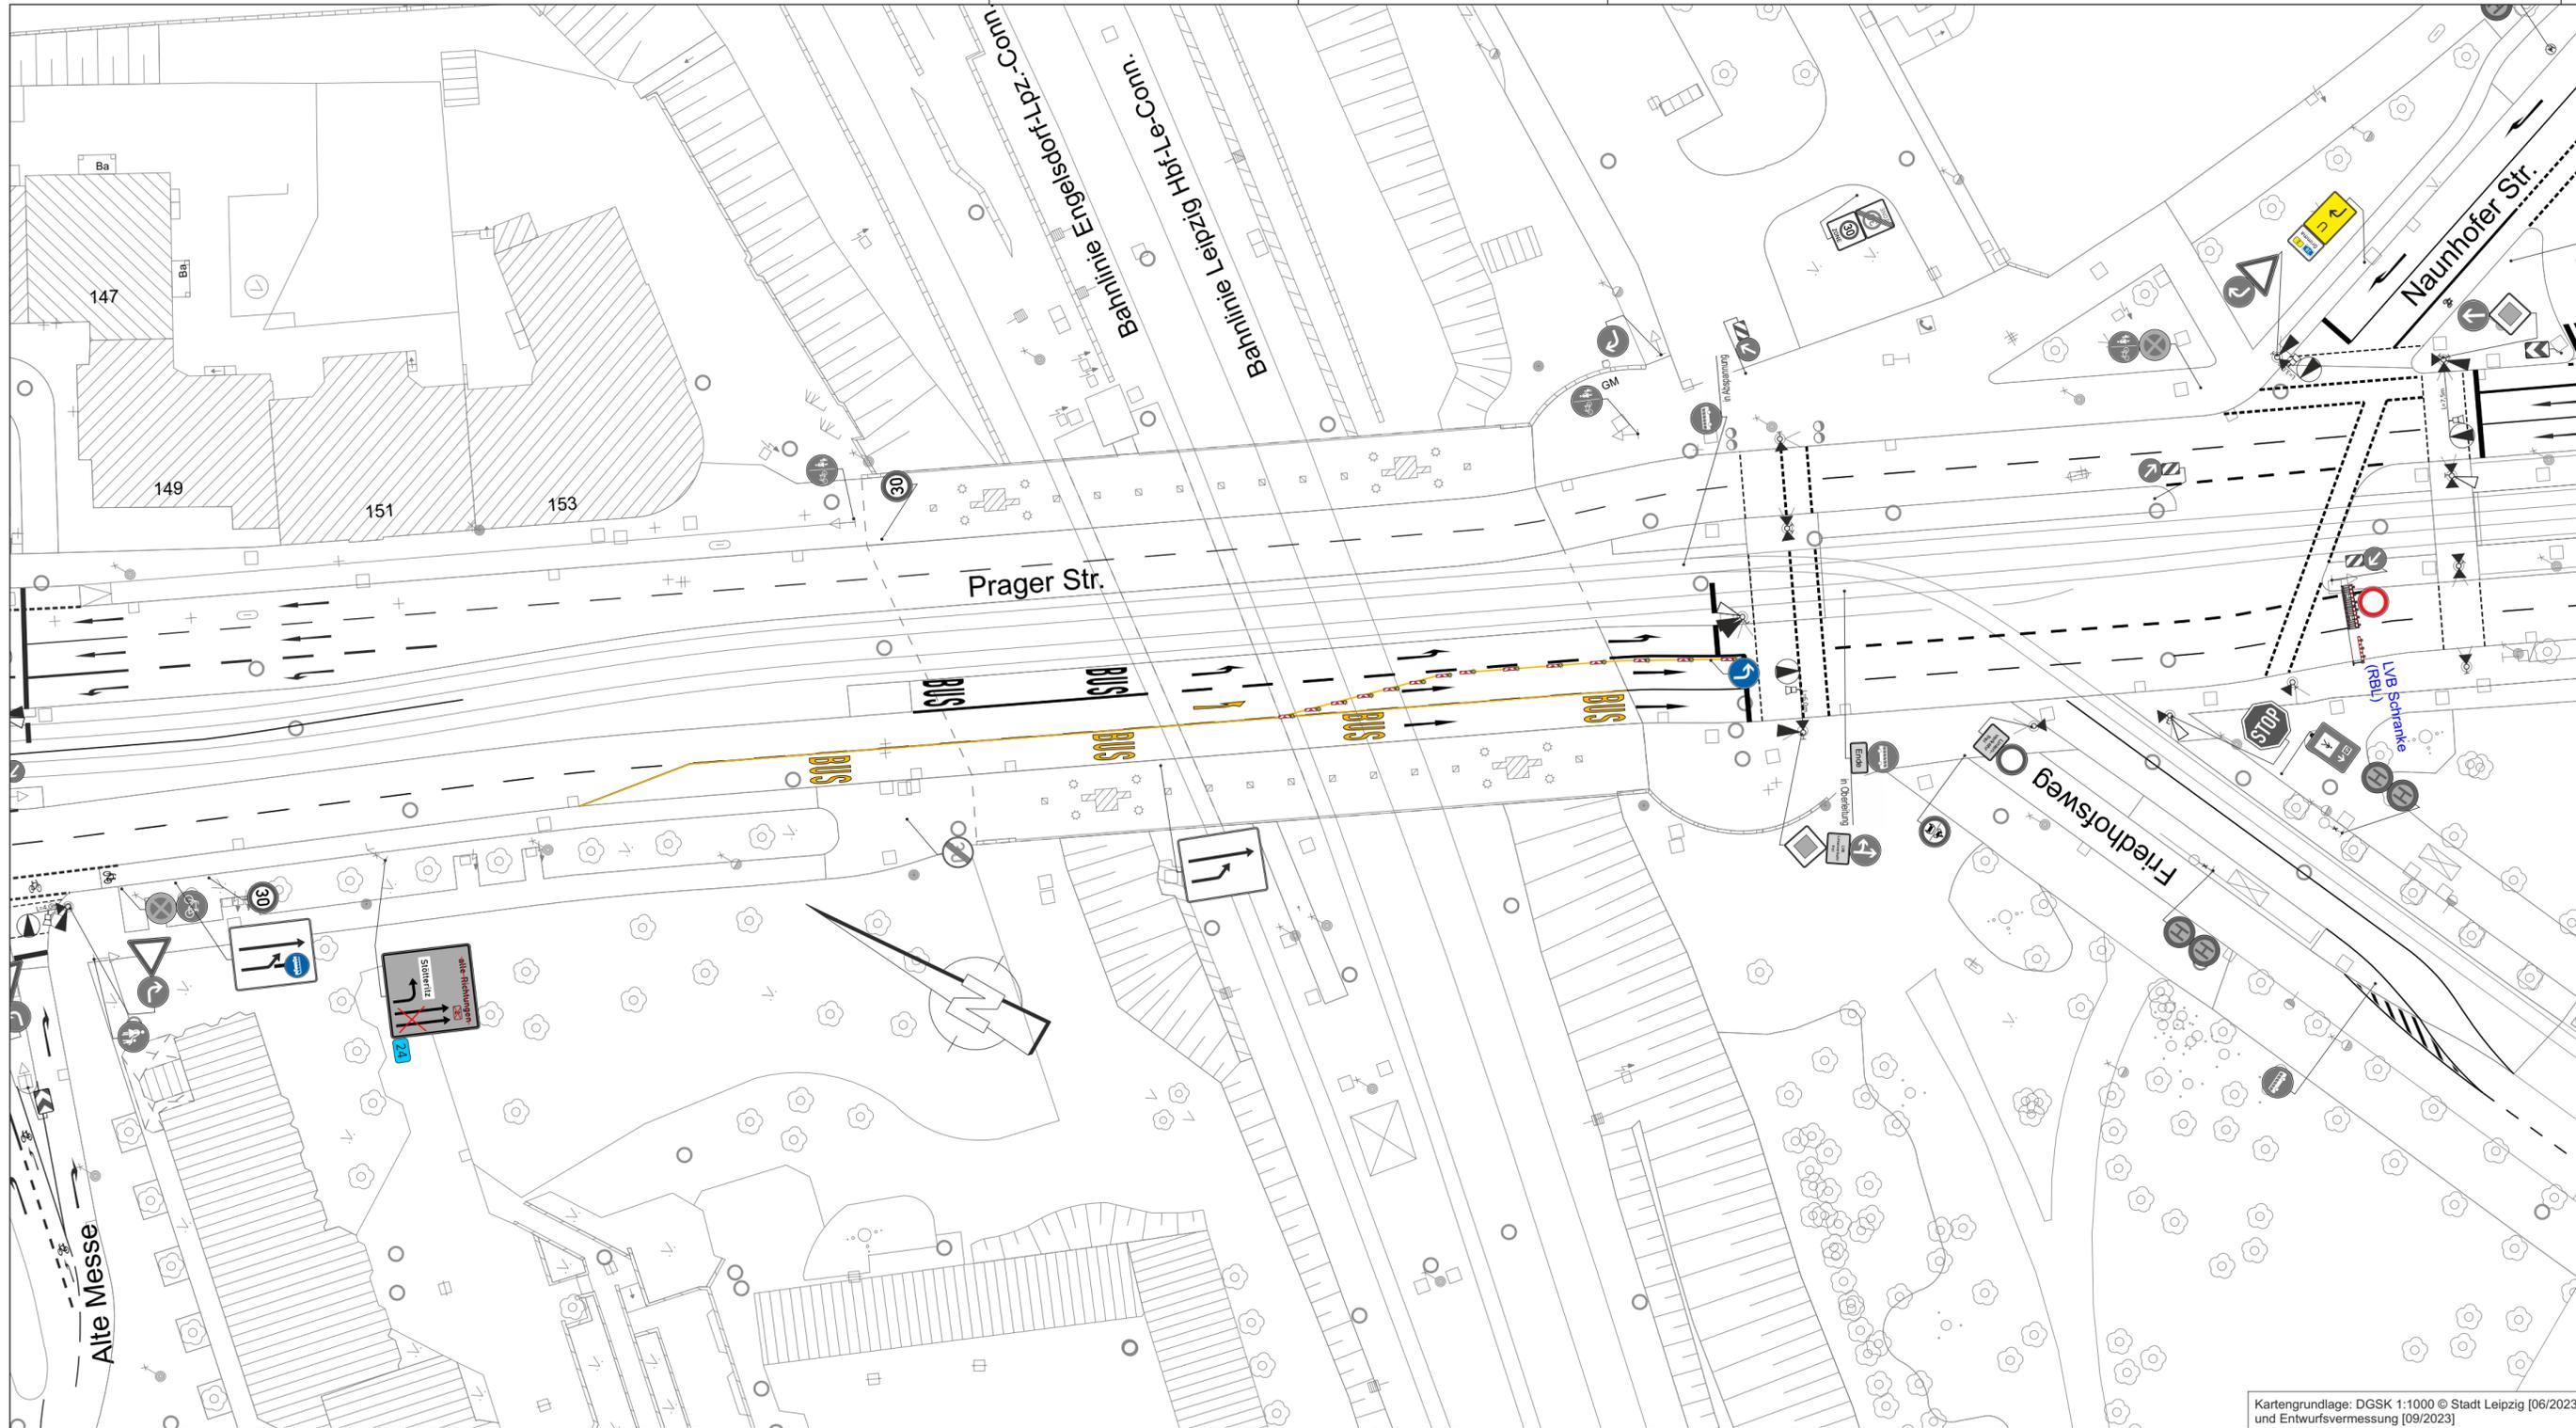

Plan dient nur zu Kalkulationszwecken!

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
bearbeitet	05.11.24	HMa
Blattgröße:	700 x 297 mm	


Leipziger Verkehrsbetriebe LVB GmbH Georgiring 3 04103 Leipzig	Stadt Leipzig Mobilitäts- und Tiefbauamt Prager Straße 118-136 04317 Leipzig
---	---

Bauherr:

Prager Straße
zwischen An der Tabakmühle und Friedhofsgärtnerei
(P.-Nr. 90617)

Ausschreibungsunterlage	Verkehrsführung während der Bauzeit	Maßstab:
Verkehrsführungsphase 1A	geplanter Zeitraum: 14.04.25-24.06.25	1:500
Detailplan zur Umleitungsführung zwischen Alte Messe und Friedhofsweg/ Naunhofer Str.		Unterlage/ Blatt-Nr.: VF1A-D 08

Kartengrundlage: DGSK 1:1000 © Stadt Leipzig [06/2023] und Entwurfsvermessung [09/2023]

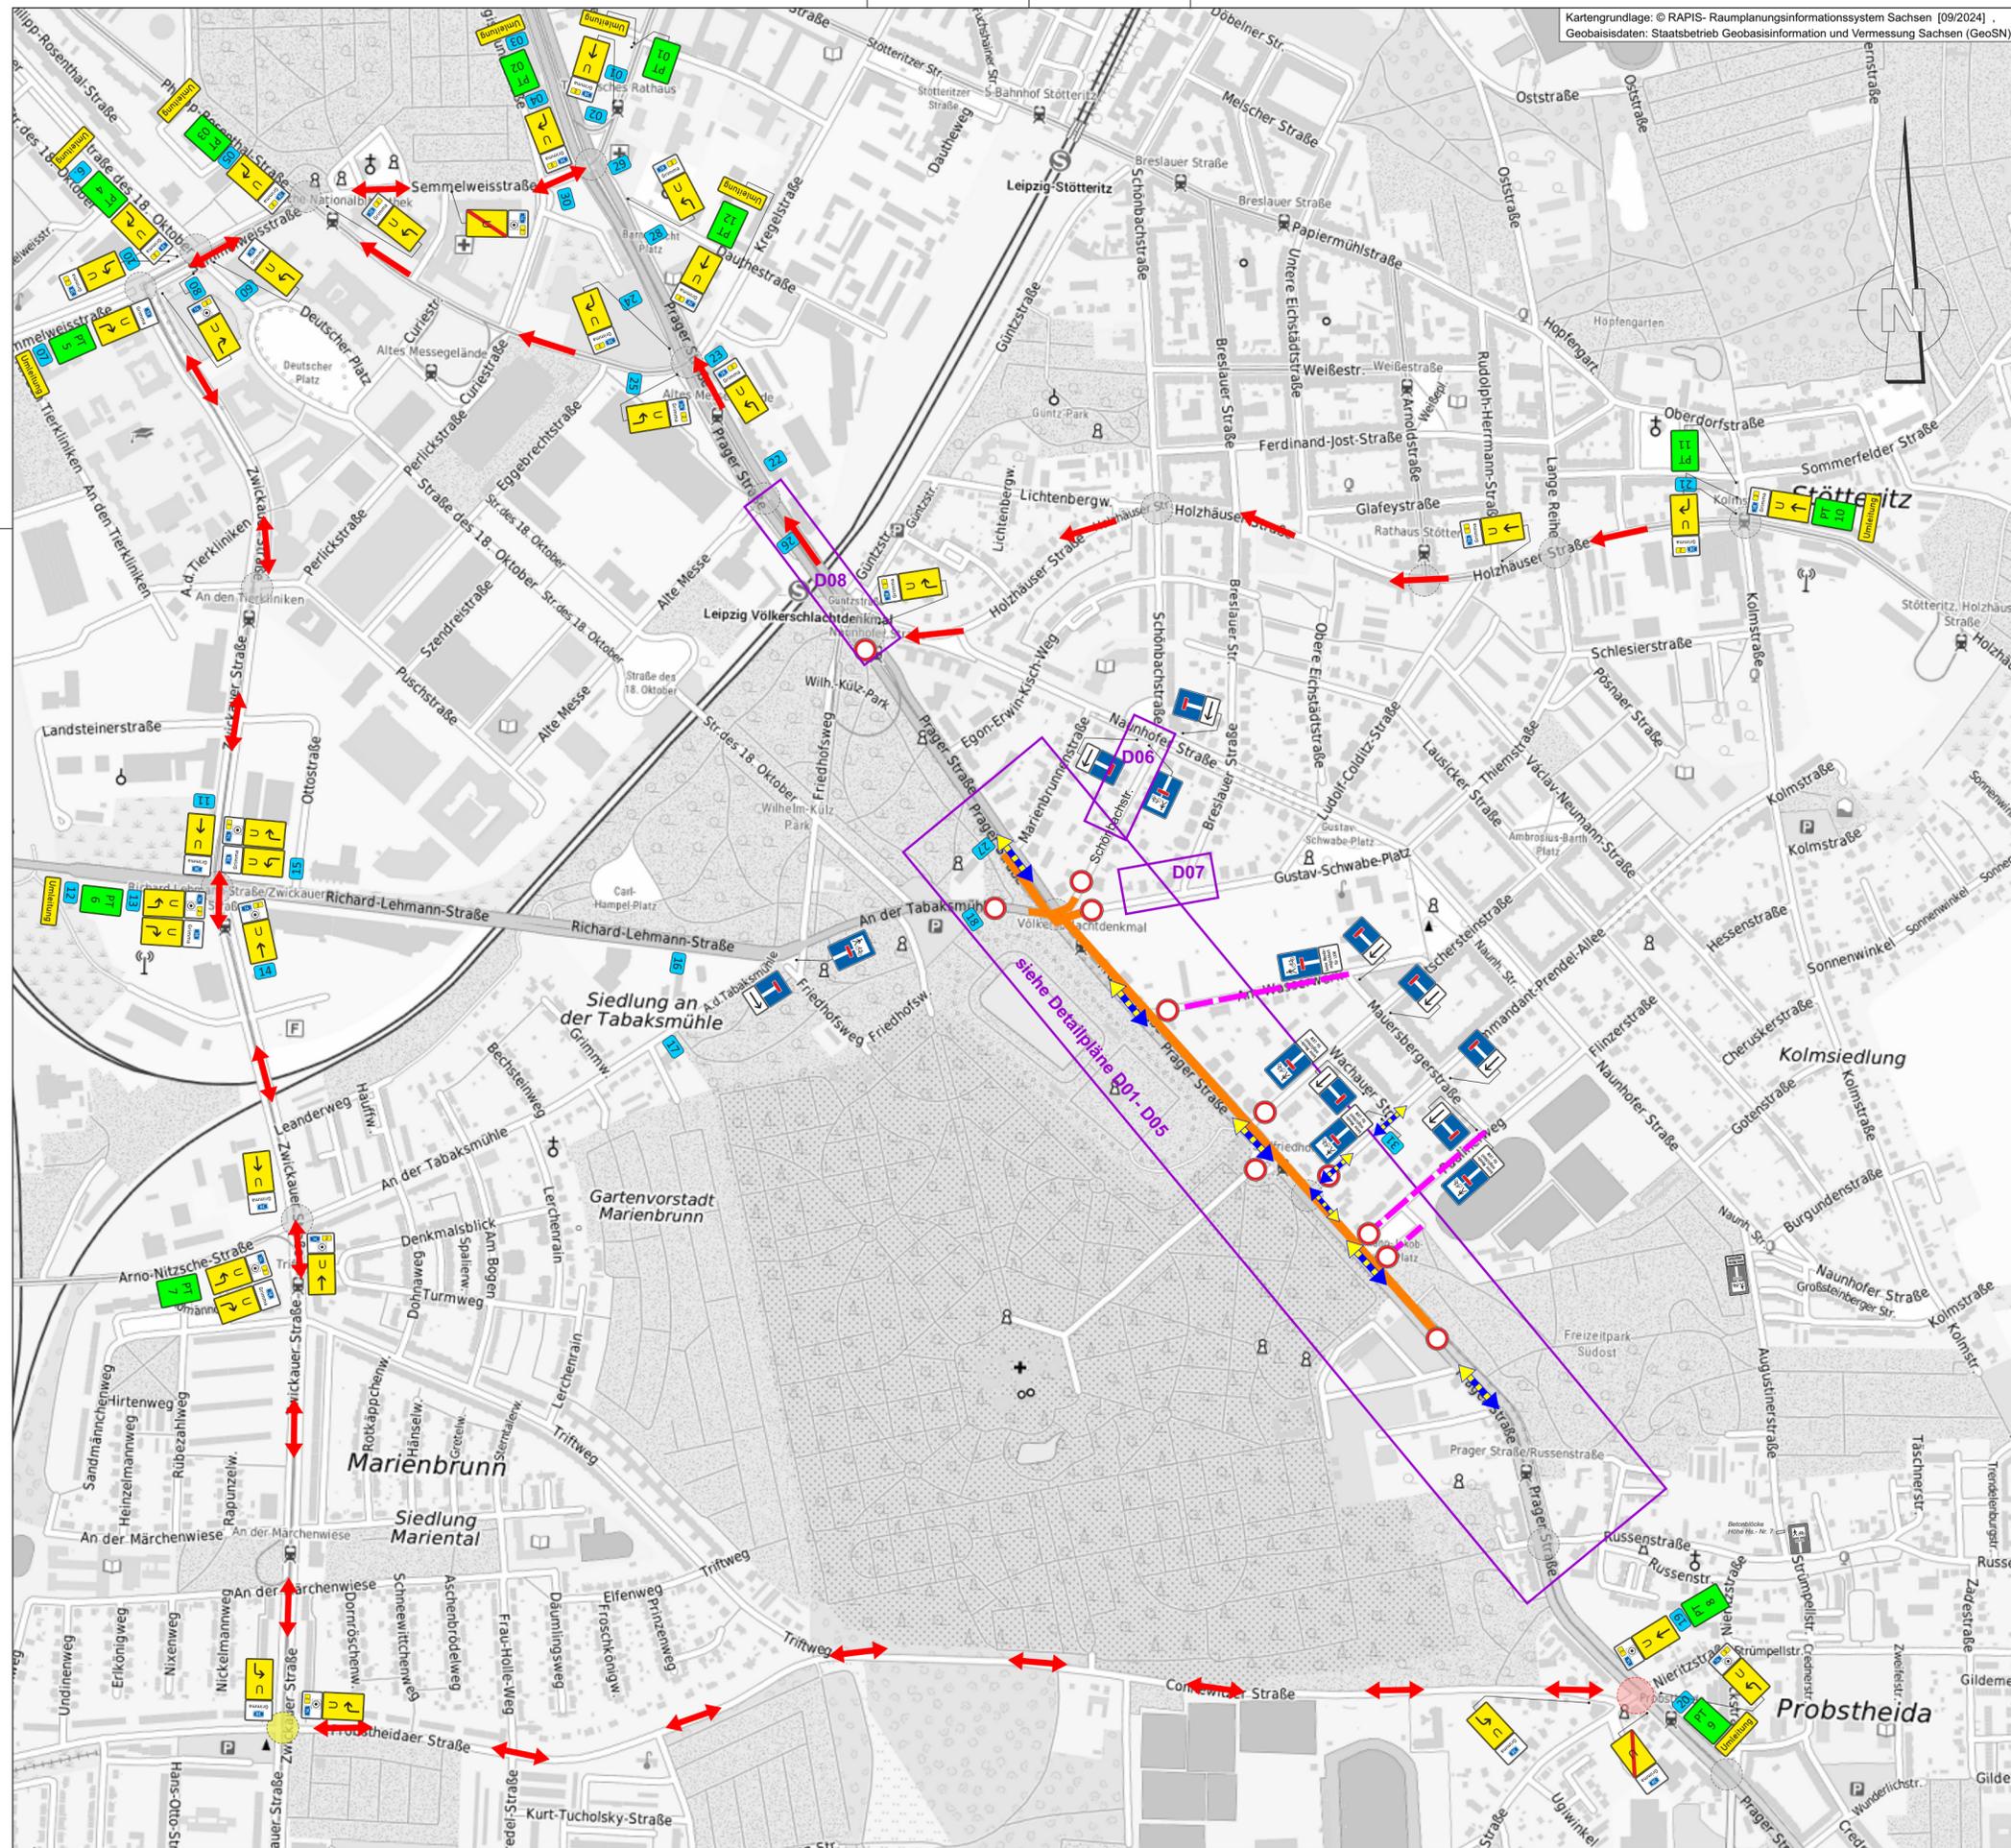

Straßenbahnvollsperrung : 14.04.2025 - 14.11.2025

Ferien:
 18.04.25 - 25.04.25 - Osterferien
 28.06.25 - 08.08.25 - Sommerferien
 06.10.25 - 18.10.25 - Herbstferien

- Umleitung MIV
- LVB/ Bus/ SEV durch Baubereich
- Baufeld
- Standorte temp. Plantafeln
Alle Plantafeln sind in der VF 1A eine Woche vor Baubeginn zu stellen und mit einem Zeitzusatz zu versehen!
ab 14.04.25
- Standorte stationäre Wegweisung
- Zonen für Haltverbote (Stellung beidseitig)
 Haltverbote (V.83/V.26) inkl. 1-2 Zusatzzeichen
 3 volle Tage vor Baubeginn stellen und aller 30 m wiederholen
 ca.30m | ca.30m | ca.30m | ca.30m
- stat. LSA
- Untersuchung/ Anpassung stat. LSA
- temp. LSA

Plan dient nur zu Kalkulationszwecken!

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name
		05.11.25	HMa
Blattgröße:		640 x 420	

Leipziger Verkehrsbetriebe
 LVB GmbH
 Georgiring 3 | 04103 Leipzig


Stadt Leipzig
 Mobilitäts- und Tiefbauamt
 Prager Straße 118-136 | 04317 Leipzig

Bauherr:


Prager Straße
 zwischen An der Tabakmühle und Friedhofsgärtnerei
 (P-Nr. 90617)

Bauvorhaben: Ausschreibungsunterlage	Verkehrsführung während der Bauzeit	Maßstab: ohne
Verkehrsführungsphase 1A Umleitungsführung	geplanter Zeitraum: 14.04.25 - 24.06.25	Unterlage/ Blatt-Nr.: VF1A-U-01


Riebeckstraße vor Prager Straße

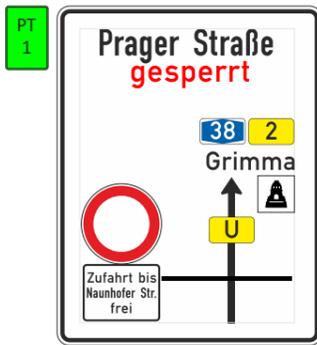

Prager Straße vor Semmelweisstraße

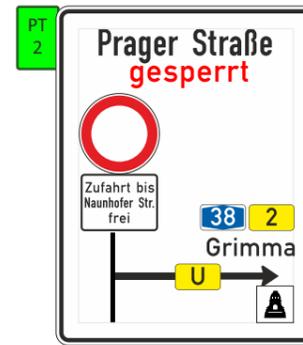


Philipp-Rosenthal-Str. vor Semmelweisstraße (Zuf. Nord)

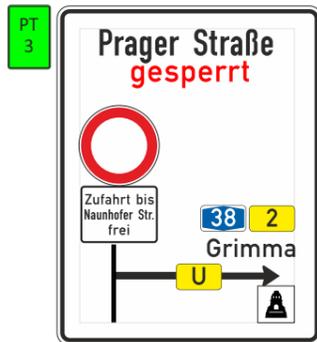


Philipp-Rosenthal-Str. vor Semmelweisstraße (Zuf. Süd)



Straße des 18. Oktober vor Semmelweisstraße

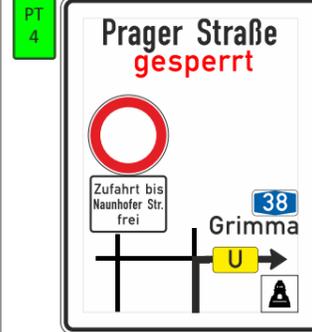


Semmelweisstraße vor Zwickauer Str.

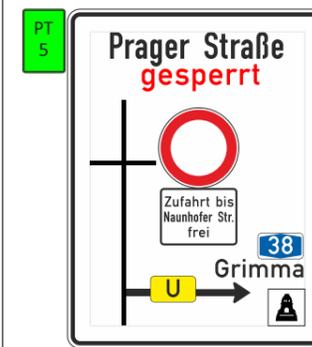

Semmelweisstr. vor Str. 18. Oktober (Zuf. West)




Deutscher Platz vor Semmelweisstr.

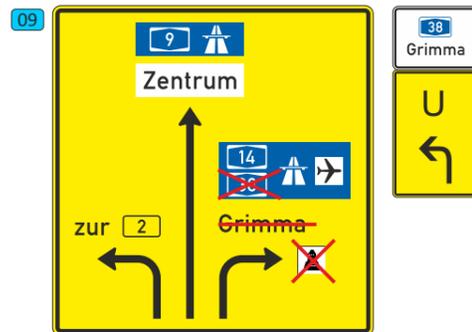



Semmelweisstr. vor Zwickauer Str. (Zuf. Ost)



Zwickauer Str. vor R.-Lehmann-Str. (Zuf. Nord)

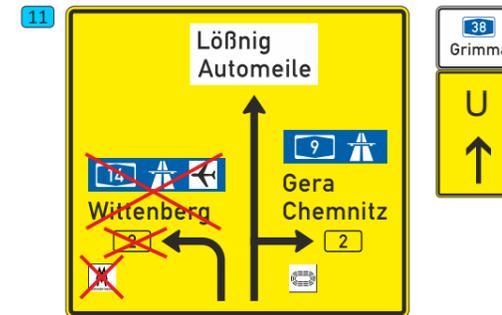


Richard-Lehmann-Str. vor Zwickauer Str. (Zuf. West)

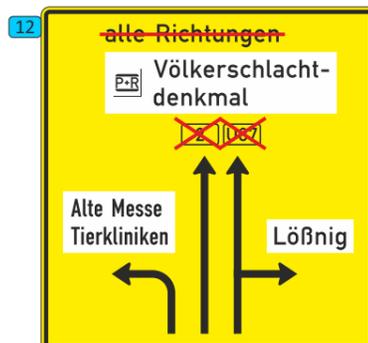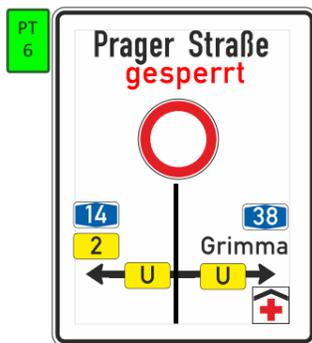


Leipziger Verkehrsnetze LVB GmbH Georgiring 3 04103 Leipzig		Stadt Leipzig Mobilitäts- und Tiefbauamt Prager Straße 118-136 04317 Leipzig	
Prager Straße zwischen An der Tabakmühle und Friedhofsgärtnerei (P.-Nr. 90617)			
Bauvorhaben:			
Ausschreibungsunterlage Verkehrsführung während der Bauzeit Verkehrsführungsphase (VF-Ph) 1A Umleitungsbeschilderung- Details zu Plankarten, Wegweisern und Zusatzzeichen für V.455		geplante Bauzeit: 14.04.25-24.06.25	
bearbeitet/ Name: HMa	Maßstab: ohne	Blattgröße: A3	Datum/Stand: 05.11.24
		Unterlage/ Blatt-Nr.: 1A-U02	


Kregelstraße vor Prager Str.

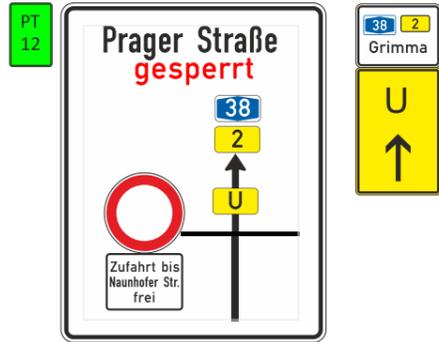

Prager Str. vor Kregelstr.

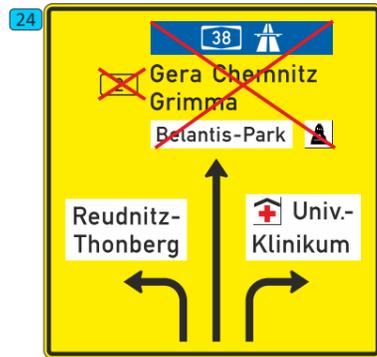

Philipp-Rosenthal-Str. vor Prager Str.

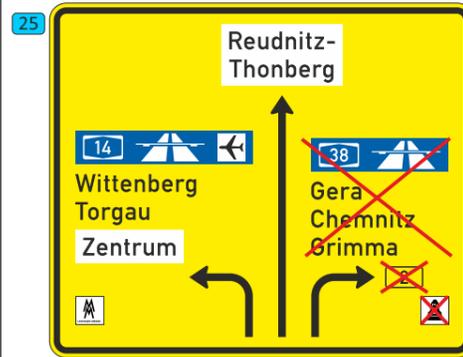



Prager Str. vor Friedhofsweg




Prager Str. vor An der Tabaksmühle




Prager Str. vor Riebeckstr.

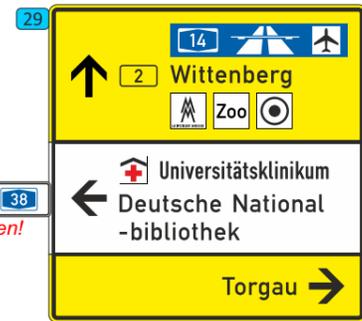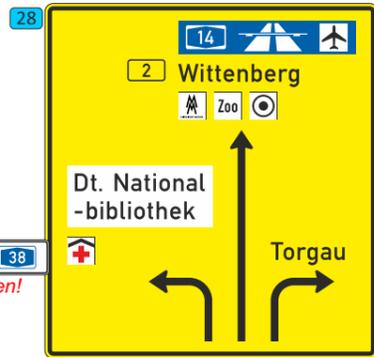

Semmelweisstr. vor Prager Str.

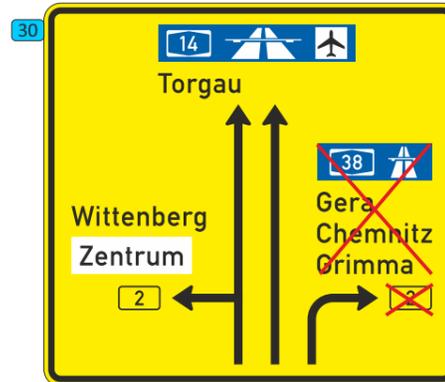


Kommandant-Prendel-Allee vor Prager Str.




Leipziger Verkehrsbetriebe LVB GmbH Georgiring 3 04103 Leipzig		Stadt Leipzig Mobilitäts- und Tiefbauamt Prager Straße 118-136 04317 Leipzig	
Prager Straße zwischen An der Tabaksmühle und Friedhofsgärtnerei (P.-Nr. 90617)			
Bauvorhaben:			
Ausschreibungsunterlage		geplante Bauzeit:	
Verkehrsführung während der Bauzeit		14.04.25-24.06.25	
Verkehrsführungsphase (VF-Ph) 1A Umleitungsbeschilderung- Details zu Plankarten, Wegweisern und Zusatzzeichen für V.455			
bearbeitet/ Name: HMa	Maßstab: ohne	Blattgröße: A3	Datum/Stand: 05.11.24
		Unterlage/ Blatt-Nr.: 1A-U04	

Zwickauer Str. vor Richard-Lehmann-Str. (Zuf. Süd)

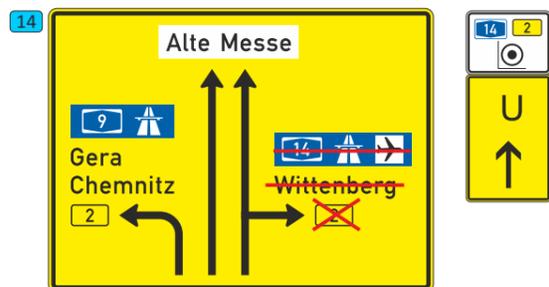


Richard-Lehmann-Str. vor Zwickauer Str. (Zuf. Ost)

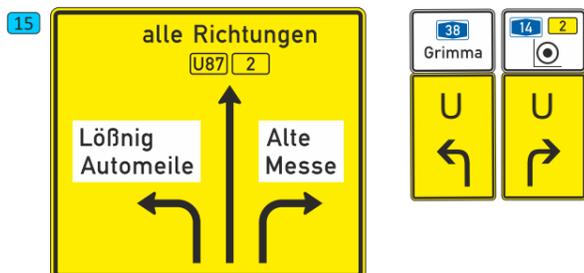


Richard-Lehmann-Str. vor An der Tabakmühle



An der Tabakmühle vor Richard-Lehmann-Str.

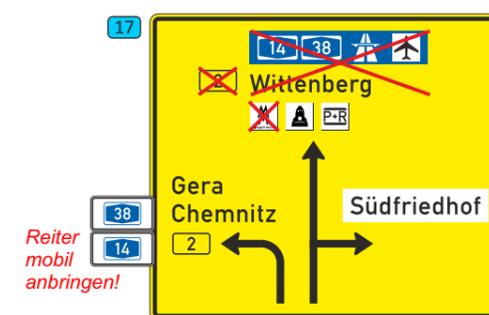


An der Tabakmühle vor Prager Str.

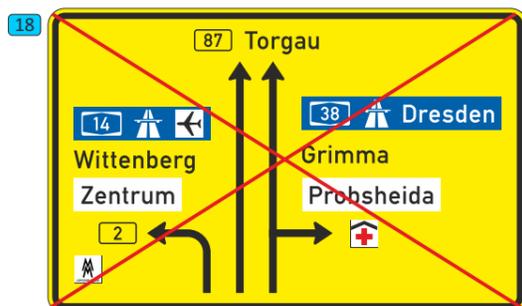

Zwickauer Str. vor Arno-Nitzsche-Str.



Arno-Nitzsche-Str. vor Zwickauer Str.

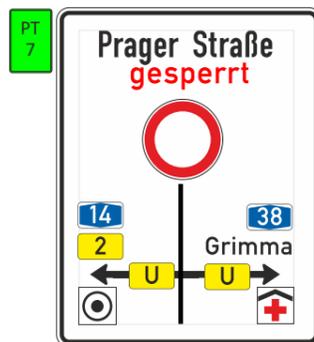

Zwickauer Str. vor An der Tabakmühle



Zwickauer Str. vor Probstheidaer Str. (Zuf. Nord)




Probstheidaer Str. vor Zwickauer Str. (Zuf. Ost)




Connewitzer Str. vor Dösener Str.




Nieritzstr. vor Prager Str.

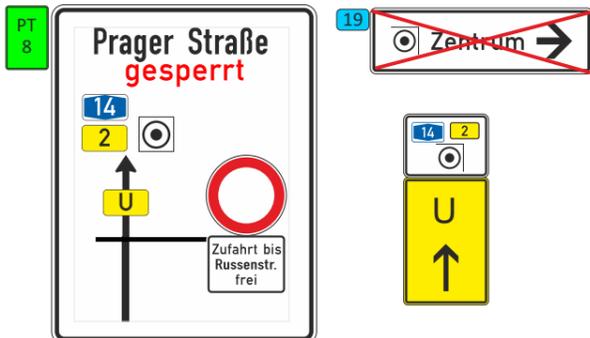


Prager Str. vor Nieritzstr.

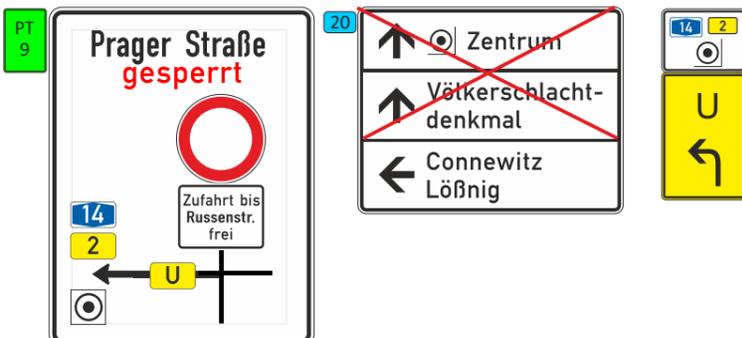

Holzhäuser Str. vor Sommerfelder Str.

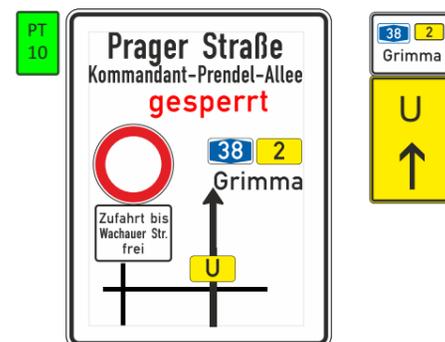

Zuckelhäuser Str. vor Holzhäuser Str.

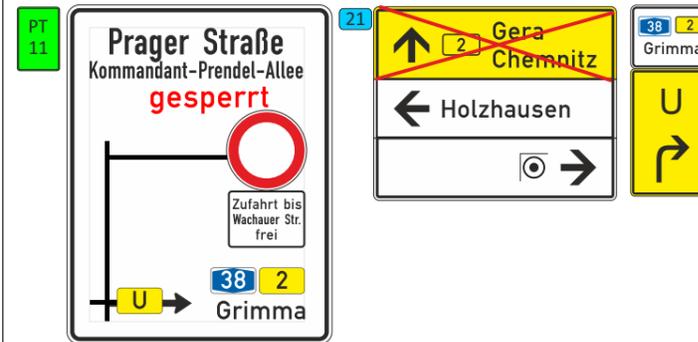


Holzhäuser Str. vor R.-Herrmann-Str.



Naunhofer Str. vor Prager Str.



Prager Str. vor Kregelstr. (Zuf. Süd)

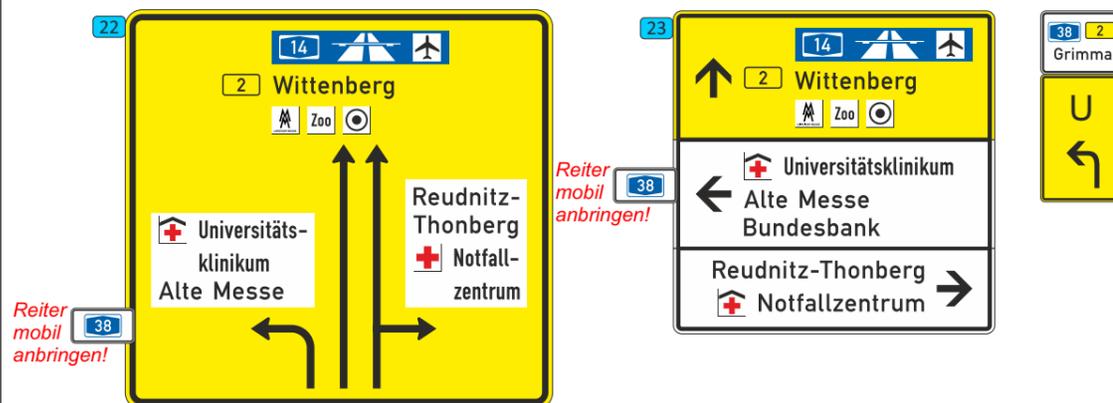




Leipziger Verkehrsbetriebe **Stadt Leipzig**
 Leipziger Verkehrsbetriebe LVB GmbH Mobilitäts- und Tiefbauamt
 Georgiring 3 | 04103 Leipzig Prager Straße 118-136 | 04317 Leipzig

Prager Straße
 zwischen An der Tabakmühle und Friedhofsgärtnerei
 (P.-Nr. 90617)

Ausschreibungsunterlage
 Verkehrsplanung während der Bauzeit geplante Bauzeit:
 Verkehrsführungsphase (VF-Ph) 1A 14.04.25-24.06.25
 Umleitungsbeschilderung- Details zu Plakatafeln, Wegweisern und
 Zusatzzeichen für V.455

bearbeitet/ Name: HMa Maßstab: ohne Blattgröße: A3 Datum/Stand: 05.11.24 Unterlage/ Blatt-Nr.: 1A-U03

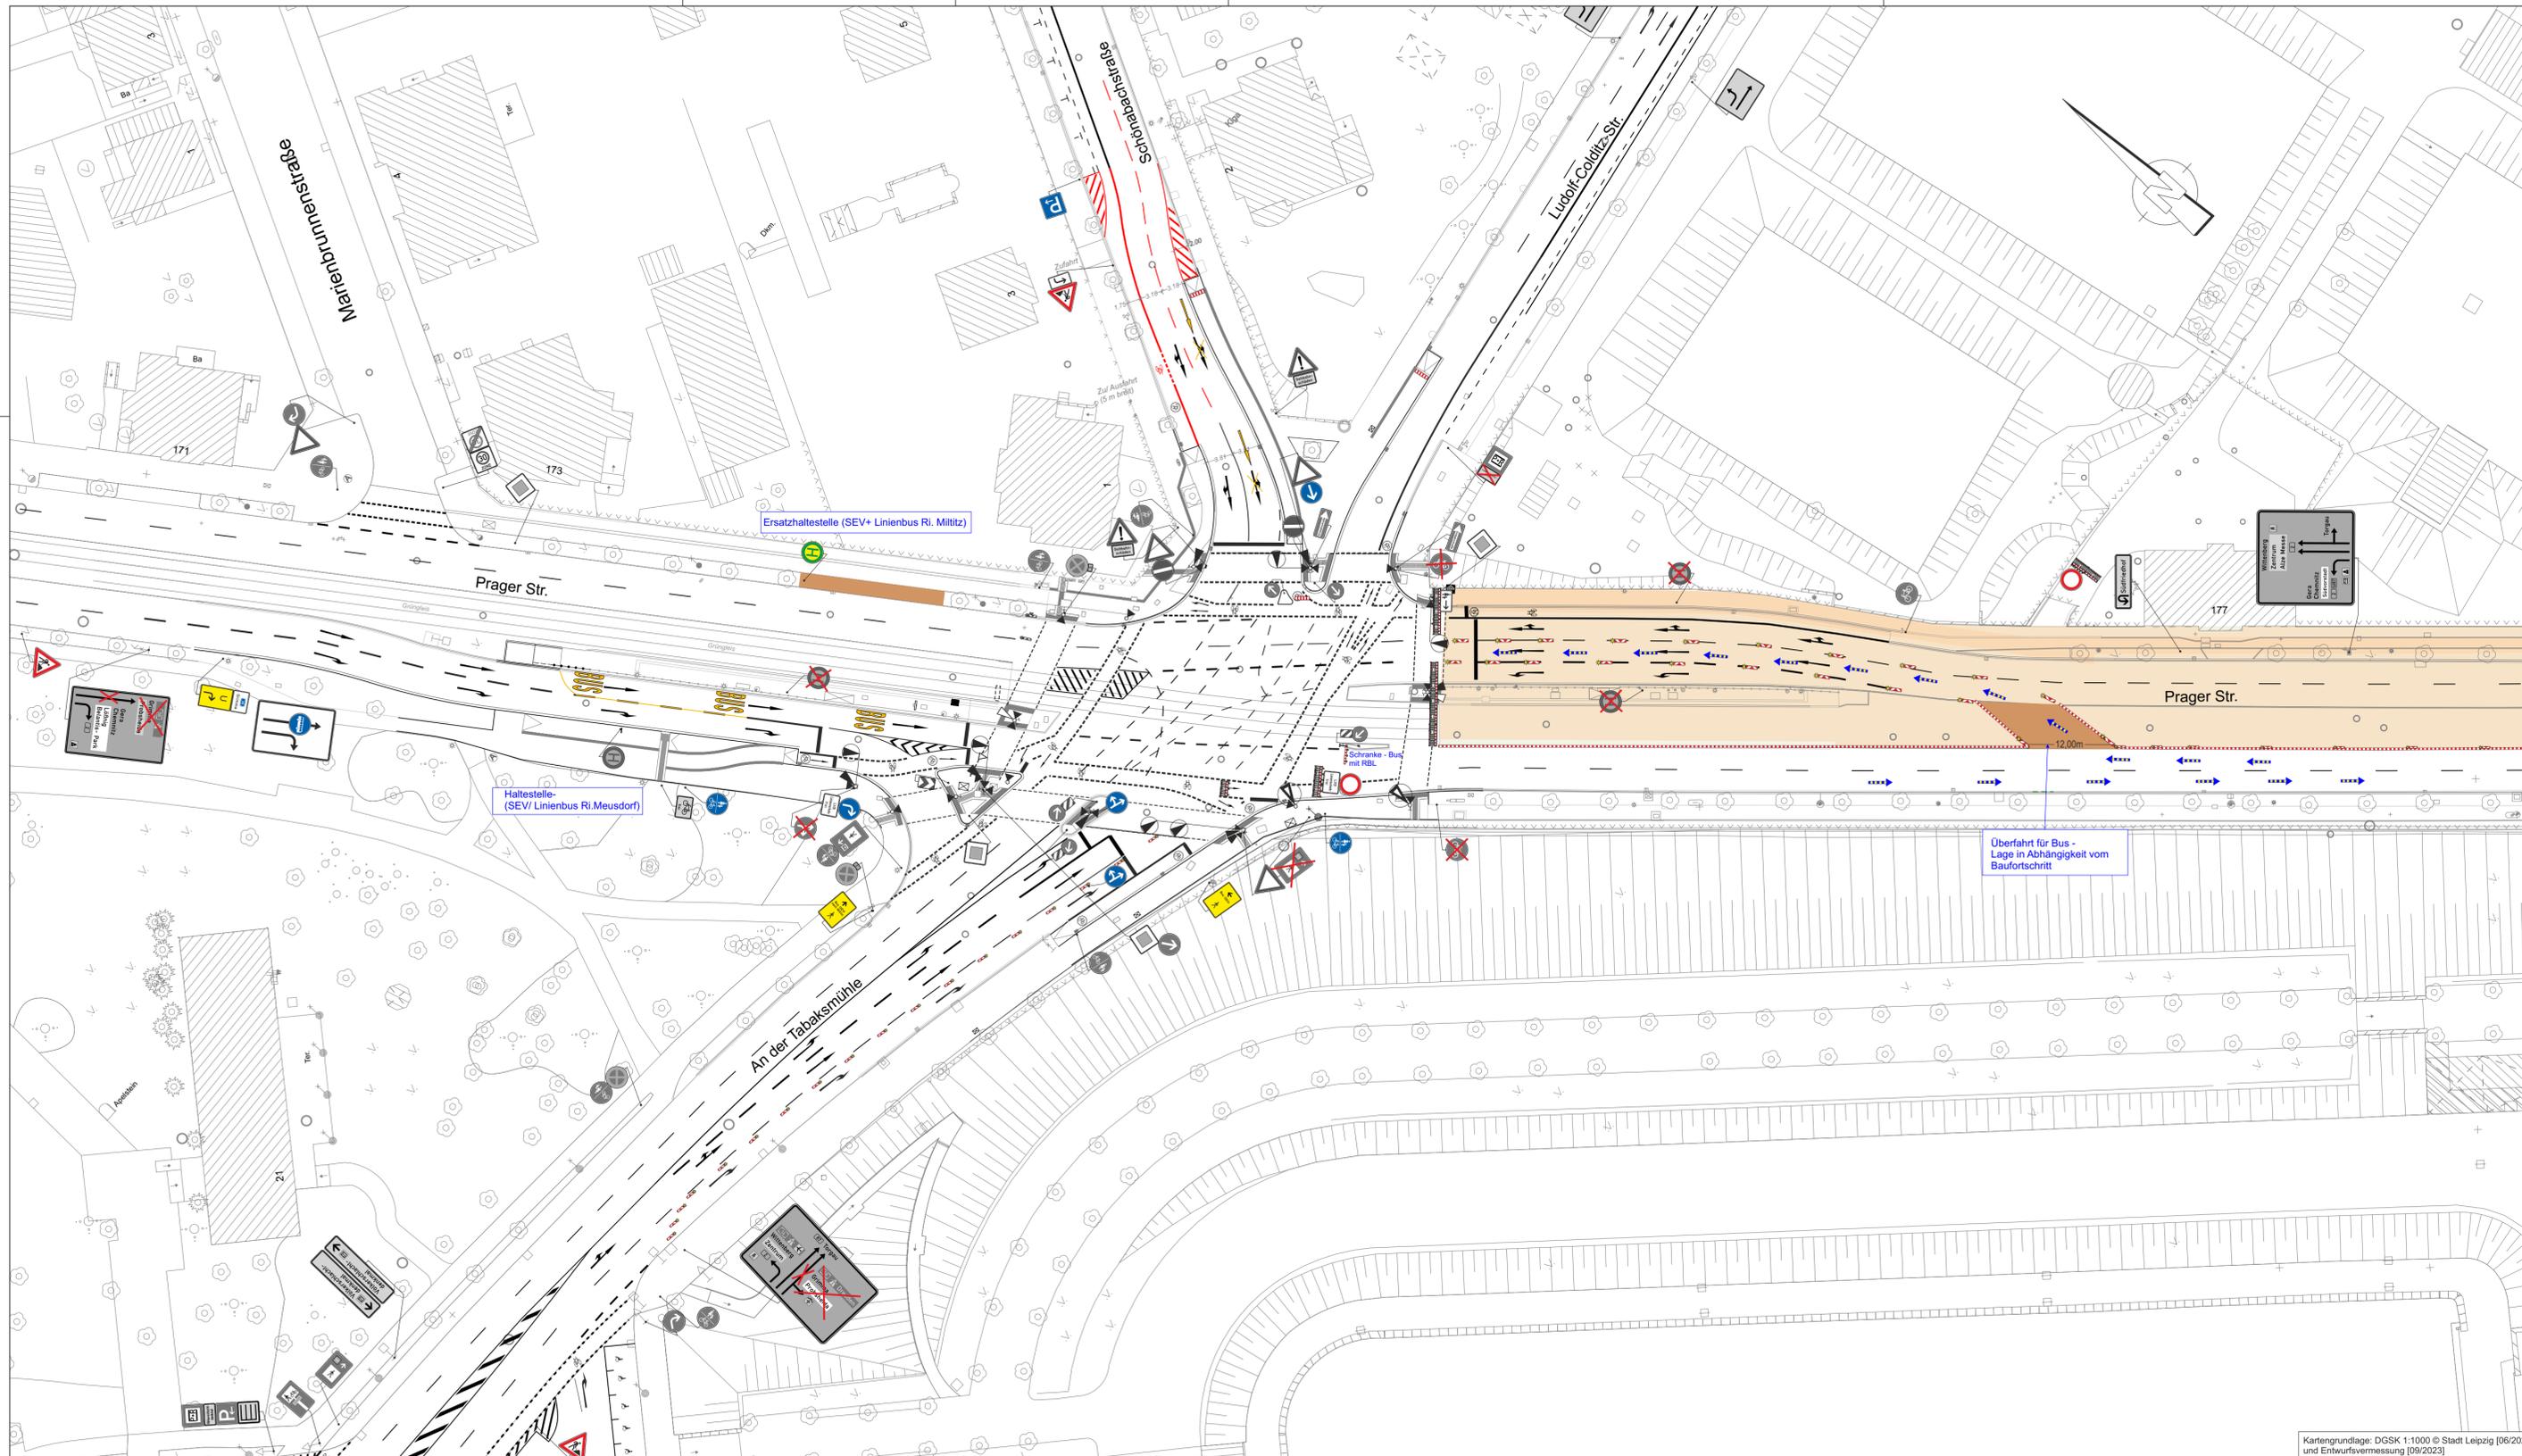

- Temporäre Beschilderung
- Stationäre Beschilderung
- stationäre Beschilderung während der Bauzeit abdecken
- Zonen für Haltverbote (V.83/V.26) inkl. 1-2 Zusatzzeichen 3 volle Tage vor Baubeginn stellen
 - ca. 30m
 - ca. 30m
 - ca. 30m
 - ca. 30m
- Schienensatzverkehr (SEV) / Bus
- Baufeld-/ Verkehrssicherungsbereiche (die auszuführenden Bauleistungen und deren zeitliche Abfolge sind den Bauphasenplänen und dem Grobbauplan zu entnehmen)
- temporäre Befestigungen auf Grünflächen, im Gleisbereich etc.
- Wanderbaustelle für Arbeiten an den Schächten/Leuchte etc. im Verkehrsbereich - Länge zwischen 5,0m -max.10,0 m; Durchfahrtsbreite von min. 3,0 m muss stets gewährleistet werden.

Dem Fußgänger/ Radfahrerverkehr ist, sofern nicht anders ausgewiesen, eine mind. 1,5m breite, gesicherte, behindertengerechte befestigte Trasse zum Queren des Baufeldes vorzuhalten. Vorh. Grünstreifen im Querbereich sind ebenfalls temp. zu befestigen. An den Bordkanten sind entspr. Anrampung vorzusehen. Die Querung über offene Leistungsgräben ist sicherzustellen (z.B. Fußgängerbrücke, Überfahrplatten- rutschfest!). Die Lage der kann in Abhängigkeit vom Baufortschritt variieren.

Das Erreichen der Grundstücke mit Kraftfahrzeugen ist außerhalb von Zeiten der Bautätigkeit (abends, nachts und an den Wochenenden) im Rahmen des Baufortschritts zu ermöglichen.

Für Rettungsfahrzeuge ist stets eine mindestens 3,00 m breite, befestigte und gesicherte Trasse im Bereich der Baufelder vorzuhalten. Kopfächer/ Gräben müssen ggf. unverzüglich mit Stahlplatten/ Überfahrplatten abzudecken sein. Entsprechendes Gerät ist ständig vorzuhalten. Im Bereich der Fahrgasse dürfen keine Materialien gelagert oder Baufahrzeuge abgestellt sein. In Zeiten der Bauruhe ist die Trasse so aufzubereiten das Fahrzeuge (bis ca. 16t) diese befahren können. Die Fahrgasse ist mit Baken (V605-42/43) in einem Abstand von ca. 5,0 m abzusichern! Dies gilt auch für notwendige Fahrgassen und Überfahrten durch den SEV/Bus!

Plan dient nur zu Kalkulationszwecken!

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
bearbeitet	05.11.24	HMa
Blattgröße:	900 x 420 mm	

Leipziger Verkehrsbetriebe
LVB GmbH
Georgiring 3 | 04103 Leipzig

Stadt Leipzig
Mobilitäts- und Tiefbauamt
Prager Straße 118-136 | 04317 Leipzig

Bauherr: **Prager Straße**
zwischen An der Tabaksmühle und Friedhofsgärtnerei
(P.-Nr. 90617)


Bauvorhaben: **Verkehrsführung während der Bauzeit**

Ausschreibungsunterlage: **Verkehrsführung während der Bauzeit** Maßstab: 1:500

Verkehrsführungsphase **1B** geplanter Zeitraum: 25.06.25-13.08.25

Baubereich Detailplan 1 Unterlage/ Blatt-Nr.: **VF1B-D01**

Kartengrundlage: DGSK 1:1000 © Stadt Leipzig [06/2023] und Entwurfsvermessung [09/2023]

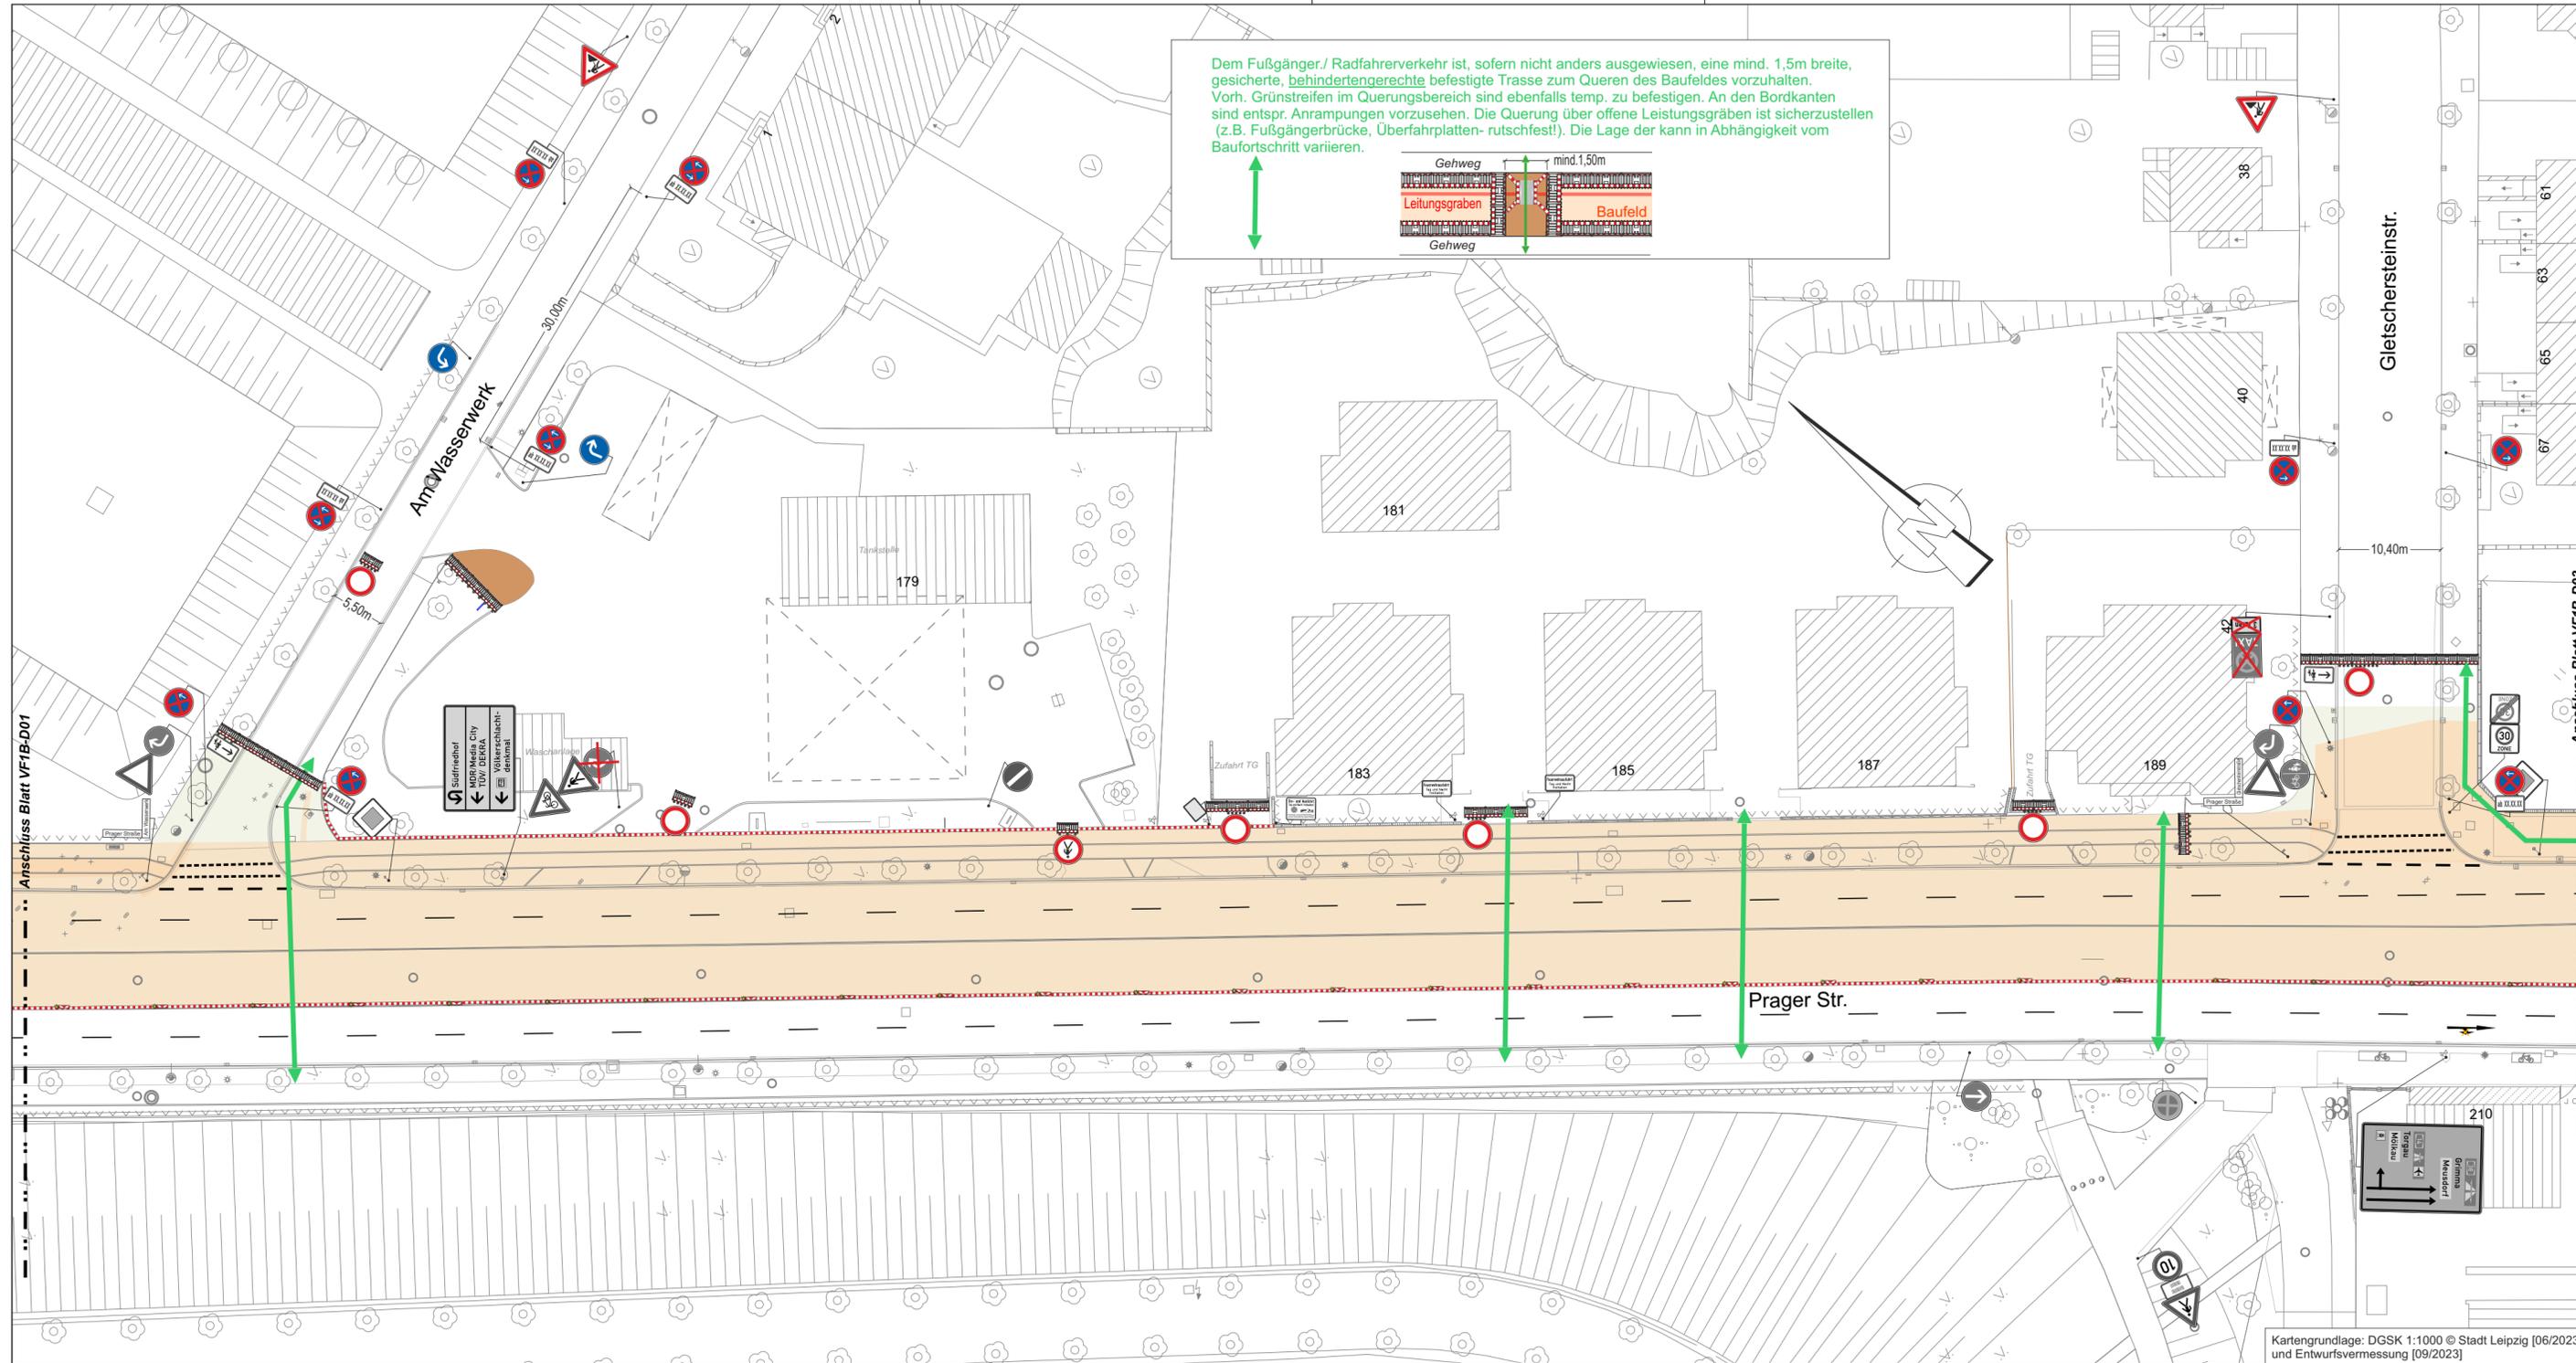

- Temporäre Beschilderung
- Stationäre Beschilderung
- stationäre Beschilderung während der Bauzeit abdecken
- Zonen für Haltverbote
Haltverbote (V.83/V.26) inkl. 1-2 Zusatzzeichen
3 volle Tage vor Baubeginn stellen
- Schienersatzverkehr (SEV) / Bus
- Baufeld-/ Verkehrssicherungsbereiche
(die auszuführenden Bauleistungen und deren zeitliche Abfolge sind den Bauphasenplänen und dem Grobbauplan zu entnehmen)
- temporäre Befestigungen auf Grünflächen, im Gleisbereich etc.
- Wanderbaustelle für Arbeiten an den Schächten/Leuchte etc.
im Verkehrsbereich - Länge zwischen 5,0m - max. 10,0 m;
Durchfahrtsbreite von min. 3,0 m muss stets gewährleistet werden.

Plan dient nur zu Kalkulationszwecken!

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name
		05.11.24	HMa

Blattgröße: 730 x 297 mm

Leipziger Verkehrsbetriebe
LVB GmbH
Georgiring 3 | 04103 Leipzig

Stadt Leipzig
Mobilitäts- und Tiefbauamt
Prager Straße 118-136 | 04317 Leipzig

Bauherr: **Stadt Leipzig**

Bauvorhaben: **Prager Straße**
zwischen An der Tabakmühle und Friedhofsgärtnerei
(P.-Nr. 90617)

Ausschreibungsunterlage: **Verkehrsführung während der Bauzeit**



Verkehrsführungsphase **1B** geplanter Zeitraum: 25.06.25-13.08.25

Baubereich Detailplan 2

Maßstab: 1:500
Unterlage/ Blatt-Nr.: VF1B-D02

Kartengrundlage: DGSK 1:1000 © Stadt Leipzig [06/2023] und Entwurfsvermessung [09/2023]

Dem Fußgänger-/ Radfahrerverkehr ist, sofern nicht anders ausgewiesen, eine mind. 1,5m breite, gesicherte, behindertengerechte befestigte Trasse zum Queren des Baufeldes vorzuhalten. Vorh. Grünstreifen im Querungsbereich sind ebenfalls temp. zu befestigen. An den Bordkanten sind entspr. Anrampungen vorzusehen. Die Querung über offene Leistungsrinnen ist sicherzustellen (z.B. Fußgängerbrücke, Überfahrplatten- rutschfest!). Die Lage der kann in Abhängigkeit vom Baufortschritt variieren.

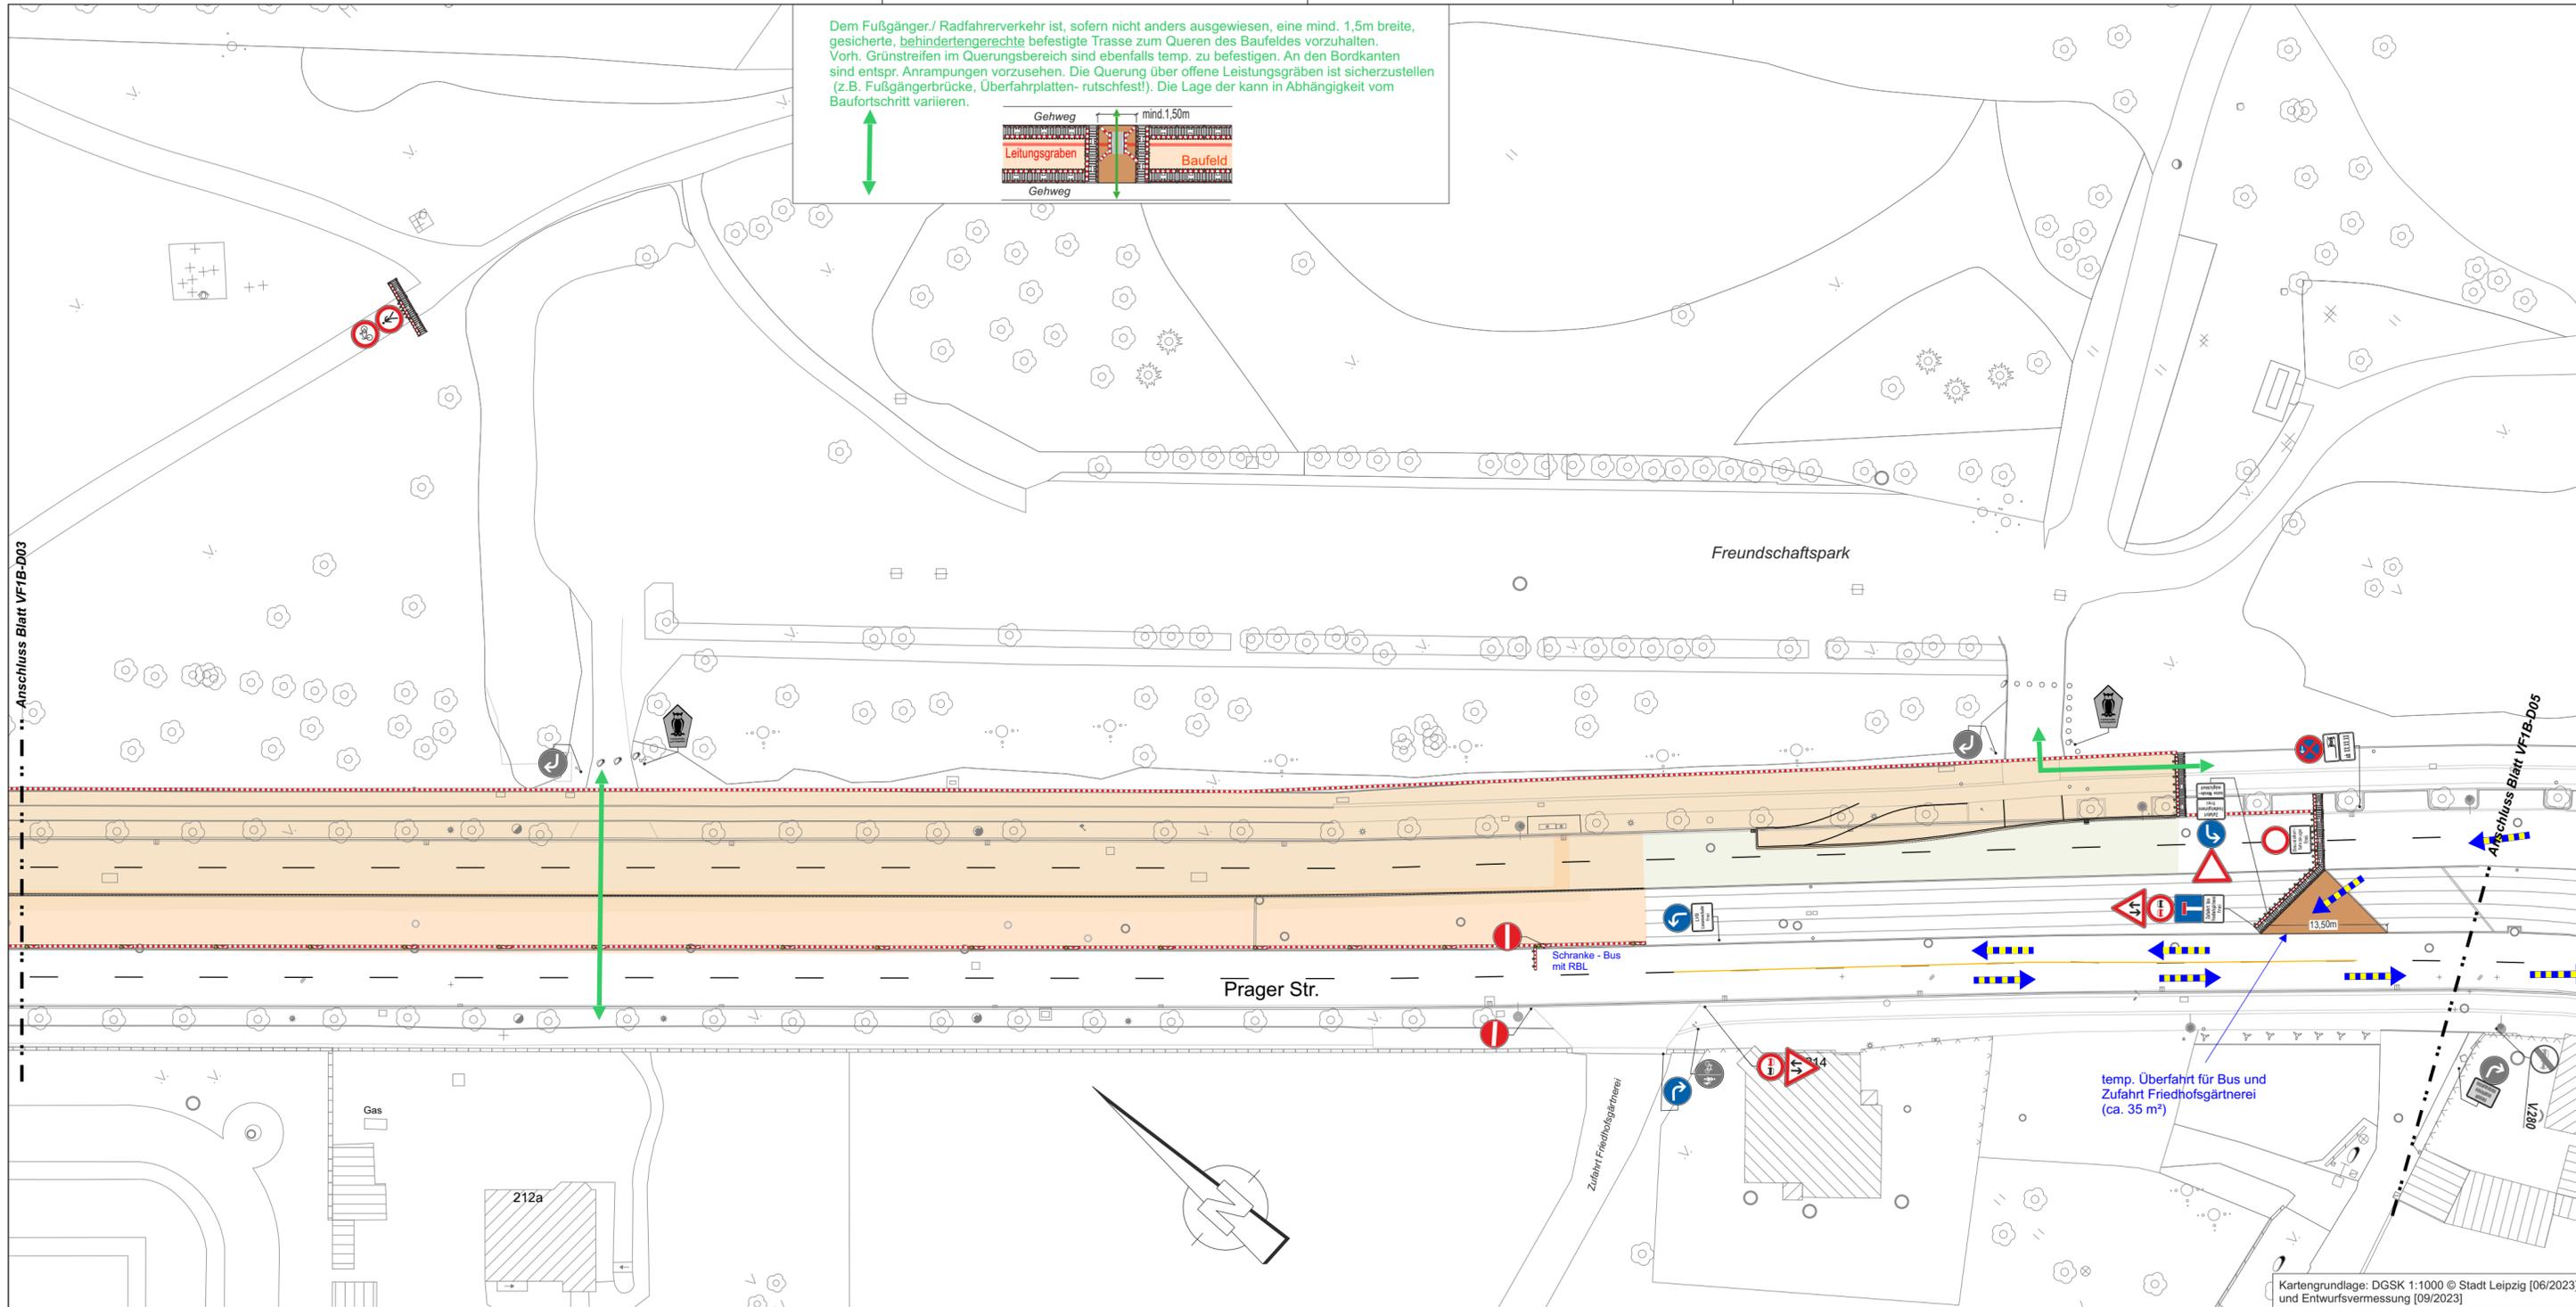

- Temporäre Beschilderung
- Stationäre Beschilderung
- stationäre Beschilderung während der Bauzeit abdecken
- Zonen für Haltverbote
Haltverbote (V.83/V.26) inkl. 1-2 Zusatzzeichen
3 volle Tage vor Baubeginn stellen
- Schienersatzverkehr (SEV) / Bus
- Baufeld-/ Verkehrssicherungsbereiche
(die auszuführenden Bauleistungen und deren zeitliche Abfolge sind den Bauphasenplänen und dem Grobabaufplan zu entnehmen)
- temporäre Befestigungen auf Grünflächen, im Gleisbereich etc.
- Wanderbaustelle für Arbeiten an den Schächten/Leuchte etc.
im Verkehrsbereich - Länge zwischen 5,0m - max.10,0 m;
Durchfahrtsbreite von min. 3,0 m muss stets gewährleistet werden.

Plan dient nur zu Kalkulationszwecken!

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name
	bearbeitet	05.11.24	HMa
Blattgröße:		750 x 297 mm	

Leipziger Verkehrsbetriebe
LVB GmbH
Georgiring 3 | 04103 Leipzig

Stadt Leipzig
Mobilitäts- und Tiefbauamt
Prager Straße 118-136 | 04317 Leipzig

Bauherr:

Prager Straße
zwischen An der Tabakmühle und Friedhofsgärtnerei
(P.-Nr. 90617)

Bauvorhaben:	Ausschreibungsunterlage	Verkehrsführung während der Bauzeit	Maßstab:
Verkehrsführungsphase 1B	geplanter Zeitraum: 25.06.25-13.08.25		1:500
Baubereich Detailplan 4			Unterlage/ Blatt-Nr.: VF1B-D 04

Kartengrundlage: DGSK 1:1000 © Stadt Leipzig [06/2023] und Entwurfsvermessung [09/2023]



- Temporäre Beschilderung
- Stationäre Beschilderung
- stationäre Beschilderung während der Bauzeit abdecken
- Zonen für Haltverbote
Haltverbote (V.83/V.26) inkl. 1-2 Zusatzzeichen
3 volle Tage vor Baubeginn stellen
- Schienersatzverkehr (SEV) / Bus
- Baufeld-/ Verkehrssicherungsbereiche
(die auszuführenden Bauleistungen und deren zeitliche Abfolge sind den Bauphasenplänen und dem Grobbauplan zu entnehmen)
- temporäre Befestigungen auf Grünflächen, im Gleisbereich etc.
- Wanderbaustelle für Arbeiten an den Schächten/Leuchte etc.
im Verkehrsbereich - Länge zwischen 5,0m - max.10,0 m;
Durchfahrtsbreite von min. 3,0 m muss stets gewährleistet werden.

Plan dient nur zu Kalkulationszwecken!

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name
	bearbeitet	05.11.24	HMa
Blattgröße:		800 x 297 mm	

Leipziger Verkehrsbetriebe LVB GmbH
 Georgiring 3 | 04103 Leipzig

Stadt Leipzig
 Mobilitäts- und Tiefbauamt
 Prager Straße 118-136 | 04317 Leipzig

Bauherr:

Prager Straße
zwischen An der Tabakmühle und Friedhofsgärtnerei
(P.-Nr. 90617)

Bauvorhaben:

Ausschreibungsunterlage	Verkehrsführung während der Bauzeit	Maßstab:
Verkehrsführungsphase 1B	geplanter Zeitraum: 25.06.25-13.08.25	1:500
Baubereich Detailplan 5		Unterlage/ Blatt-Nr.: VF1B-D 05


Kartengrundlage: DGSK 1:1000 © Stadt Leipzig [06/2023] und Entwurfsvermessung [09/2023]

Straßenbahnvollsperrung : 14.04.2025 - 14.11.2025

Ferien:
 18.04.25 - 25.04.25 - Osterferien
 28.06.25 - 08.08.25 - Sommerferien
 06.10.25 - 18.10.25 - Herbstferien

-  Umleitung MIV
-  LVB/ Bus/ SEV durch Baubereich
-  Baufeld
-  Standorte temp. Plantafeln
-  Standorte stationäre Wegweisung
-  Zonen für Haltverbote (Stellung beidseitig)
 Haltverbote (V.83/V.26) inkl. 1-2 Zusatzzeichen
 3 volle Tage vor Baubeginn stellen und aller 30 m wiederholen

-  stat. LSA
-  Untersuchung/Anpassung stat. LSA
-  temp. LSA

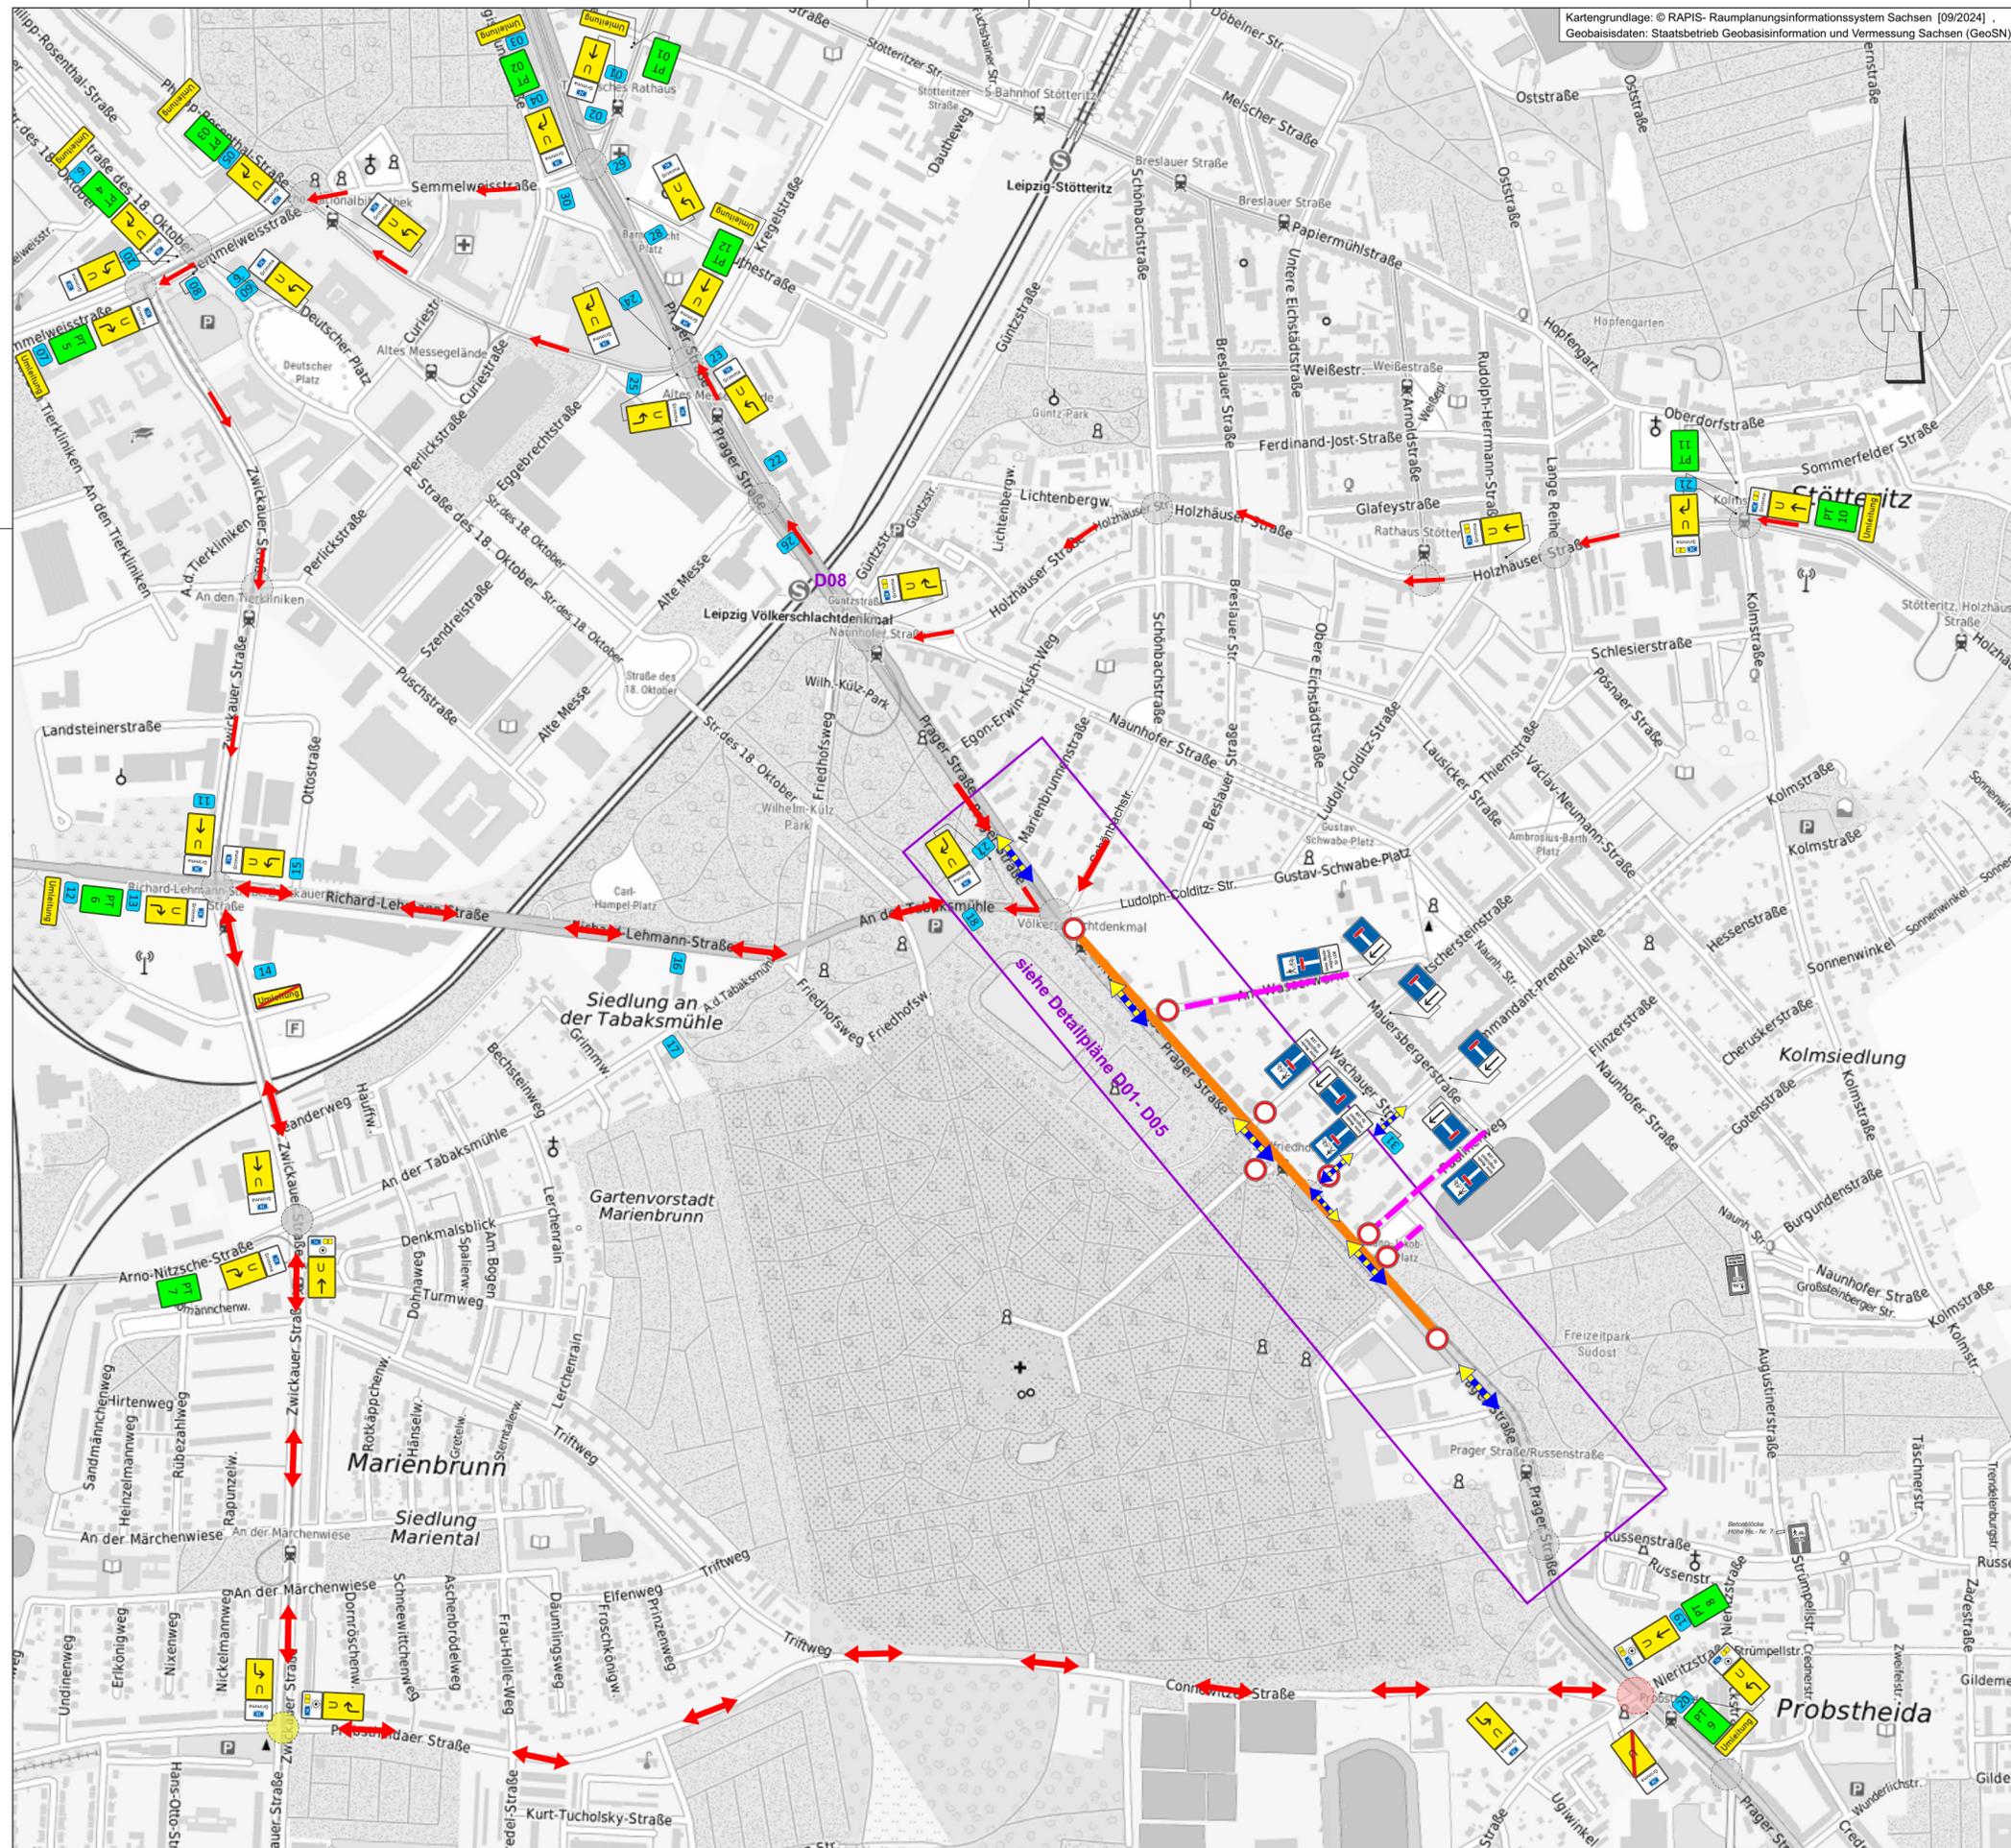

Plan dient nur zu Kalkulationszwecken!

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name
		05.11.25	HMa
Blattgröße:		640 x 420	

Leipziger Verkehrsbetriebe
 LVB GmbH
 Georgiring 3 | 04103 Leipzig


Stadt Leipzig
 Mobilitäts- und Tiefbauamt
 Prager Straße 118-136 | 04317 Leipzig

Bauherr:



Prager Straße
 zwischen An der Tabakmühle und Friedhofsgärtnerei
 (P-Nr. 90617)

Bauvorhaben:	Verkehrsführung während der Bauzeit	Maßstab:
Ausschreibungsunterlage	geplanter Zeitraum: 25.06.25 - 13.08.25	ohne
Verkehrsführungsphase 1B	Umleitungsführung	Unterlage/ Blatt-Nr.: VF1B-U-01



Riebeckstraße vor Prager Straße

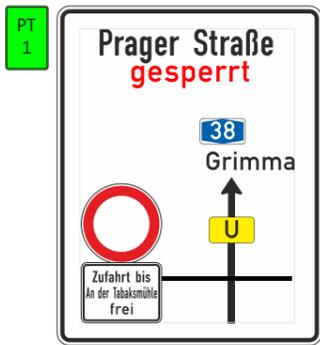

Prager Straße vor Semmelweisstraße

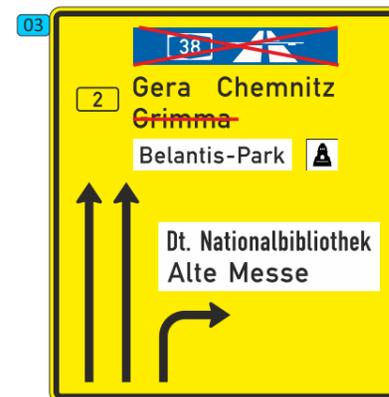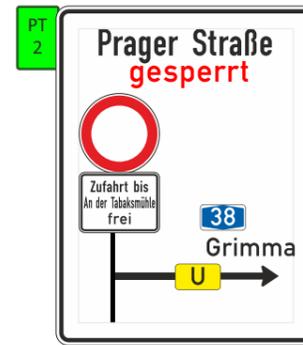


Philipp-Rosenthal-Str. vor Semmelweisstraße (Zuf. Nord)

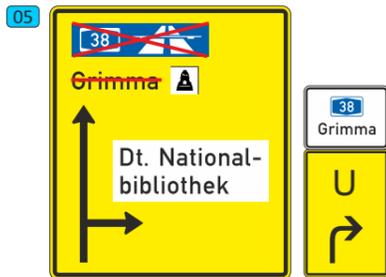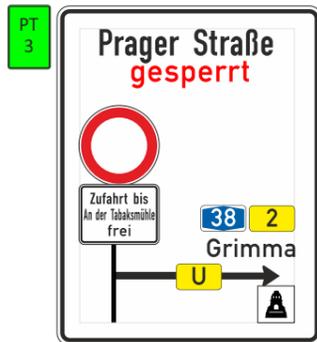



Philipp-Rosenthal-Str. vor Semmelweisstraße (Zuf. Süd)



Straße des 18. Oktober vor Semmelweisstraße

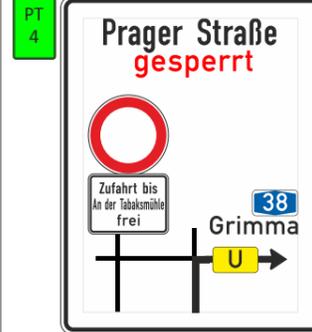


Semmelweisstraße vor Zwickauer Str.

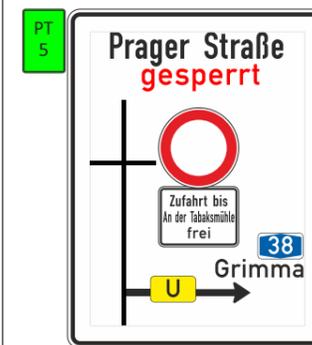


Semmelweisstr. vor Str. 18. Oktober (Zuf. West)




Deutscher Platz vor Semmelweisstr.

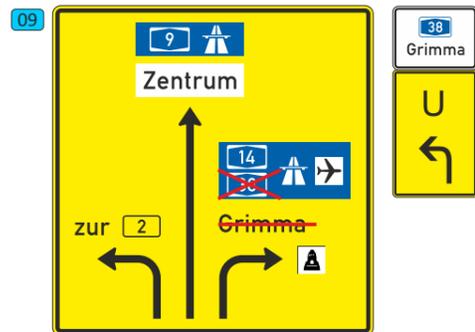


Semmelweisstr. vor Zwickauer Str. (Zuf. Ost)

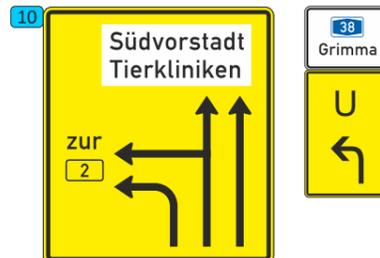

Zwickauer Str. vor R.-Lehmann-Str. (Zuf. Nord)

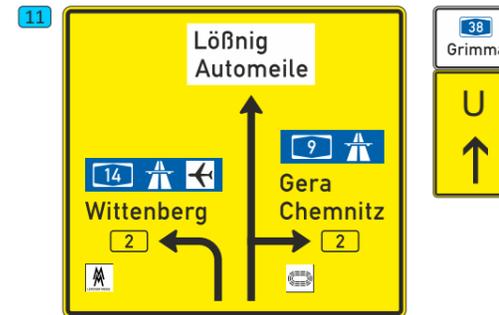

Richard-Lehmann-Str. vor Zwickauer Str. (Zuf. West)

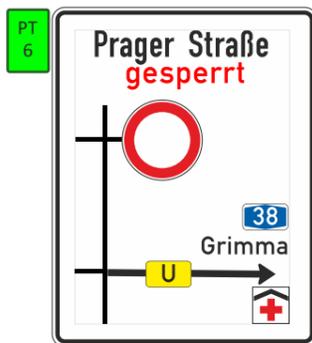

PT XX XX *
Kennzeichnung von Änderungen ggü. VF-Ph 1A

Leipziger Verkehrsbetriebe
LVB GmbH
Georgiring 3 | 04103 Leipzig

Stadt Leipzig
Mobilitäts- und Tiefbauamt
Prager Straße 118-136 | 04317 Leipzig

Prager Straße
zwischen An der Tabaksmühle und Friedhofsgärtnerei
(P.-Nr. 90617)


Bauherr: Leipziger Verkehrsbetriebe LVB GmbH
Georgiring 3 | 04103 Leipzig

Bauvorhaben: Ausschreibungsunterlage
Verkehrsführung während der Bauzeit
Verkehrsführungsphase (VF-Ph) 1B
Umleitungsbeschilderung- Details zu Plankarten, Wegweisern und Zusatzzeichen für V.455


geplante Bauzeit: 25.06.25-13.08.25

bearbeitet/ Name: HMa Maßstab: ohne Blattgröße: A3 Datum/Stand: 05.11.24 Unterlage/ Blatt-Nr.: 1B-U02


Kregelstraße vor Prager Str.

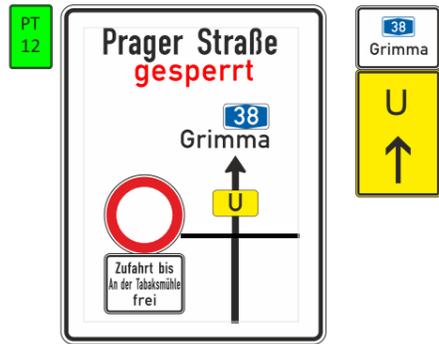

Prager Str. vor Kregelstr.

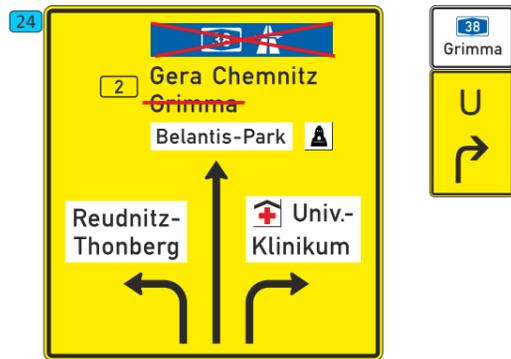

Philipp-Rosenthal-Str. vor Prager Str.

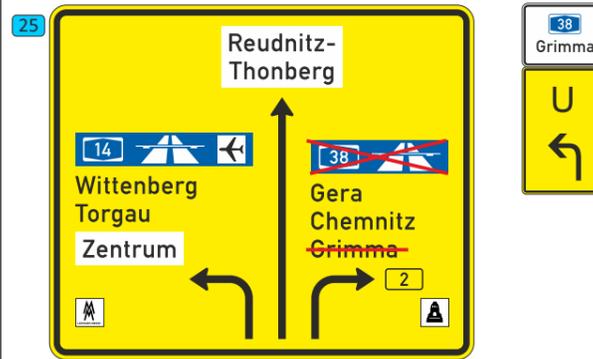


Prager Str. vor Friedhofsweg



Prager Str. vor An der Tabaksmühle




Prager Str. vor Riebeckstr.

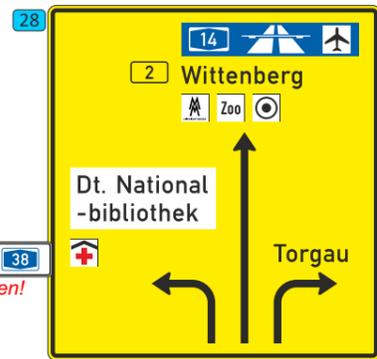

Reiter mobil anbringen!

Semmelweisstr. vor Prager Str.

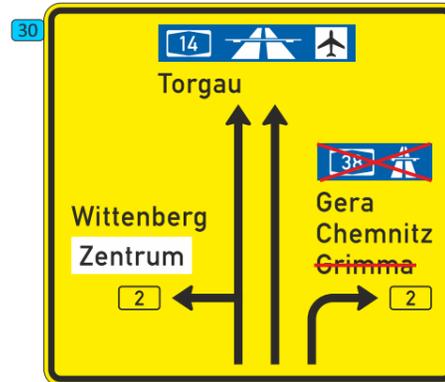


Kommandant-Prendel-Allee vor Prager Str.



Leipziger Verkehrsbetriebe LVB GmbH Georgiring 3 04103 Leipzig		Stadt Leipzig Mobilitäts- und Tiefbauamt Prager Straße 118-136 04317 Leipzig	
Prager Straße zwischen An der Tabaksmühle und Friedhofsgärtnerei (P.-Nr. 90617)			
Ausschreibungsunterlage Verkehrsführung während der Bauzeit Verkehrsführungsphase (VF-Ph) 1B Umleitungsbeschilderung- Details zu Plankarten, Wegweisern und Zusatzzeichen für V.455			
geplante Bauzeit: 25.06.25-13.08.25			
bearbeitet/ Name: HMa	Maßstab: ohne	Blattgröße: A3	Datum/Stand: 05.11.24
		Unterlage/ Blatt-Nr.: 1B-U04	

Zwickauer Str. vor Richard-Lehmann-Str. (Zuf. Süd)

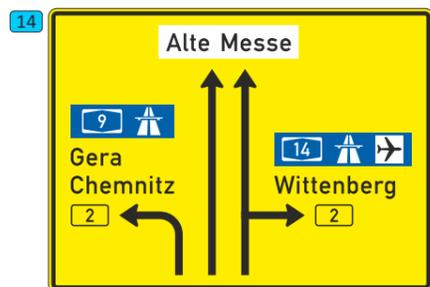


Richard-Lehmann-Str. vor Zwickauer Str. (Zuf. Ost)




Richard-Lehmann-Str. vor An der Tabakmühle



An der Tabakmühle vor Richard-Lehmann-Str.

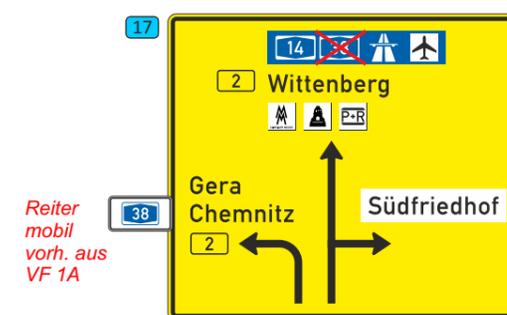


An der Tabakmühle vor Prager Str.

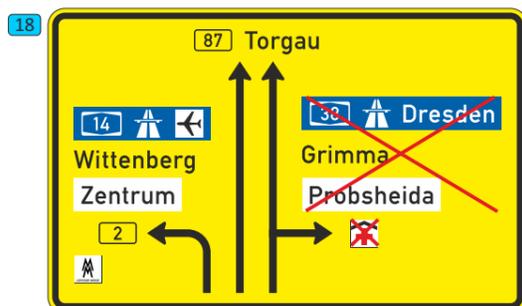

Zwickauer Str. vor Arno-Nitzsche-Str.



Arno-Nitzsche-Str. vor Zwickauer Str.

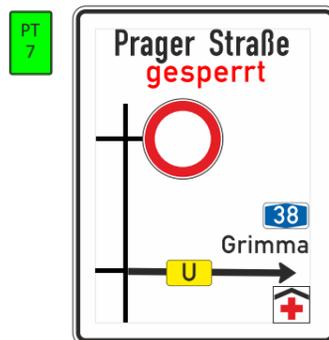

Zwickauer Str. vor An der Tabakmühle



Zwickauer Str. vor Probstheidaer Str. (Zuf. Nord)




Probstheidaer Str. vor Zwickauer Str. (Zuf. Ost)




Connewitzer Str. vor Dösener Str.




Nieritzstr. vor Prager Str.

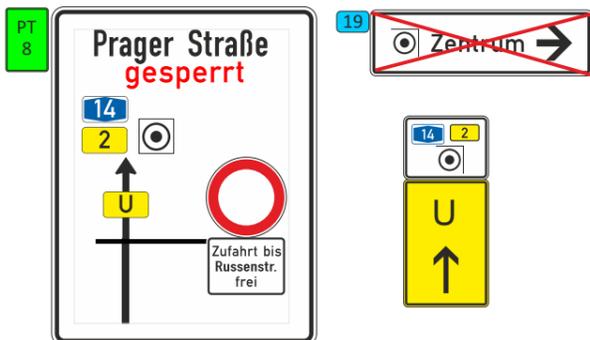


Prager Str. vor Nieritzstr.

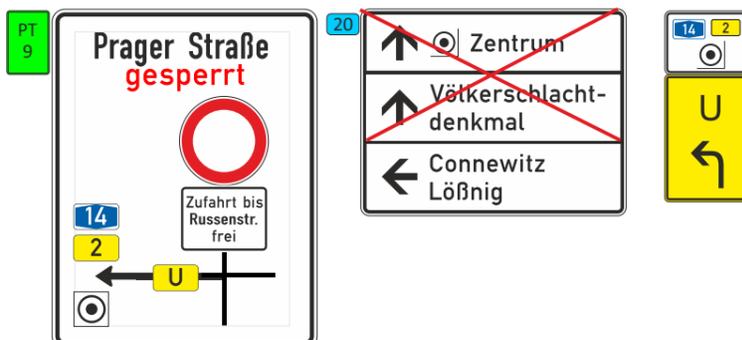

Holzhäuser Str. vor Sommerfelder Str.

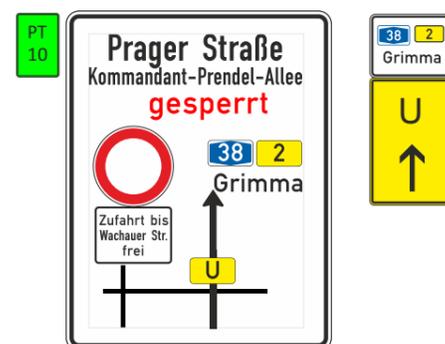

Zuckelhäuser Str. vor Holzhäuser Str.

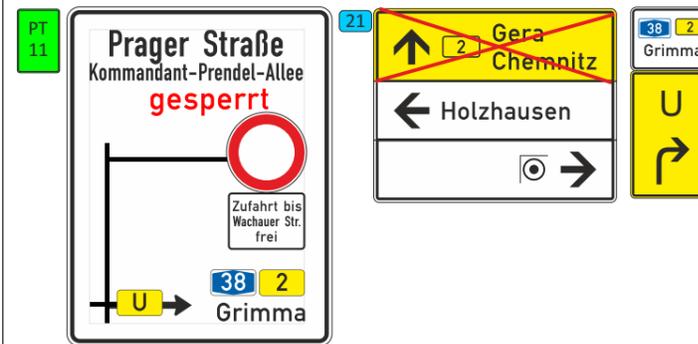


Holzhäuser Str. vor R.-Herrmann-Str.



Naunhofer Str. vor Prager Str.



Prager Str. vor Kregelstr. (Zuf. Süd)

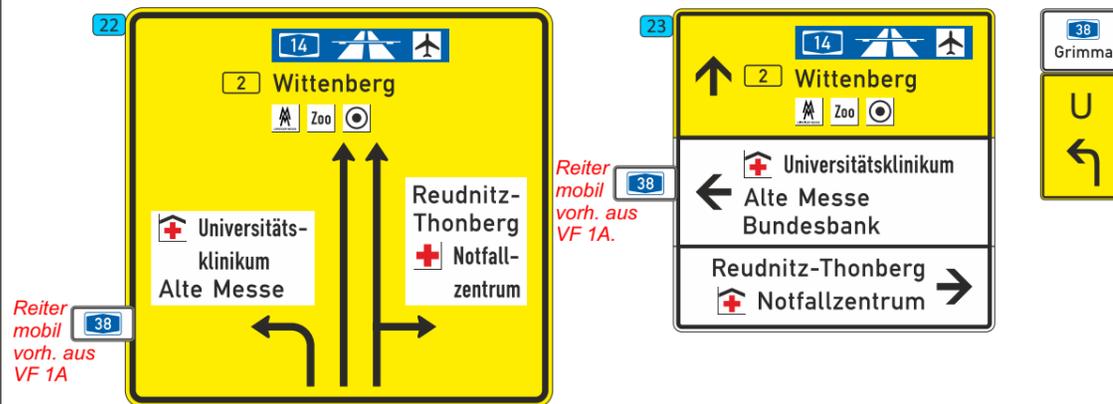

Leipziger Verkehrsetriebe
Leipziger Verkehrsbetriebe
 LVB GmbH
 Georgiring 3 | 04103 Leipzig


Stadt Leipzig
 Mobilitäts- und Tiefbauamt
 Prager Straße 118-136 | 04317 Leipzig

Prager Straße
 zwischen An der Tabakmühle und Friedhofsgärtnerei
 (P.-Nr. 90617)

Bauvorhaben:
 Ausschreibungsunterlage
 Verkehrsführung während der Bauzeit
 Verkehrsführungsphase (VF-Ph) 1B
 Umleitungsbeschilderung- Details zu Plankarten, Wegweisern und Zusatzzeichen für V.455

geplante Bauzeit:
 25.06.25-13.08.25

bearbeitet/ Name: HMa Maßstab: ohne Blattgröße: A3 Datum/Stand: 05.11.24 Unterlage/ Blatt-Nr.: 1B-U03

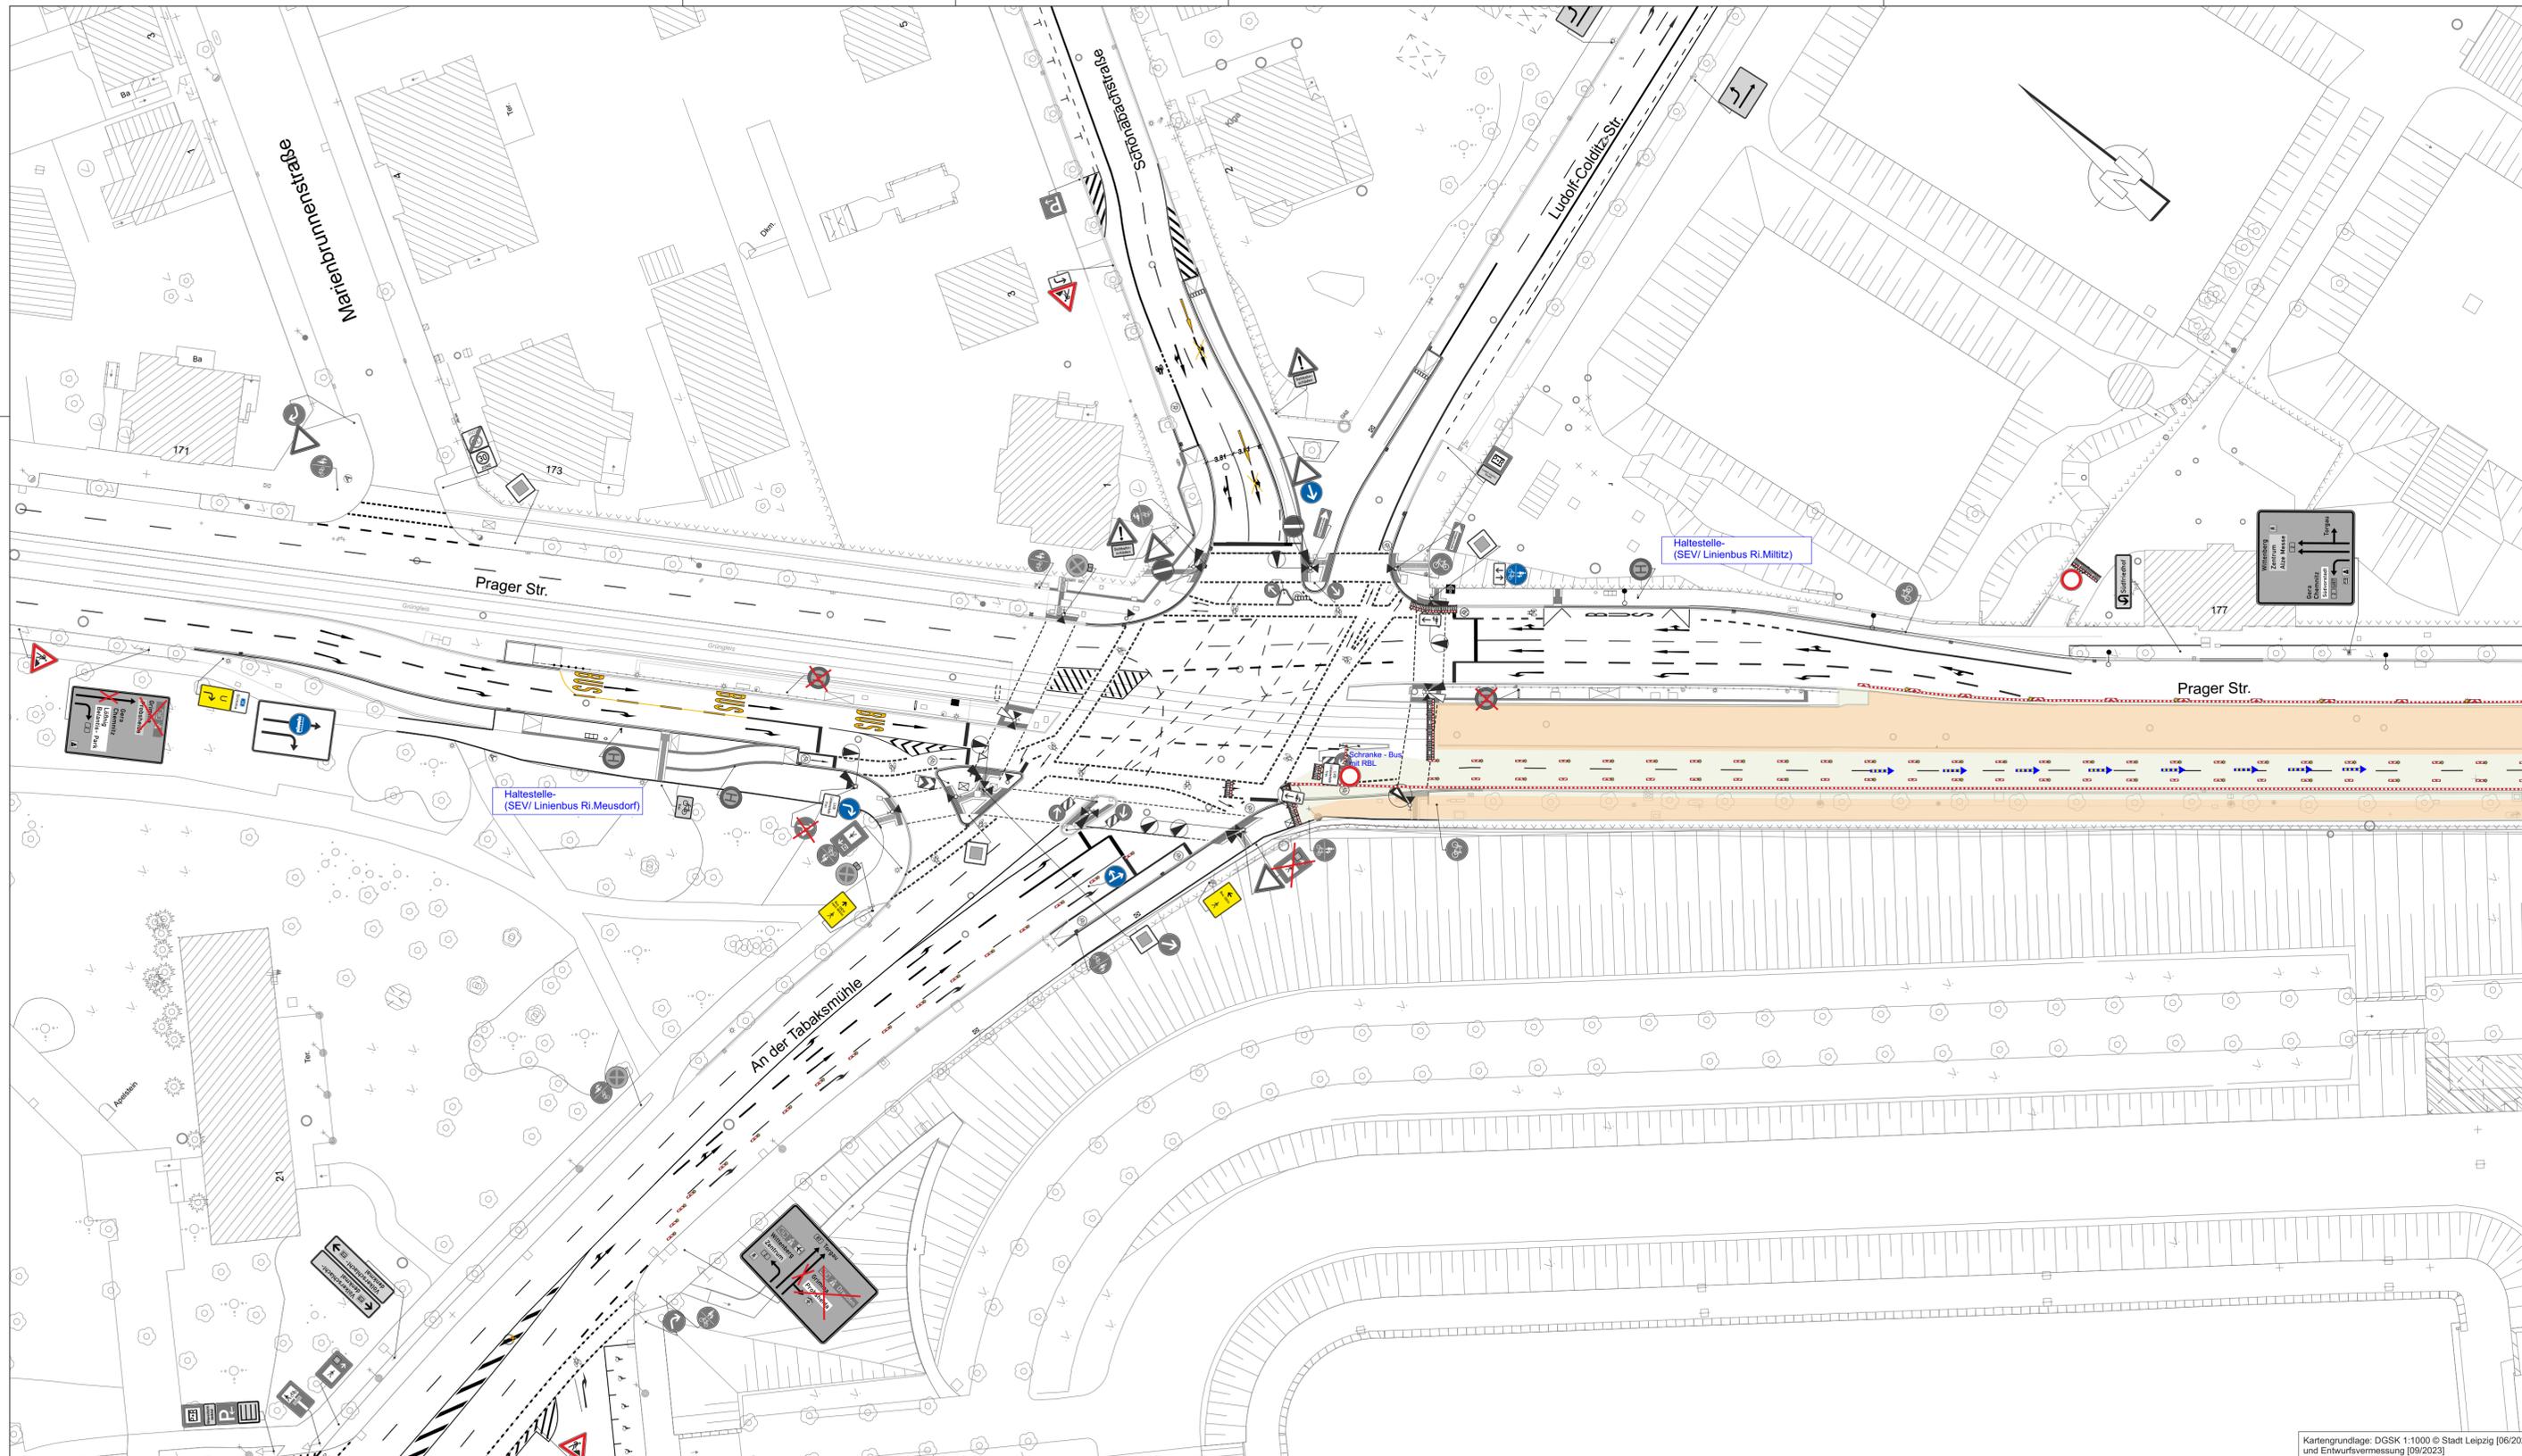

- Temporäre Beschilderung
- Stationäre Beschilderung
- stationäre Beschilderung während der Bauzeit abdecken
- Zonen für Haltverbote (V.83/V.26) inkl. 1-2 Zusatzzeichen
3 volle Tage vor Baubeginn stellen
- Schienersatzverkehr (SEV) / Bus
- Baufeld-/ Verkehrssicherungsbereiche
(die auszuführenden Bauleistungen und deren zeitliche Abfolge sind den Bauphasenplänen und dem Grobbauplan zu entnehmen)
- temporäre Befestigungen auf Grünflächen, im Gleisbereich etc.
- Wanderbaustelle für Arbeiten an den Schächten/Leuchte etc.
im Verkehrsbereich - Länge zwischen 5,0m -max.10,0 m;
Durchfahrtsbreite von min. 3,0 m muss stets gewährleistet werden.

Dem Fußgänger/ Radfahrerverkehr ist, sofern nicht anders ausgewiesen, eine mind. 1,5m breite, gesicherte, behindertengerechte befestigte Trasse zum Queren des Baufeldes vorzuhalten. Vorh. Grünstreifen im Querbereich sind ebenfalls temp. zu befestigen. An den Bordkanten sind entspr. Anrampung vorzusehen. Die Querung über offene Leistungsgräben ist sicherzustellen (z.B. Fußgängerbrücke, Überfahrplatten- rutschfest!). Die Lage der kann in Abhängigkeit vom Baufortschritt variieren.

Das Erreichen der Grundstücke mit Kraftfahrzeugen ist außerhalb von Zeiten der Bautätigkeit (abends, nachts und an den Wochenenden) im Rahmen des Baufortschritts zu ermöglichen.

Für Rettungsfahrzeuge ist stets eine mindestens 3,00 m breite , befestigte und gesicherte Trasse im Bereich der Baufelder vorzuhalten. Kopfächer/ Gräben müssen ggf. unverzüglich mit Stahlplatten/ Überfahrplatten abzudecken sein. Entsprechendes Gerät ist ständig vorzuhalten. Im Bereich der Fahrgasse dürfen keine Materialien gelagert oder Baufahrzeuge abgestellt sein. In Zeiten der Bauruhe ist die Trasse so aufzubereiten das Fahrzeuge (bis ca. 16t) diese befahren können. Die Fahrgasse ist mit Baken (V605-42/43) in einem Abstand von ca. 5,0 m abzusichern! Dies gilt auch für notwendige Fahrgassen und Überfahrten durch den SEV/Bus!

Plan dient nur zu Kalkulationszwecken!

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
bearbeitet	05.11.24	HMa
Blattgröße:	900 x 420 mm	

Leipziger Verkehrsbetriebe
LVB GmbH
Georgiring 3 | 04103 Leipzig


Stadt Leipzig
Mobilitäts- und Tiefbauamt
Prager Straße 118-136 | 04317 Leipzig

Bauherr:

Prager Straße
zwischen An der Tabakmühle und Friedhofsgärtnerei
(P.-Nr. 90617)

Bauvorhaben:	Ausschreibungsunterlage	Verkehrsführung während der Bauzeit	Maßstab:
Verkehrsführungsphase 1C	geplanter Zeitraum:	14.08.25-03.09.25	1:500
Baubereich Detailplan 1			Unterlage/ Blatt-Nr.: VF1C-D01

Kartengrundlage: DGSK 1:1000 © Stadt Leipzig [06/2023] und Entwurfsvermessung [09/2023]

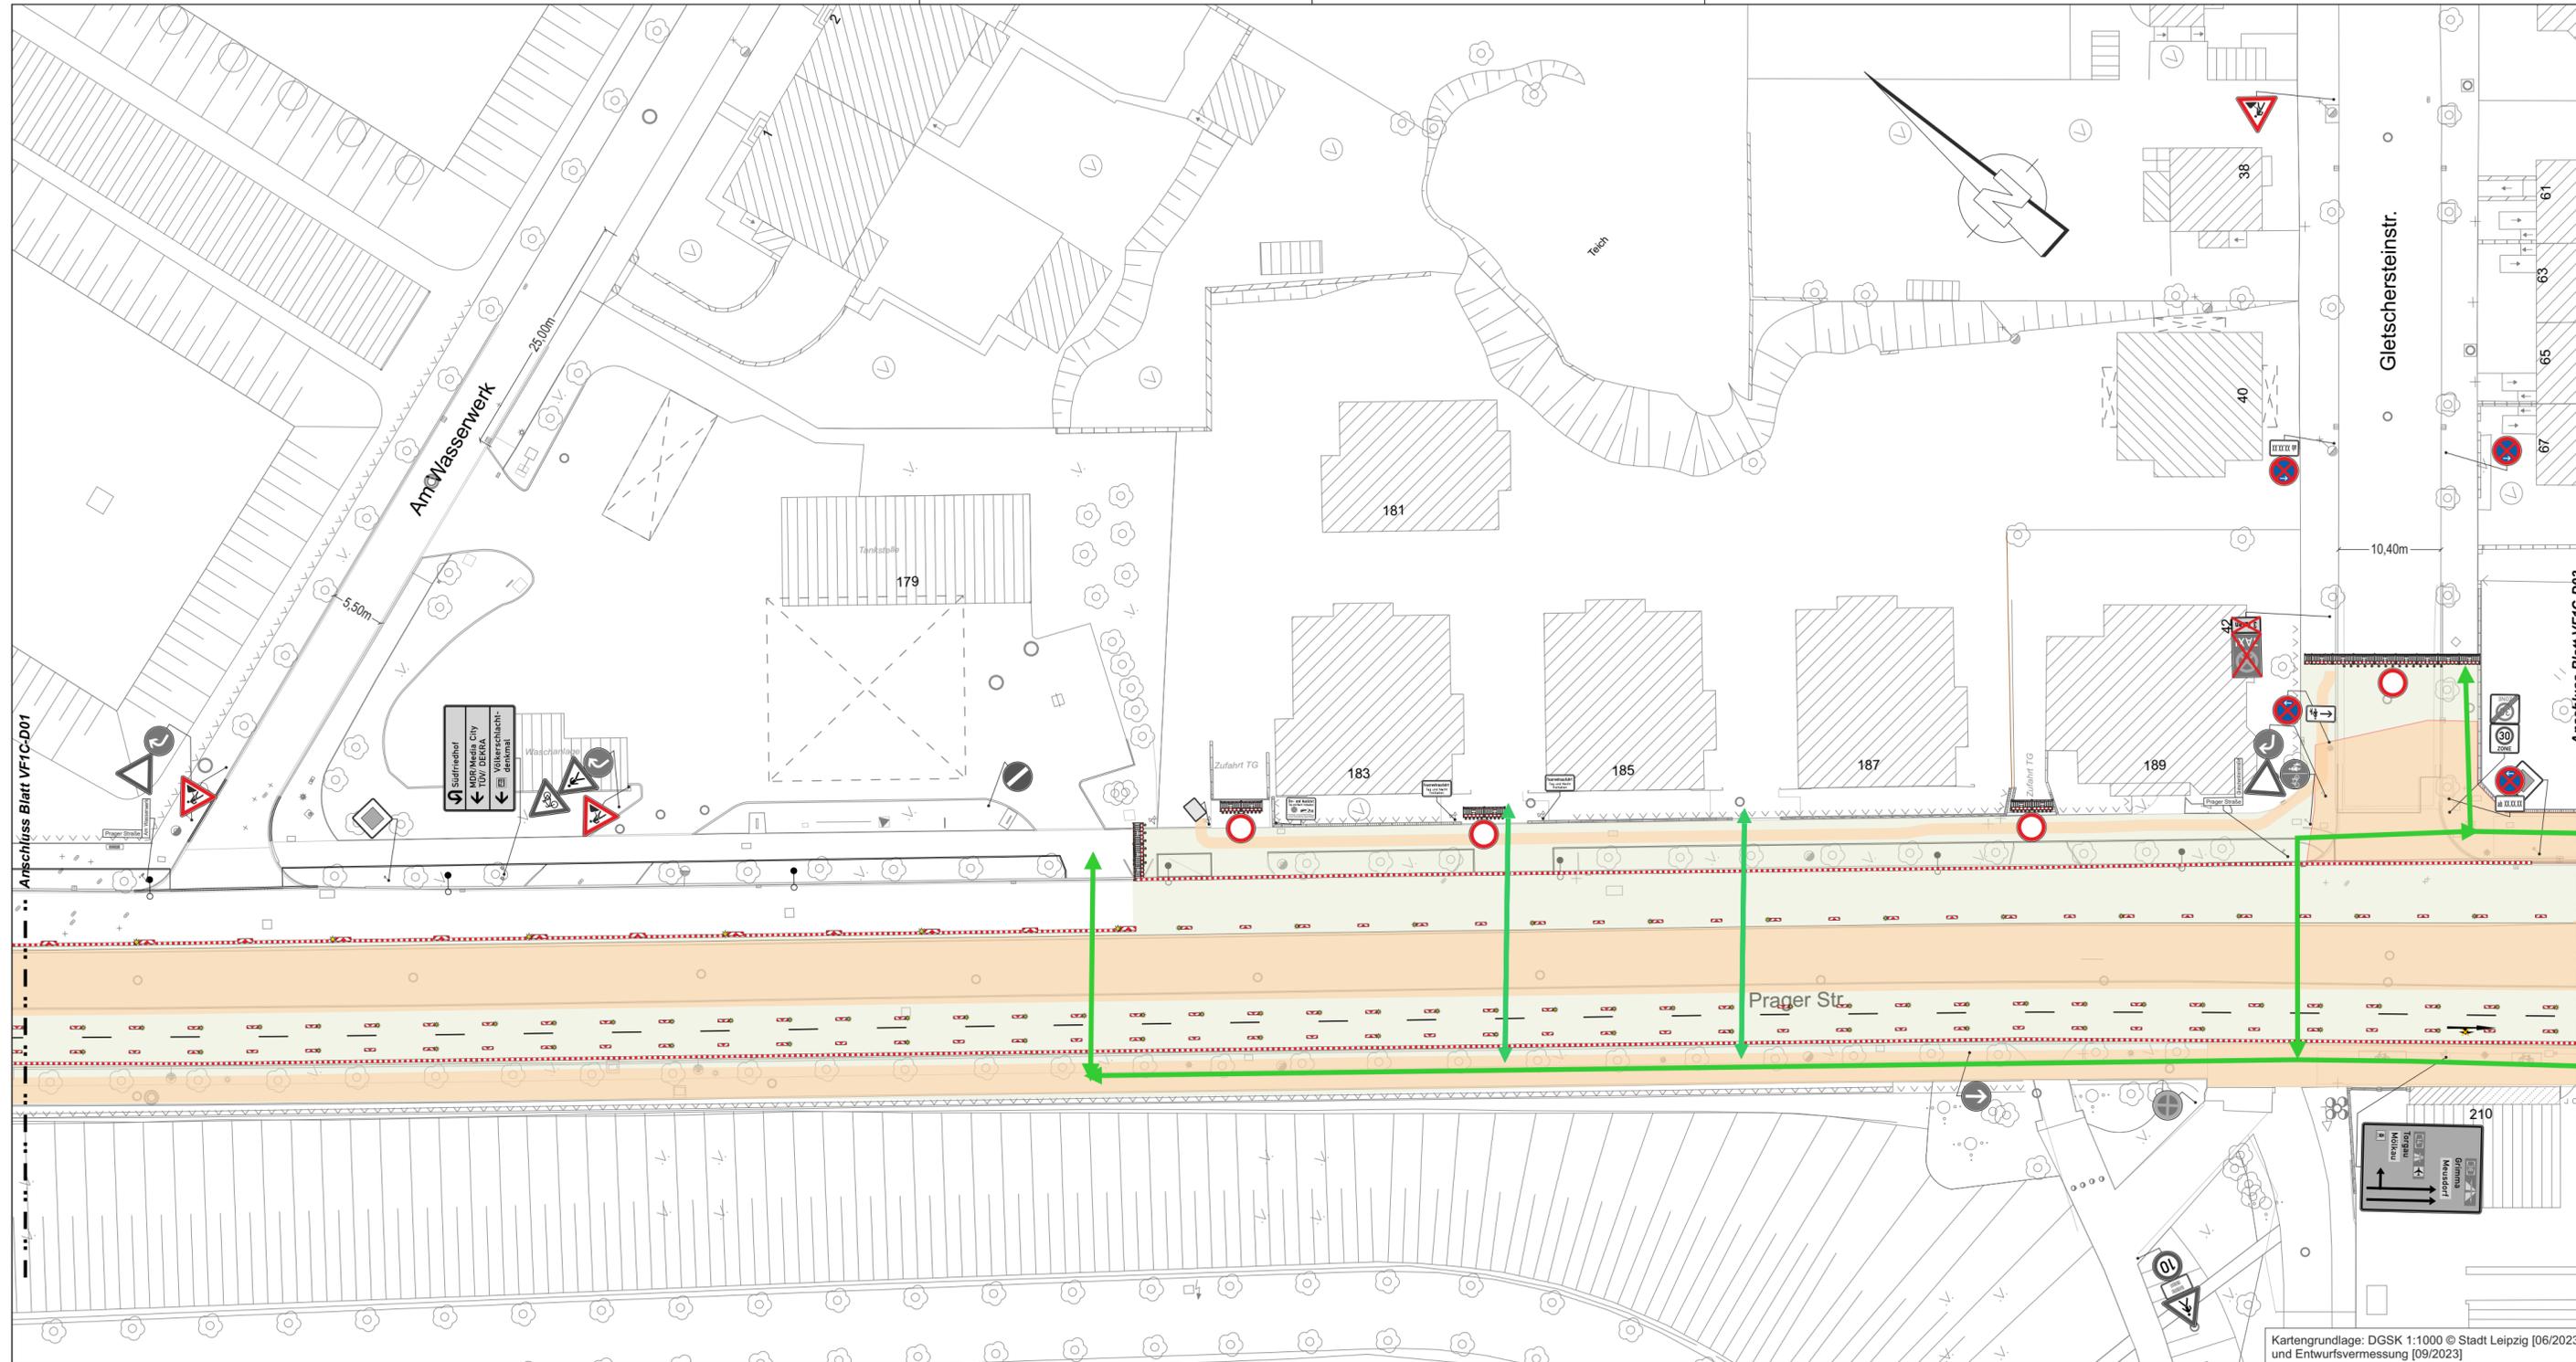

- Temporäre Beschilderung
- Stationäre Beschilderung
- stationäre Beschilderung während der Bauzeit abdecken
- Zonen für Haltverbote
Haltverbote (V.83/V.26) inkl. 1-2 Zusatzzeichen
3 volle Tage vor Baubeginn stellen
- Schienersatzverkehr (SEV) / Bus
- Baufeld-/ Verkehrssicherungsbereiche
(die auszuführenden Bauleistungen und deren zeitliche Abfolge sind den Bauphasenplänen und dem Grobbauplan zu entnehmen)
- temporäre Befestigungen auf Grünflächen, im Gleisbereich etc.
- Wanderbaustelle für Arbeiten an den Schächten/Leuchte etc.
im Verkehrsbereich - Länge zwischen 5,0m - max. 10,0 m;
Durchfahrtsbreite von min. 3,0 m muss stets gewährleistet werden.


Plan dient nur zu Kalkulationszwecken!

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
bearbeitet	05.11.24	HMa
Blattgröße:	730 x 297 mm	

 Leipziger Verkehrsbetriebe LVB GmbH Georgiring 3 04103 Leipzig	 Stadt Leipzig Mobilitäts- und Tiefbauamt Prager Straße 118-136 04317 Leipzig	
Bauherr:		
Prager Straße zwischen An der Tabakmühle und Friedhofsgärtnerei (P.-Nr. 90617)		
Bauvorhaben:		
Ausschreibungsunterlage	Verkehrsführung während der Bauzeit	Maßstab:
Verkehrsführungsphase 1C	geplanter Zeitraum: 14.08.25-03.09.25	1:500
Baubereich Detailplan 2		Unterlage/ Blatt-Nr.:
		VF1C-D02

Kartengrundlage: DGSK 1:1000 © Stadt Leipzig [06/2023] und Entwurfsvermessung [09/2023]

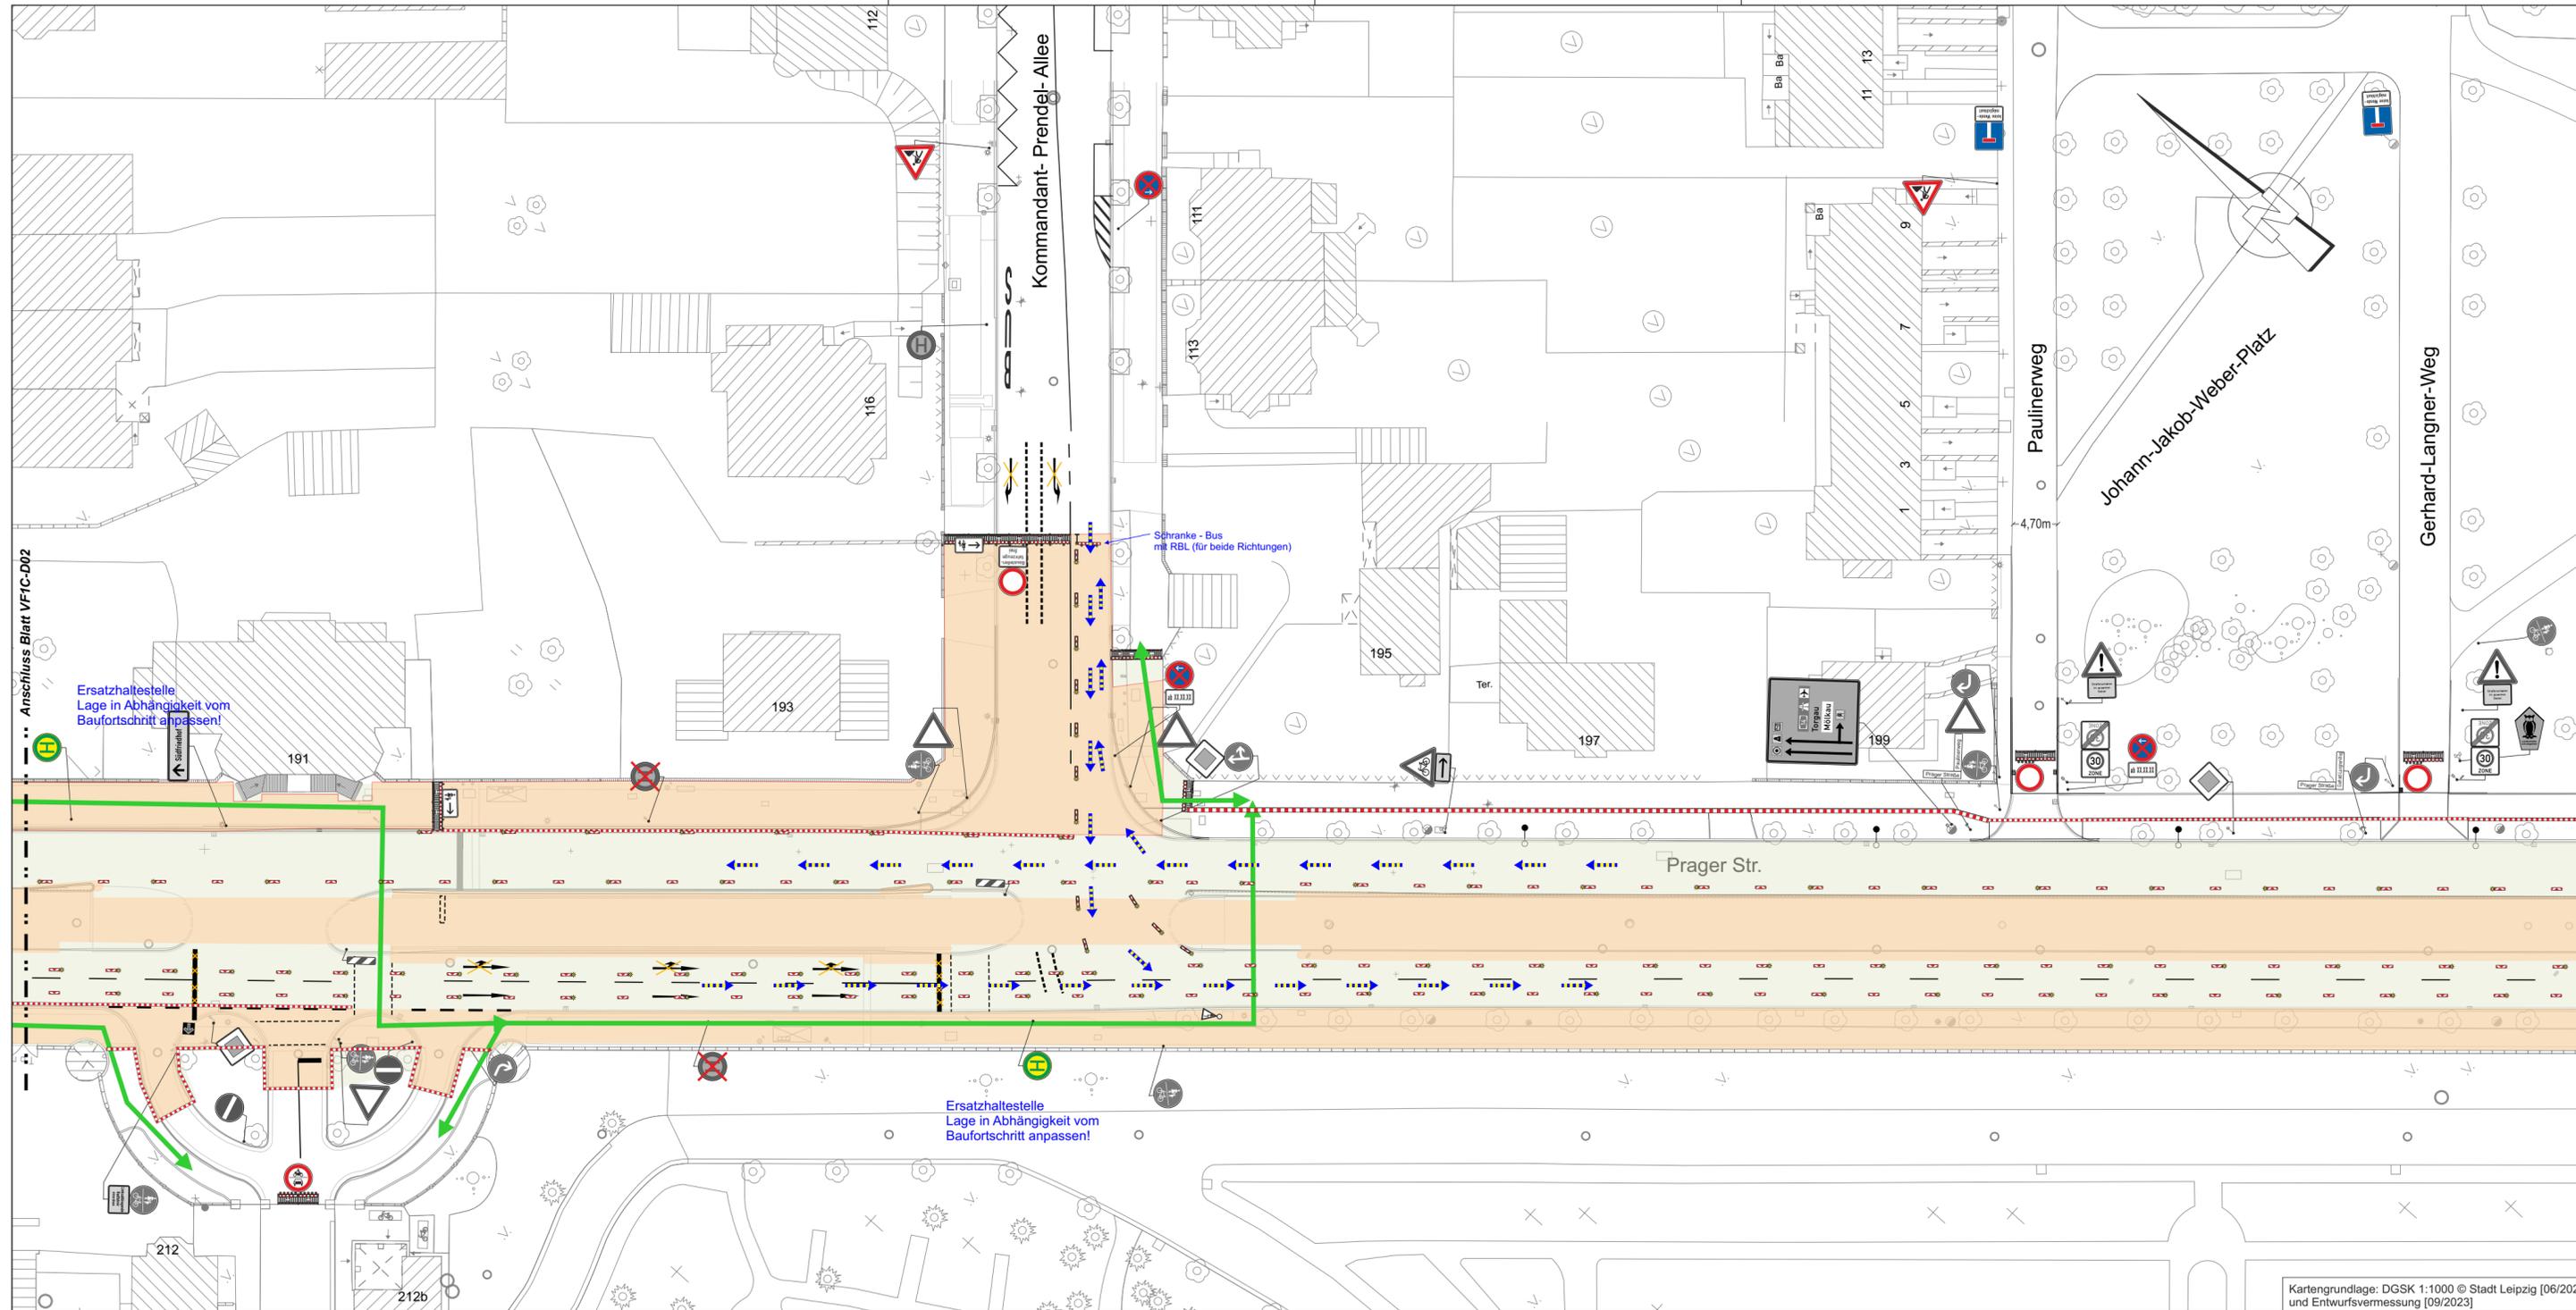

- Temporäre Beschilderung
- Stationäre Beschilderung
- stationäre Beschilderung während der Bauzeit abdecken
- Zonen für Haltverbote
Haltverbote (V.83/V.26) inkl. 1-2 Zusatzzeichen
3 volle Tage vor Baubeginn stellen
- Schienersatzverkehr (SEV) / Bus
- Baufeld-/ Verkehrssicherungsbereiche
(die auszuführenden Bauleistungen und deren zeitliche Abfolge sind den Bauphasenplänen und dem Grobbauplan zu entnehmen)
- temporäre Befestigungen auf Grünflächen, im Gleisbereich etc.
- Wanderbaustelle für Arbeiten an den Schächten/Leuchte etc.
im Verkehrsbereich - Länge zwischen 5,0m - max.10,0 m;
Durchfahrtsbreite von min. 3,0 m muss stets gewährleistet werden.


Plan dient nur zu Kalkulationszwecken!

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
bearbeitet	05.11.24	HMa
Blattgröße:	750 x 297 mm	

<p>Leipziger Verkehrsbetriebe LVB GmbH Georgiring 3 04103 Leipzig</p>	<p>Stadt Leipzig Mobilitäts- und Tiefbauamt Prager Straße 118-136 04317 Leipzig</p>	
<p>Bauherr:</p> <p style="text-align: center;">Prager Straße zwischen An der Tabakmühle und Friedhofsgärtnerei (P.-Nr. 90617)</p>		
<p>Bauvorhaben:</p> <p>Ausschreibungsunterlage</p>	<p>Verkehrsführung während der Bauzeit</p> <p>geplanter Zeitraum: 14.08.25-03.09.25</p>	<p>Maßstab:</p> <p>1:500</p>
<p>Verkehrsführungsphase 1C</p>	<p>Baubereich Detailplan 3</p>	<p>Unterlage/ Blatt-Nr.:</p> <p>VF1C-D 03</p>

Kartengrundlage: DGSK 1:1000 © Stadt Leipzig [06/2023] und Entwurfsvermessung [09/2023]

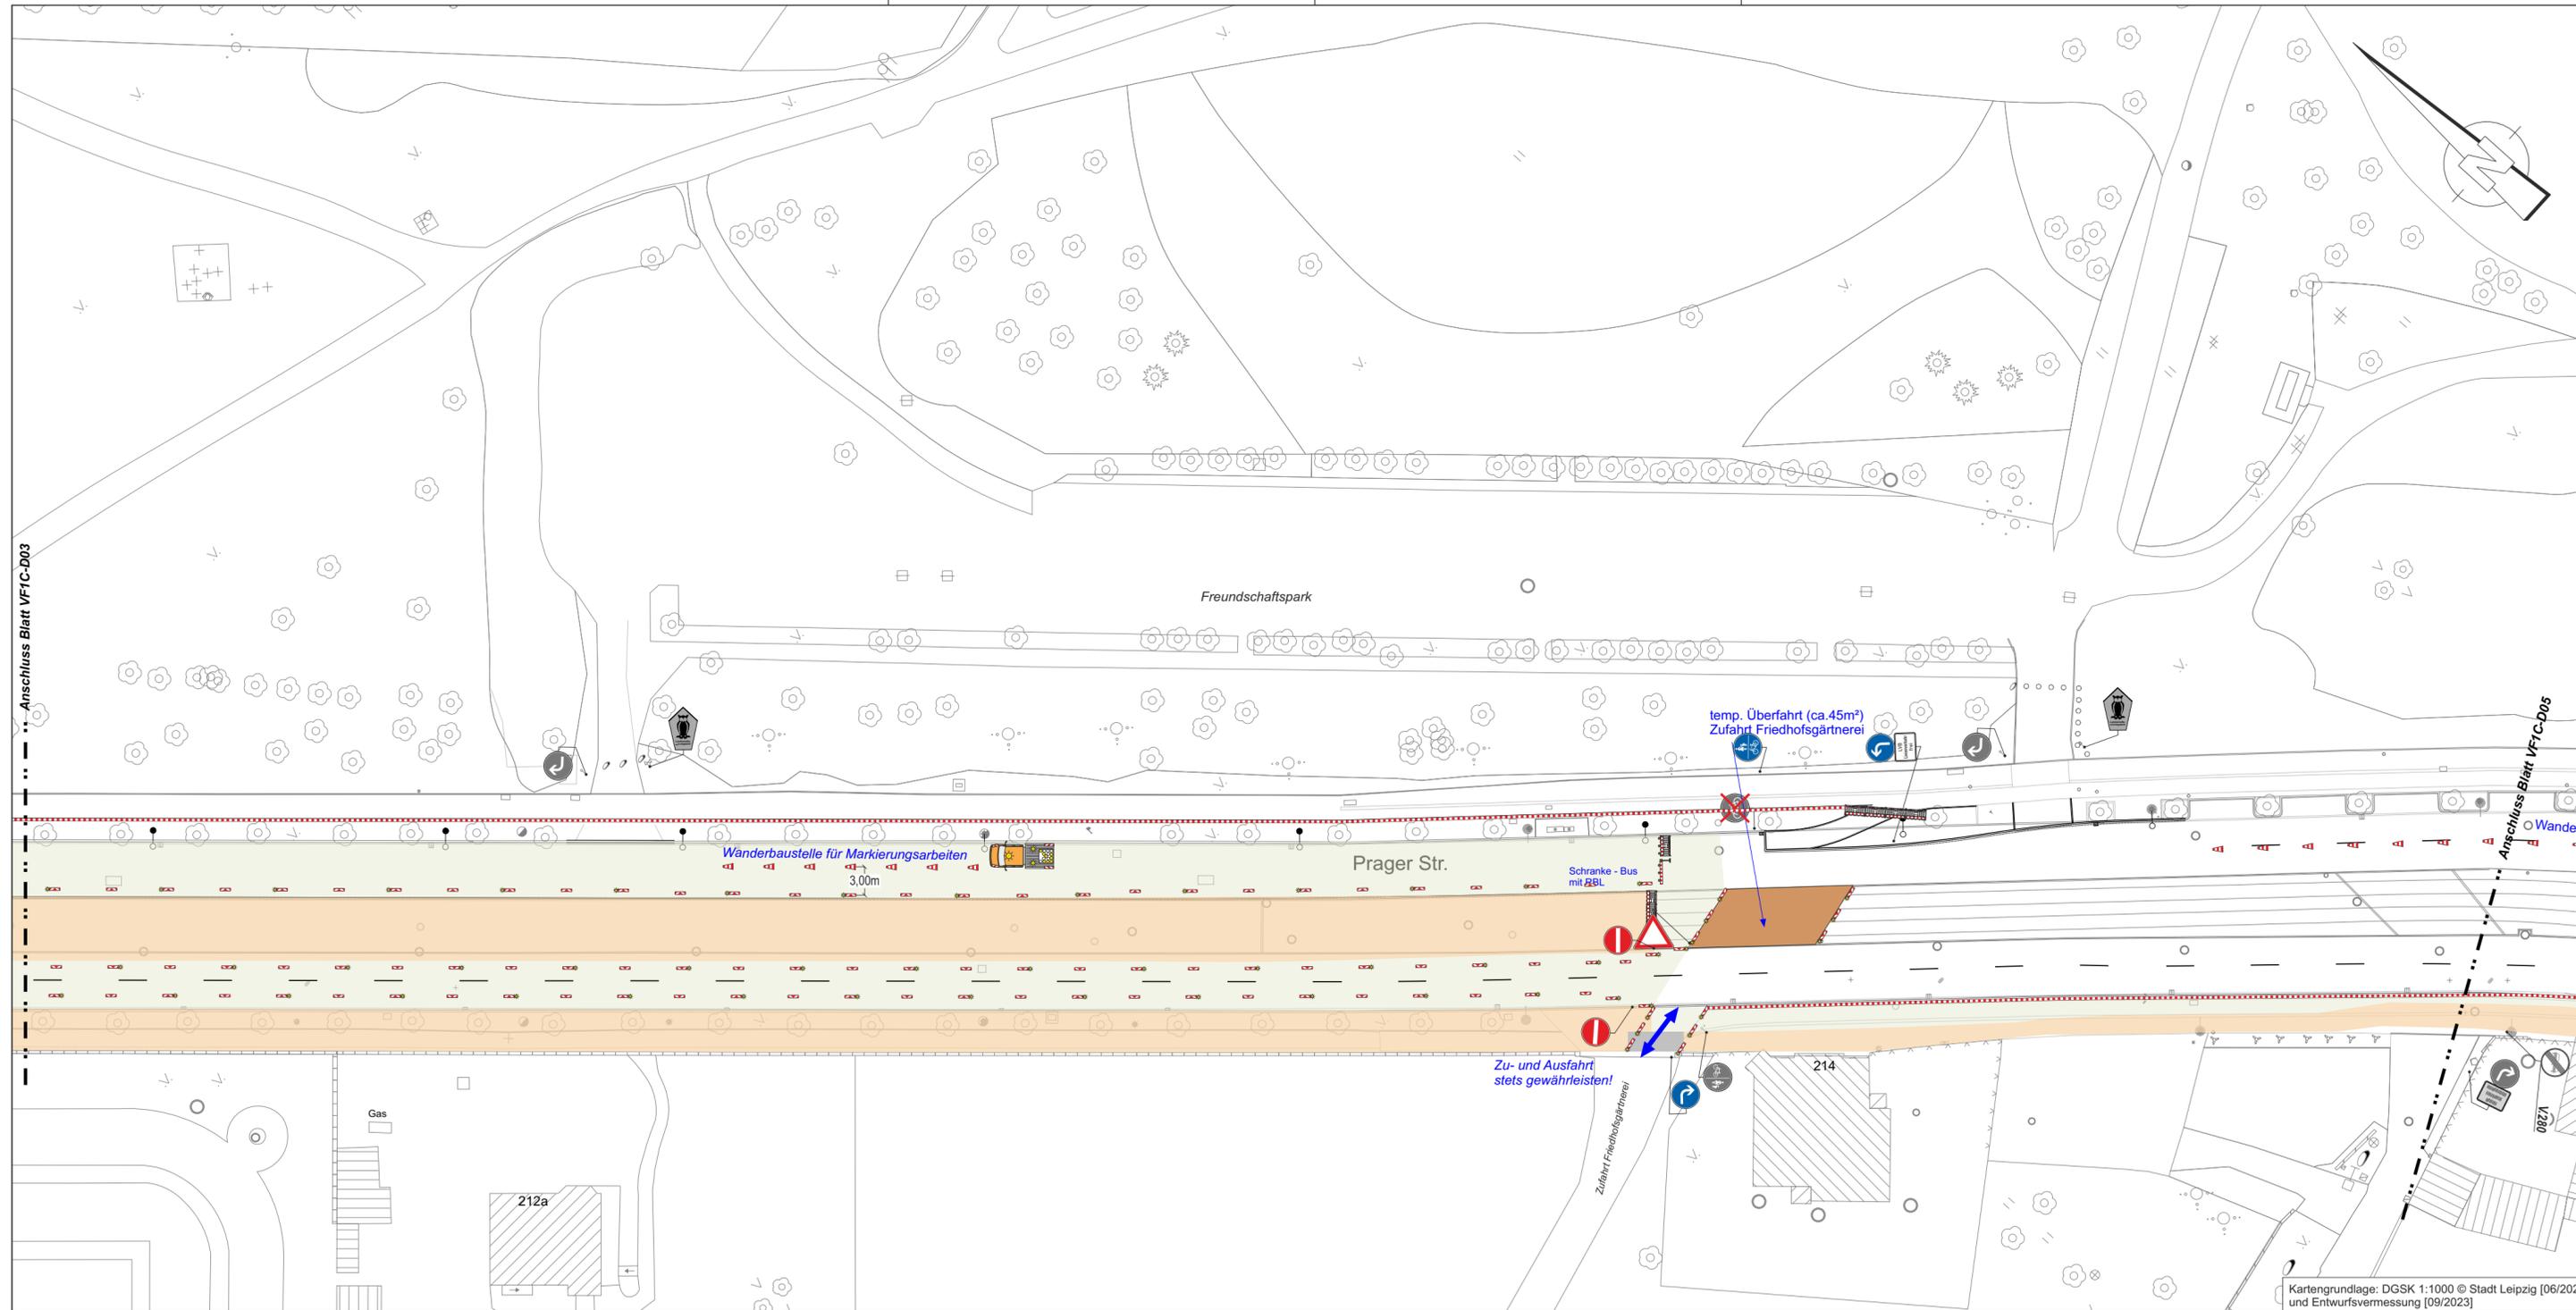

- Temporäre Beschilderung
- Stationäre Beschilderung
- stationäre Beschilderung während der Bauzeit abdecken
- Zonen für Haltverbote
Haltverbote (V.83/V.26) inkl. 1-2 Zusatzzeichen
3 volle Tage vor Baubeginn stellen
- Schienersatzverkehr (SEV) / Bus
- Baufeld-/ Verkehrssicherungsbereiche
(die auszuführenden Bauleistungen und deren zeitliche Abfolge sind den Bauphasenplänen und dem Grobabaufplan zu entnehmen)
- temporäre Befestigungen auf Grünflächen, im Gleisbereich etc.
- Wanderbaustelle für Arbeiten an den Schächten/Leuchte etc.
im Verkehrsbereich - Länge zwischen 5,0m - max. 10,0 m;
Durchfahrtsbreite von min. 3,0 m muss stets gewährleistet werden.

Plan dient nur zu Kalkulationszwecken!

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name
	bearbeitet	05.11.24	HMa

Blattgröße: 750 x 297 mm

Leipziger Verkehrsbetriebe
LVB GmbH
Georgiring 3 | 04103 Leipzig

Stadt Leipzig
Mobilitäts- und Tiefbauamt
Prager Straße 118-136 | 04317 Leipzig

Bauherr:


Prager Straße
zwischen An der Tabakmühle und Friedhofsgärtnerei
(P.-Nr. 90617)

Bauvorhaben:	Ausschreibungsunterlage	Verkehrsführung während der Bauzeit	Maßstab:
	Verkehrsführungsphase 1C	geplanter Zeitraum: 14.08.25-03.09.25	1:500
Baubereich Detailplan 4			Unterlage/ Blatt-Nr.: VF1C-D 04

Kartengrundlage: DGSK 1:1000 © Stadt Leipzig [06/2023] und Entwurfsvermessung [09/2023]



- Temporäre Beschilderung
- Stationäre Beschilderung
- stationäre Beschilderung während der Bauzeit abdecken
- Zonen für Haltverbote
Haltverbote (V.83/V.26) inkl. 1-2 Zusatzzeichen
3 volle Tage vor Baubeginn stellen
- Schienersatzverkehr (SEV) / Bus
- Baufeld-/ Verkehrssicherungsbereiche
(die auszuführenden Bauleistungen und deren zeitliche Abfolge sind den Bauphasenplänen und dem Grobbauplan zu entnehmen)
- temporäre Befestigungen auf Grünflächen, im Gleisbereich etc.
- Wanderbaustelle für Arbeiten an den Schächten/Leuchte etc.
im Verkehrsbereich - Länge zwischen 5,0m - max.10,0 m;
Durchfahrtsbreite von min. 3,0 m muss stets gewährleistet werden.



Plan dient nur zu Kalkulationszwecken!

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name
	bearbeitet	05.11.24	HMa
Blattgröße:		800 x 297 mm	

Leipziger Verkehrsbetriebe LVB GmbH
 Georgiring 3 | 04103 Leipzig

Stadt Leipzig
 Mobilitäts- und Tiefbauamt
 Prager Straße 118-136 | 04317 Leipzig

Bauherr:

Prager Straße
zwischen An der Tabakmühle und Friedhofsgärtnerei
(P.-Nr. 90617)

Bauvorhaben:

Ausschreibungsunterlage	Verkehrsführung während der Bauzeit	Maßstab:
Verkehrsführungsphase 1C	geplanter Zeitraum: 14.08.25-03.09.25	1:500
Baubereich Detailplan 5		Unterlage/ Blatt-Nr.: VF1C-D 05

Kartengrundlage: DGSK 1:1000 © Stadt Leipzig [06/2023] und Entwurfsvermessung [09/2023]

Straßenbahnvollsperrung : 14.04.2025 - 14.11.2025

Ferien:
 18.04.25 - 25.04.25 - Osterferien
 28.06.25 - 08.08.25 - Sommerferien
 06.10.25 - 18.10.25 - Herbstferien

- Umleitung MIV
- LVB/ Bus/ SEV durch Baubereich
- Baufeld
- Standorte temp. Plantafeln
- Standorte stationäre Wegweisung
- Zonen für Haltverbote (Stellung beidseitig)
 Haltverbote (V.83/V.26) inkl. 1-2 Zusatzzeichen
 3 volle Tage vor Baubeginn stellen und aller 30 m wiederholen
 ca.30m | ca.30m | ca.30m | ca.30m
- stat. LSA
- Untersuchung/ Anpassung stat. LSA
- temp. LSA

Keine Änderungen in der Beschilderung ggü. Umleitung VF- Phase 1B,
 nur Bus fährt auf den jeweiligen Richtungsfahrbahnen.

Plan dient nur zu Kalkulationszwecken!

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name
		05.11.25	HMa
Blattgröße:		640 x 420	

Leipziger Verkehrsbetriebe
 LVB GmbH
 Georgiring 3 | 04103 Leipzig


Stadt Leipzig
 Mobilitäts- und Tiefbauamt
 Prager Straße 118-136 | 04317 Leipzig

Prager Straße
 zwischen An der Tabakmühle und Friedhofsgärtnerei
 (P-Nr. 90617)



Bauherr:	Verkehrsführung während der Bauzeit	Maßstab:
Bauvorhaben:	geplanter Zeitraum: 14.08.25- 03.09.25	ohne
Ausschreibungsunterlage:	Umleitungsführung	Unterlage/ Blatt-Nr.:
Verkehrsführungsphase 1C		VF1C-U-01





Riebeckstraße vor Prager Straße

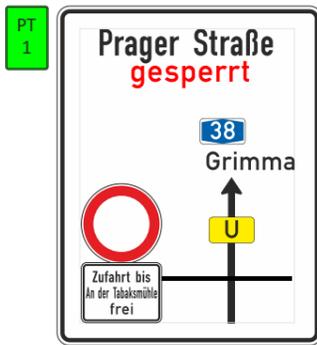

Prager Straße vor Semmelweisstraße

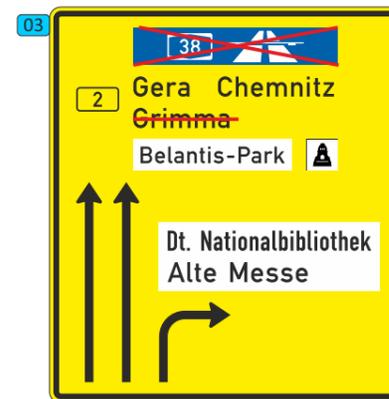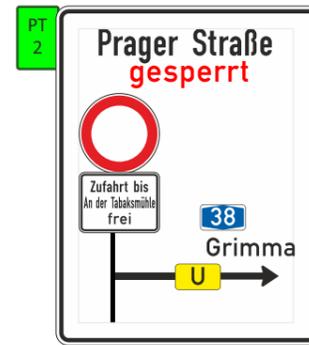


Philipp-Rosenthal-Str. vor Semmelweisstraße (Zuf. Nord)

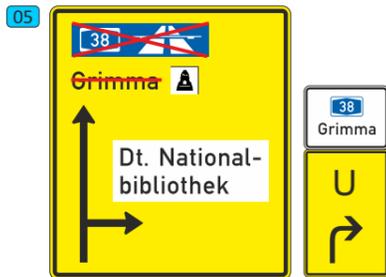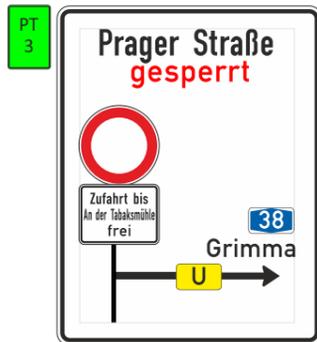



Philipp-Rosenthal-Str. vor Semmelweisstraße (Zuf. Süd)



Straße des 18. Oktober vor Semmelweisstraße

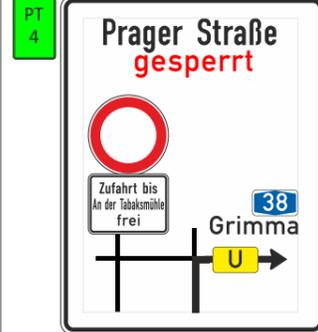


Semmelweisstraße vor Zwickauer Str.

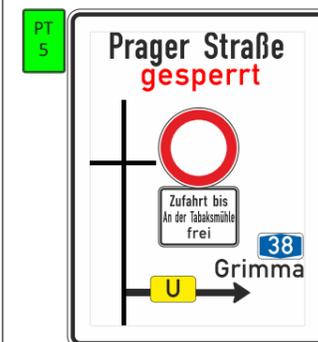


Semmelweisstr. vor Str. 18. Oktober (Zuf. West)



Deutscher Platz vor Semmelweisstr.

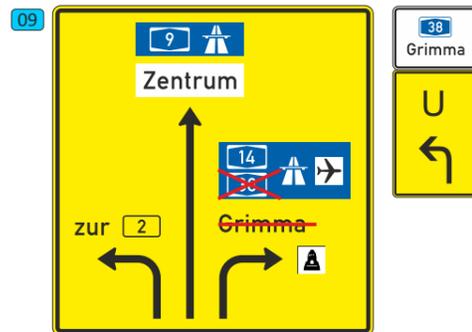

Semmelweisstr. vor Zwickauer Str. (Zuf. Ost)


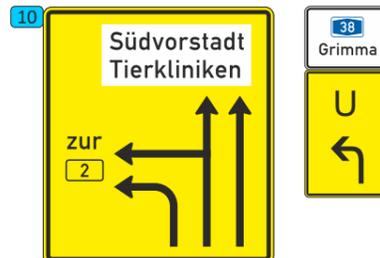


Zwickauer Str. vor R.-Lehmann-Str. (Zuf. Nord)




Keine Änderungen gegenüber VF-Phase 1B!

Richard-Lehmann-Str. vor Zwickauer Str. (Zuf. West)

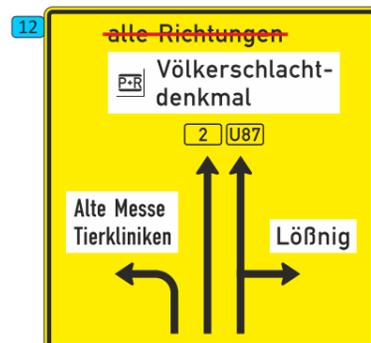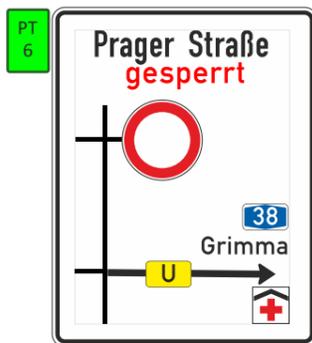

Leipziger Verkehrsbetriebe LVB GmbH Georgiring 3 04103 Leipzig		Stadt Leipzig Mobilitäts- und Tiefbauamt Prager Straße 118-136 04317 Leipzig	
Prager Straße zwischen An der Tabaksmühle und Friedhofsgärtnerei (P.-Nr. 90617)			
Bauvorhaben:			
Ausschreibungsunterlage		geplante Bauzeit:	
Verkehrsführung während der Bauzeit		14.08.25-03.09.25	
Verkehrsführungsphase (VF-Ph) 1C			
Umleitungsbeschilderung- Details zu Plankarten, Wegweisern und Zusatzzeichen für V.455			
bearbeitet/ Name:	Maßstab:	Blattgröße:	Datum/Stand:
HMa	ohne	A3	05.11.24
Unterlage/ Blatt-Nr.:			1C-U02

Zwickauer Str. vor Richard-Lehmann-Str. (Zuf. Süd)

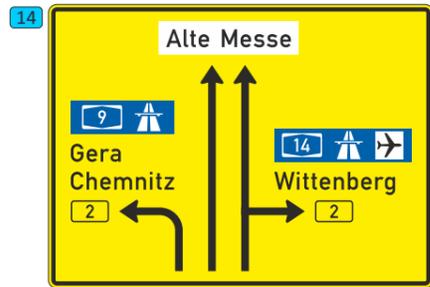


Richard-Lehmann-Str. vor Zwickauer Str. (Zuf. Ost)




Richard-Lehmann-Str. vor An der Tabakmühle



An der Tabakmühle vor Richard-Lehmann-Str.

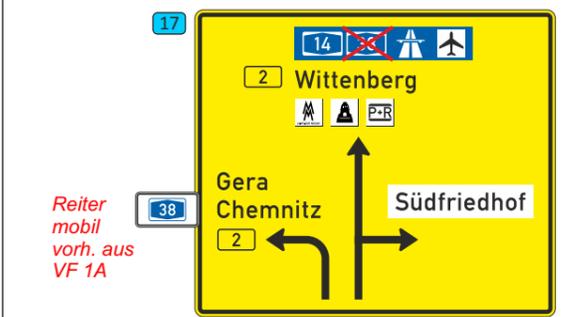


An der Tabakmühle vor Prager Str.

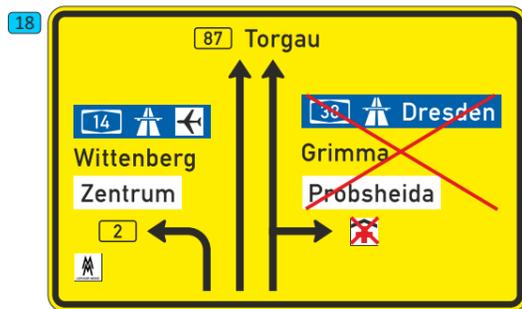

Zwickauer Str. vor Arno-Nitzsche-Str.



Arno-Nitzsche-Str. vor Zwickauer Str.

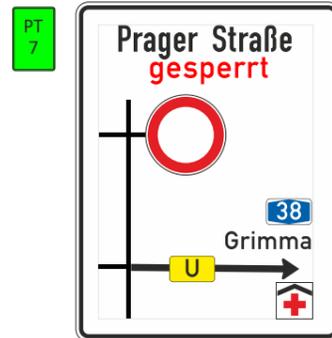

Zwickauer Str. vor An der Tabakmühle



Zwickauer Str. vor Probstheidaer Str. (Zuf. Nord)




Probstheidaer Str. vor Zwickauer Str. (Zuf. Ost)




Connewitzer Str. vor Dösener Str.




Nieritzstr. vor Prager Str.

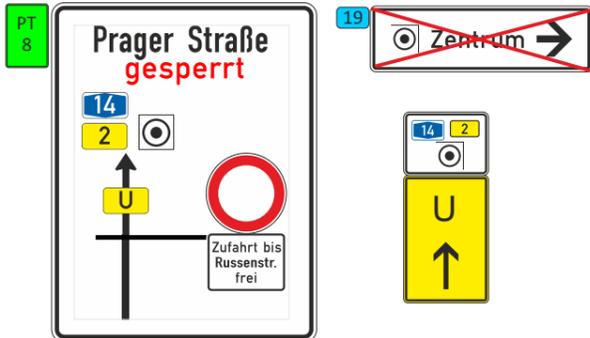


Prager Str. vor Nieritzstr.

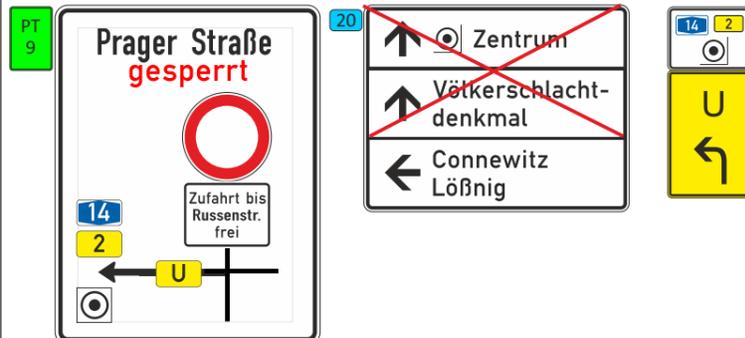

Holzhäuser Str. vor Sommerfelder Str.

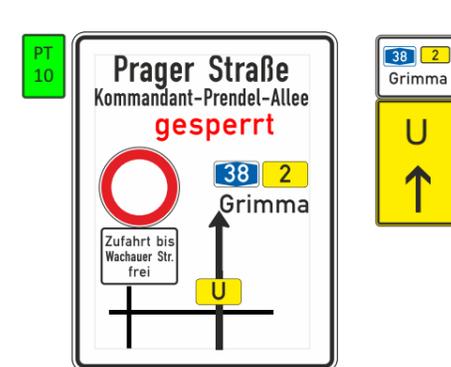

Zuckelhäuser Str. vor Holzhäuser Str.

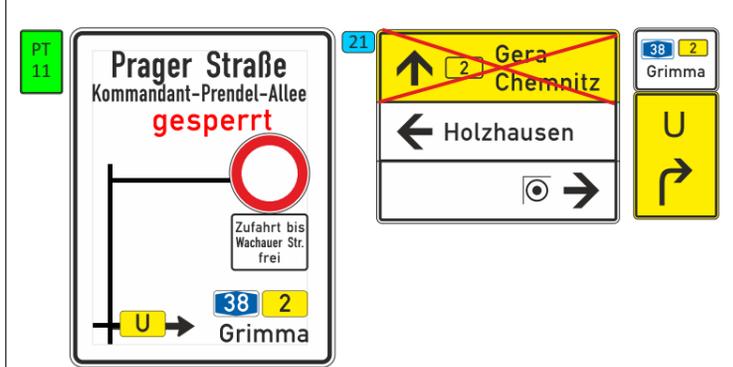


Holzhäuser Str. vor R.-Herrmann-Str.



Naunhofer Str. vor Prager Str.




Prager Str. vor Kregelstr. (Zuf. Süd)

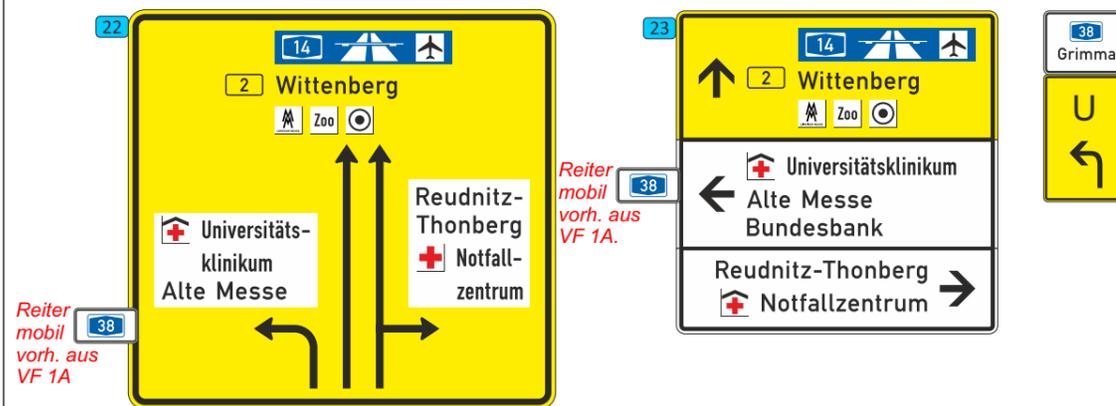


Keine Änderungen gegenüber VF-Phase 1B!

Leipziger Verkehrsbetriebe LVB GmbH Georgiring 3 04103 Leipzig		Stadt Leipzig Mobilitäts- und Tiefbauamt Prager Straße 118-136 04317 Leipzig	
Prager Straße zwischen An der Tabakmühle und Friedhofsgärtnerei (P.-Nr. 90617)			
Bauvorhaben:			
Ausschreibungsunterlage		geplante Bauzeit:	
Verkehrsführung während der Bauzeit		14.08.25-03.09.25	
Verkehrsführungsphase (VF-Ph) 1C			
Umleitungsbeschilderung- Details zu Planaufstellungen, Wegweisern und Zusatzzeichen für V.455			
bearbeitet/ Name:	Maßstab:	Blattgröße:	Datum/Stand:
HMa	ohne	A3	05.11.24
Unterlage/ Blatt-Nr.:		1C-U03	


Kregelstraße vor Prager Str.

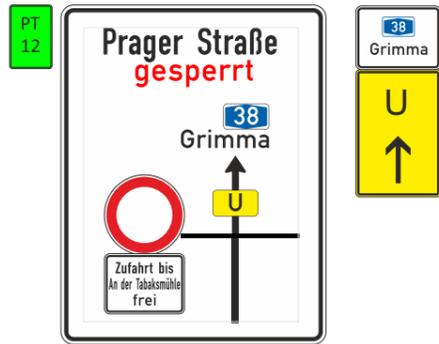

Prager Str. vor Kregelstr.

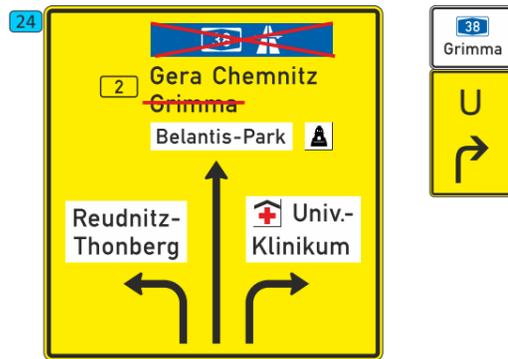

Philipp-Rosenthal-Str. vor Prager Str.

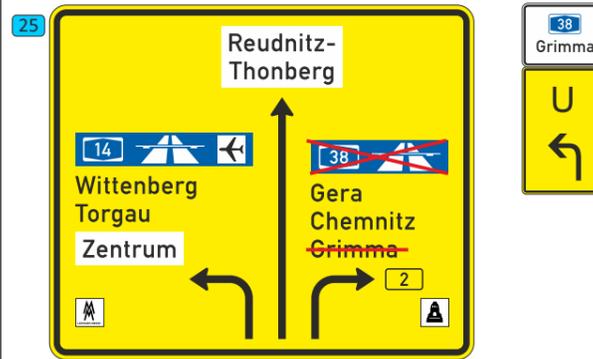


Prager Str. vor Friedhofsweg




Prager Str. vor An der Tabaksmühle



Prager Str. vor Riebeckstr.

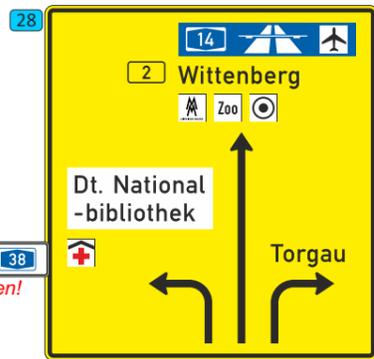

Semmelweisstr. vor Prager Str.

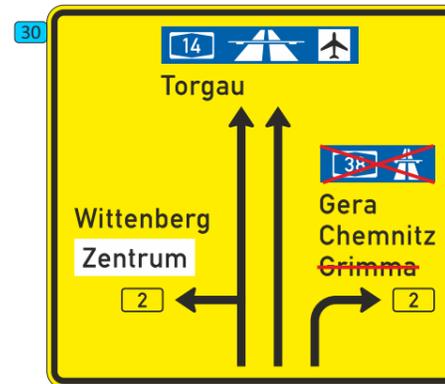


Kommandant-Prendel-Allee vor Prager Str.




Keine Änderungen gegenüber VF-Phase 1B!


Leipziger Verkehrsbetriebe LVB GmbH Georgiring 3 04103 Leipzig		Stadt Leipzig Mobilitäts- und Tiefbauamt Prager Straße 118-136 04317 Leipzig	
Prager Straße zwischen An der Tabaksmühle und Friedhofsgärtnerei (P.-Nr. 90617)			
Ausschreibungsunterlage			
Verkehrsführung während der Bauzeit		geplante Bauzeit:	
Verkehrsführungsphase (VF-Ph) 1C		14.08.25-03.09.25	
Umleitungsbeschilderung- Details zu Plankarten, Wegweisern und Zusatzzeichen für V.455			
bearbeitet/ Name: HMa	Maßstab: ohne	Blattgröße: A3	Datum/Stand: 05.11.24
			Unterlage/ Blatt-Nr.: 1C-U04

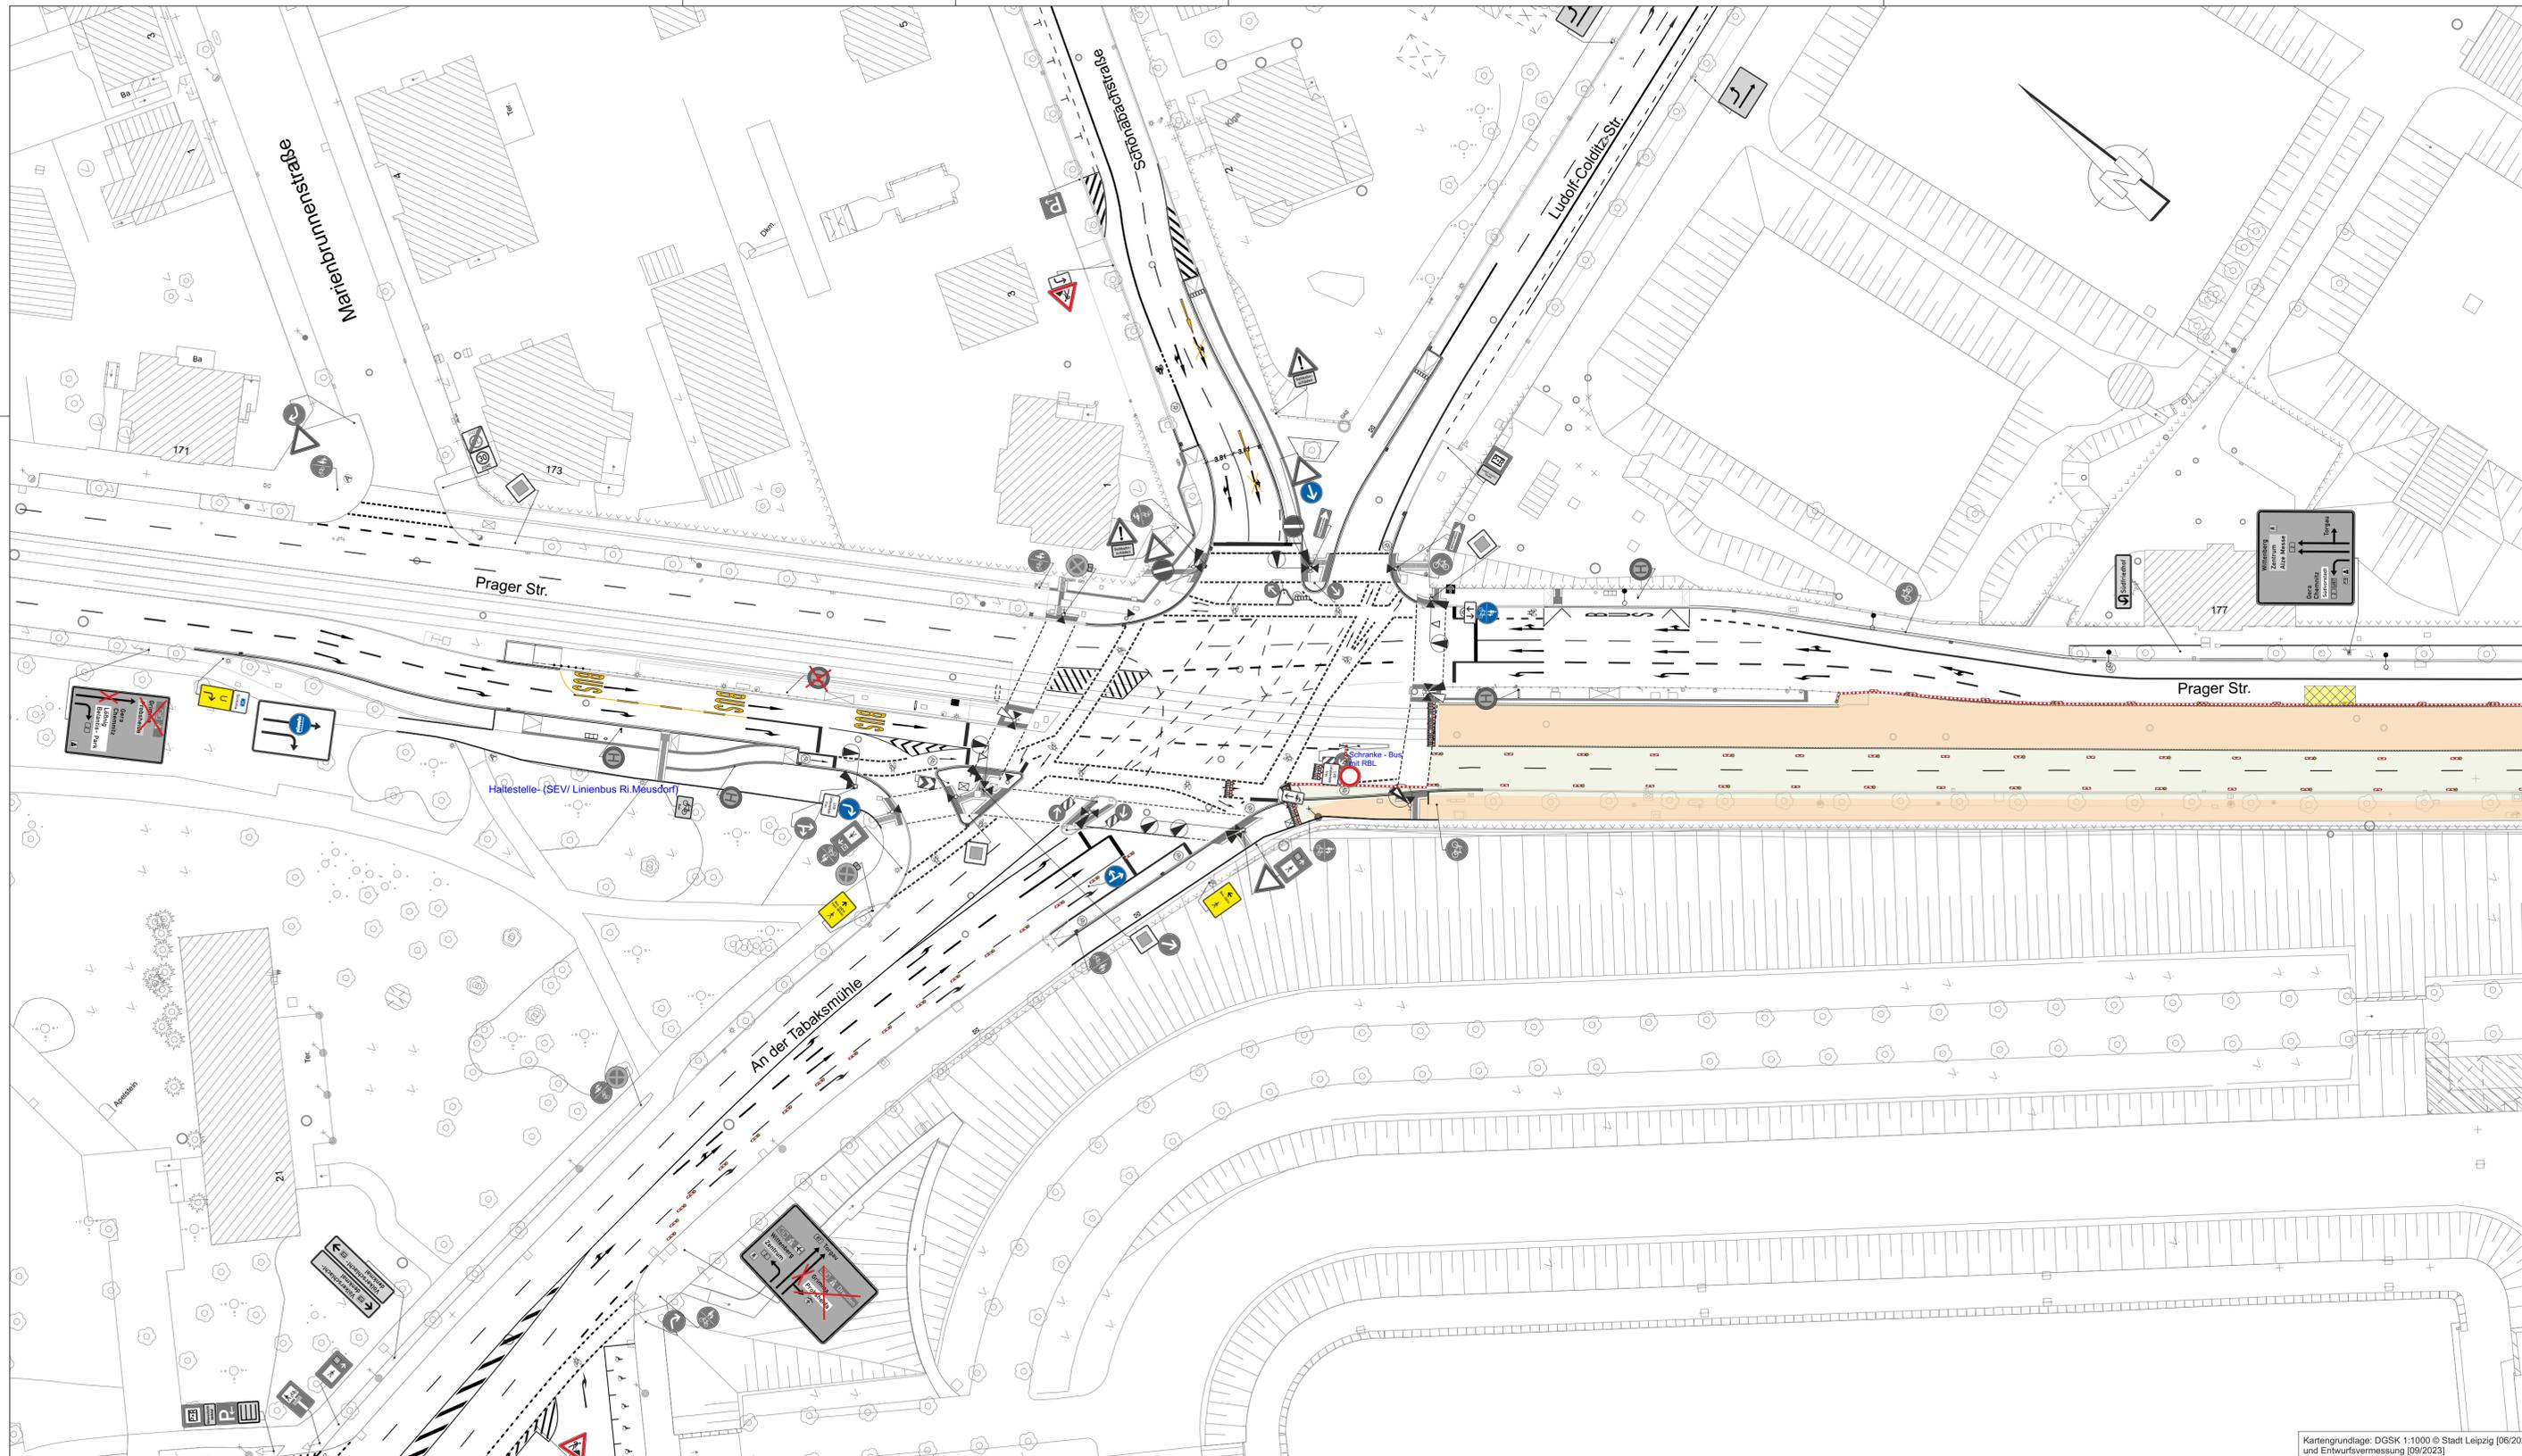


- Temporäre Beschilderung
- Stationäre Beschilderung
- stationäre Beschilderung während der Bauzeit abdecken
- Zonen für Haltverbote (V.83/V.26) inkl. 1-2 Zusatzzeichen
3 volle Tage vor Baubeginn stellen
- Schienersatzverkehr (SEV) / Bus
- Baufeld-/ Verkehrssicherungsbereiche
(die auszuführenden Bauleistungen und deren zeitliche Abfolge sind den Bauphasenplänen und dem Grobbauplan zu entnehmen)
- temporäre Befestigungen auf Grünflächen, im Gleisbereich etc.
- Wanderbaustelle für Arbeiten am Gleisbereich
im Verkehrsbereich - Länge zwischen 5,0m -max.15,0 m;
Durchfahrtsbreite von min. 3,0 m muss stets gewährleistet werden.



Dem Fußgänger/ Radfahrerverkehr ist, sofern nicht anders ausgewiesen, eine mind. 1,5m breite, gesicherte, behindertengerechte befestigte Trasse zum Queren des Baufeldes vorzuhalten. Vorh. Grünstreifen im Querschnitt sind ebenfalls temp. zu befestigen. An den Bordkanten sind entspr. Anrampung vorzusehen. Die Querung über offene Leistungsgräben ist sicherzustellen (z.B. Fußgängerbrücke, Überfahrplatten- rutschfest!). Die Lage der kann in Abhängigkeit vom Baufortschritt variieren.



Das Erreichen der Grundstücke mit Kraftfahrzeugen ist außerhalb von Zeiten der Bautätigkeit (abends, nachts und an den Wochenenden) im Rahmen des Baufortschritts zu ermöglichen.
Für Rettungsfahrzeuge ist stets eine mindestens 3,00 m breite , befestigte und gesicherte Trasse im Bereich der Baufelder vorzuhalten. Kopflöcher/ Gräben müssen ggf. unverzüglich mit Stahlplatten/ Überfahrplatten abzudecken sein. Entsprechendes Gerät ist ständig vorzuhalten. Im Bereich der Fahrgasse dürfen keine Materialien gelagert oder Baufahrzeuge abgestellt sein. In Zeiten der Bauruhe ist die Trasse so aufzubereiten das Fahrzeuge (bis ca. 16t) diese befahren können. Die Fahrgasse ist mit Baken (V605-42/43) in einem Abstand von ca. 5,0 m abzusichern! Dies gilt auch für notwendige Fahrgassen und Überfahrten durch den SEV/Bus!



Plan dient nur zu Kalkulationszwecken!

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
bearbeitet	05.11.24	HMa
Blattgröße:	900 x 420 mm	


Leipziger Verkehrsbetriebe
LVB GmbH
Georgiring 3 | 04103 Leipzig

Stadt Leipzig
Mobilitäts- und Tiefbauamt
Prager Straße 118-136 | 04317 Leipzig

Bauherr: **Prager Straße**
zwischen An der Tabakmühle und Friedhofsgärtnerei
(P.-Nr. 90617)

Ausschreibungsunterlage	Verkehrsführung während der Bauzeit	Maßstab:
Verkehrsführungsphase 1D	geplanter Zeitraum: 04.09.25-17.11.25	1:500
Baubereich Detailplan 1		Unterlage/ Blatt-Nr.: VF1D-D01

Kartengrundlage: DGSK 1:1000 © Stadt Leipzig [06/2023] und Entwurfsvermessung [09/2023]

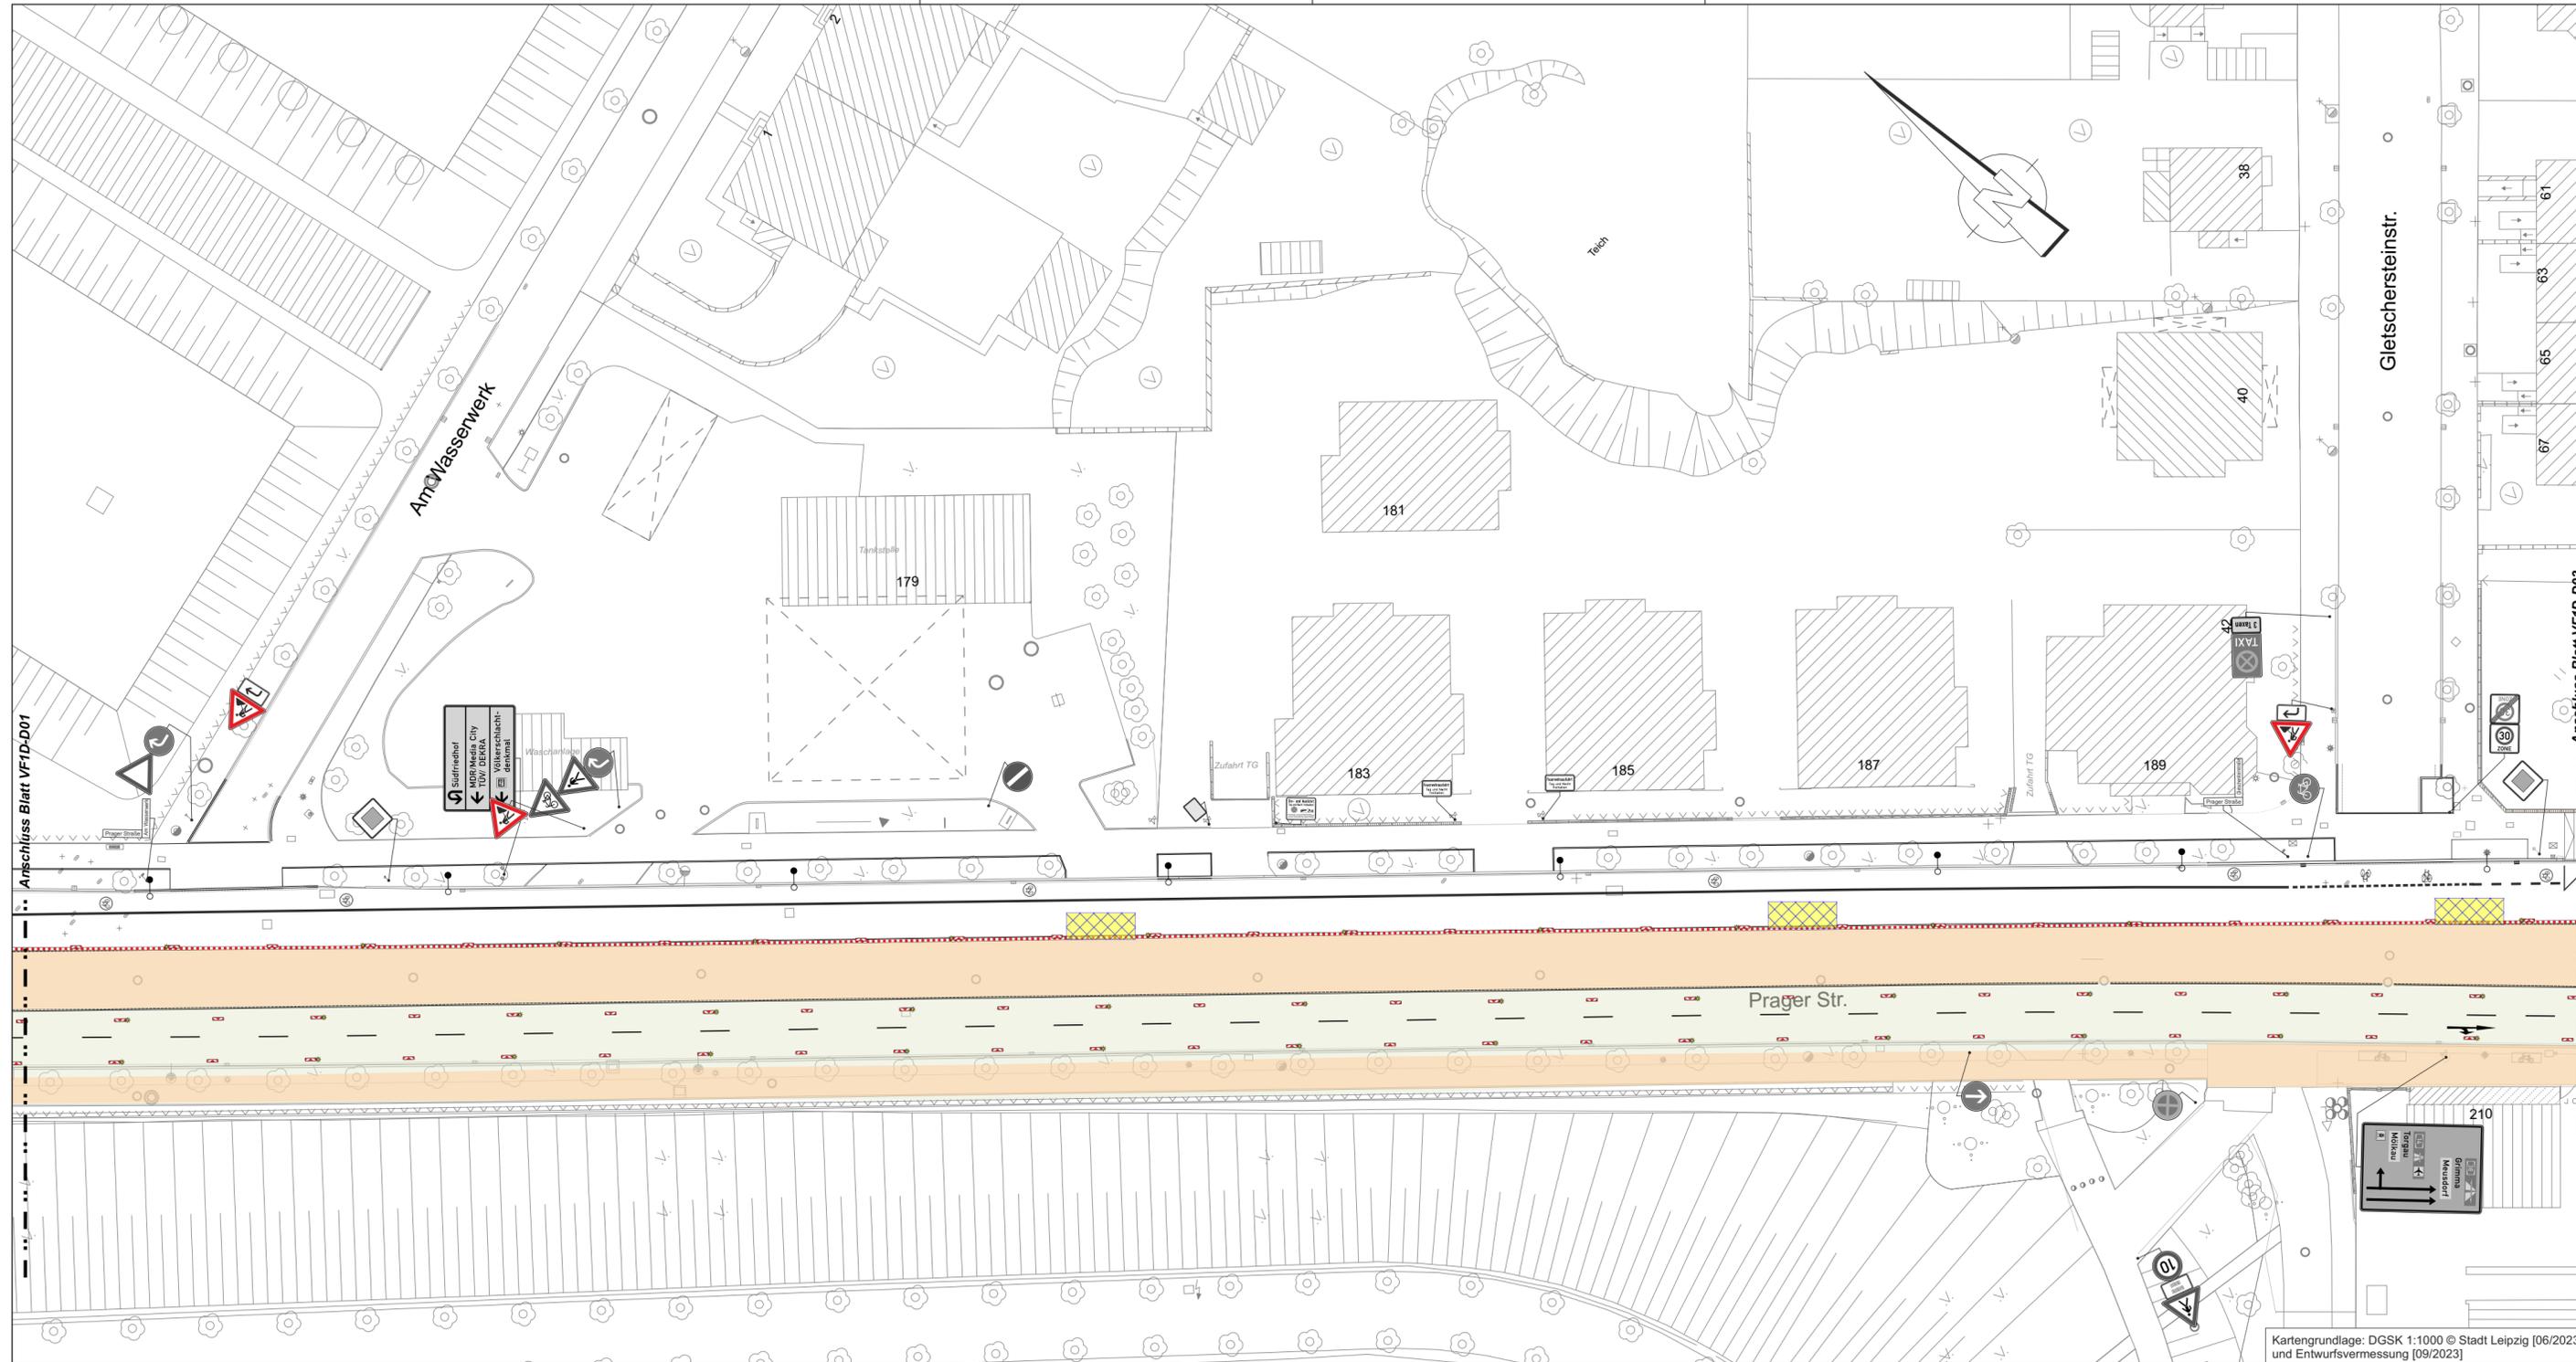

- Temporäre Beschilderung
- Stationäre Beschilderung
- stationäre Beschilderung während der Bauzeit abdecken
- Zonen für Haltverbote
Haltverbote (V.83/V.26) inkl. 1-2 Zusatzzeichen
3 volle Tage vor Baubeginn stellen
- Schienersatzverkehr (SEV) / Bus
- Baufeld-/ Verkehrssicherungsbereiche
(die auszuführenden Bauleistungen und deren zeitliche Abfolge sind den Bauphasenplänen und dem Grobbauplan zu entnehmen)
- temporäre Befestigungen auf Grünflächen, im Gleisbereich etc.
- Wanderbaustelle für Arbeiten am Gleisbereich
im Verkehrsbereich - Länge zwischen 5,0m - max.15,0 m;
Durchfahrtsbreite von min. 3,0 m muss stets gewährleistet werden.


Plan dient nur zu Kalkulationszwecken!

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
bearbeitet	05.11.24	HMa
Blattgröße: 730 x 297 mm		

<p>Leipziger Verkehrsbetriebe LVB GmbH Georgiring 3 04103 Leipzig</p>	<p>Stadt Leipzig Mobilitäts- und Tiefbauamt Prager Straße 118-136 04317 Leipzig</p>	
<p>Bauherr:</p> <p style="text-align: center;">Prager Straße zwischen An der Tabakmühle und Friedhofsgärtnerei (P.-Nr. 90617)</p>		
<p>Bauvorhaben:</p> <p>Ausschreibungsunterlage</p> <p>Verkehrsführungsphase 1D</p> <p>Baubereich Detailplan 2</p>	<p>Verkehrsführung während der Bauzeit</p> <p>geplanter Zeitraum: 04.09.25-17.11.25</p>	<p>Maßstab:</p> <p style="text-align: center;">1:500</p> <p>Unterlage/ Blatt-Nr.:</p> <p style="text-align: center;">VF1D-D02</p>

Kartengrundlage: DGSK 1:1000 © Stadt Leipzig [06/2023] und Entwurfsvermessung [09/2023]

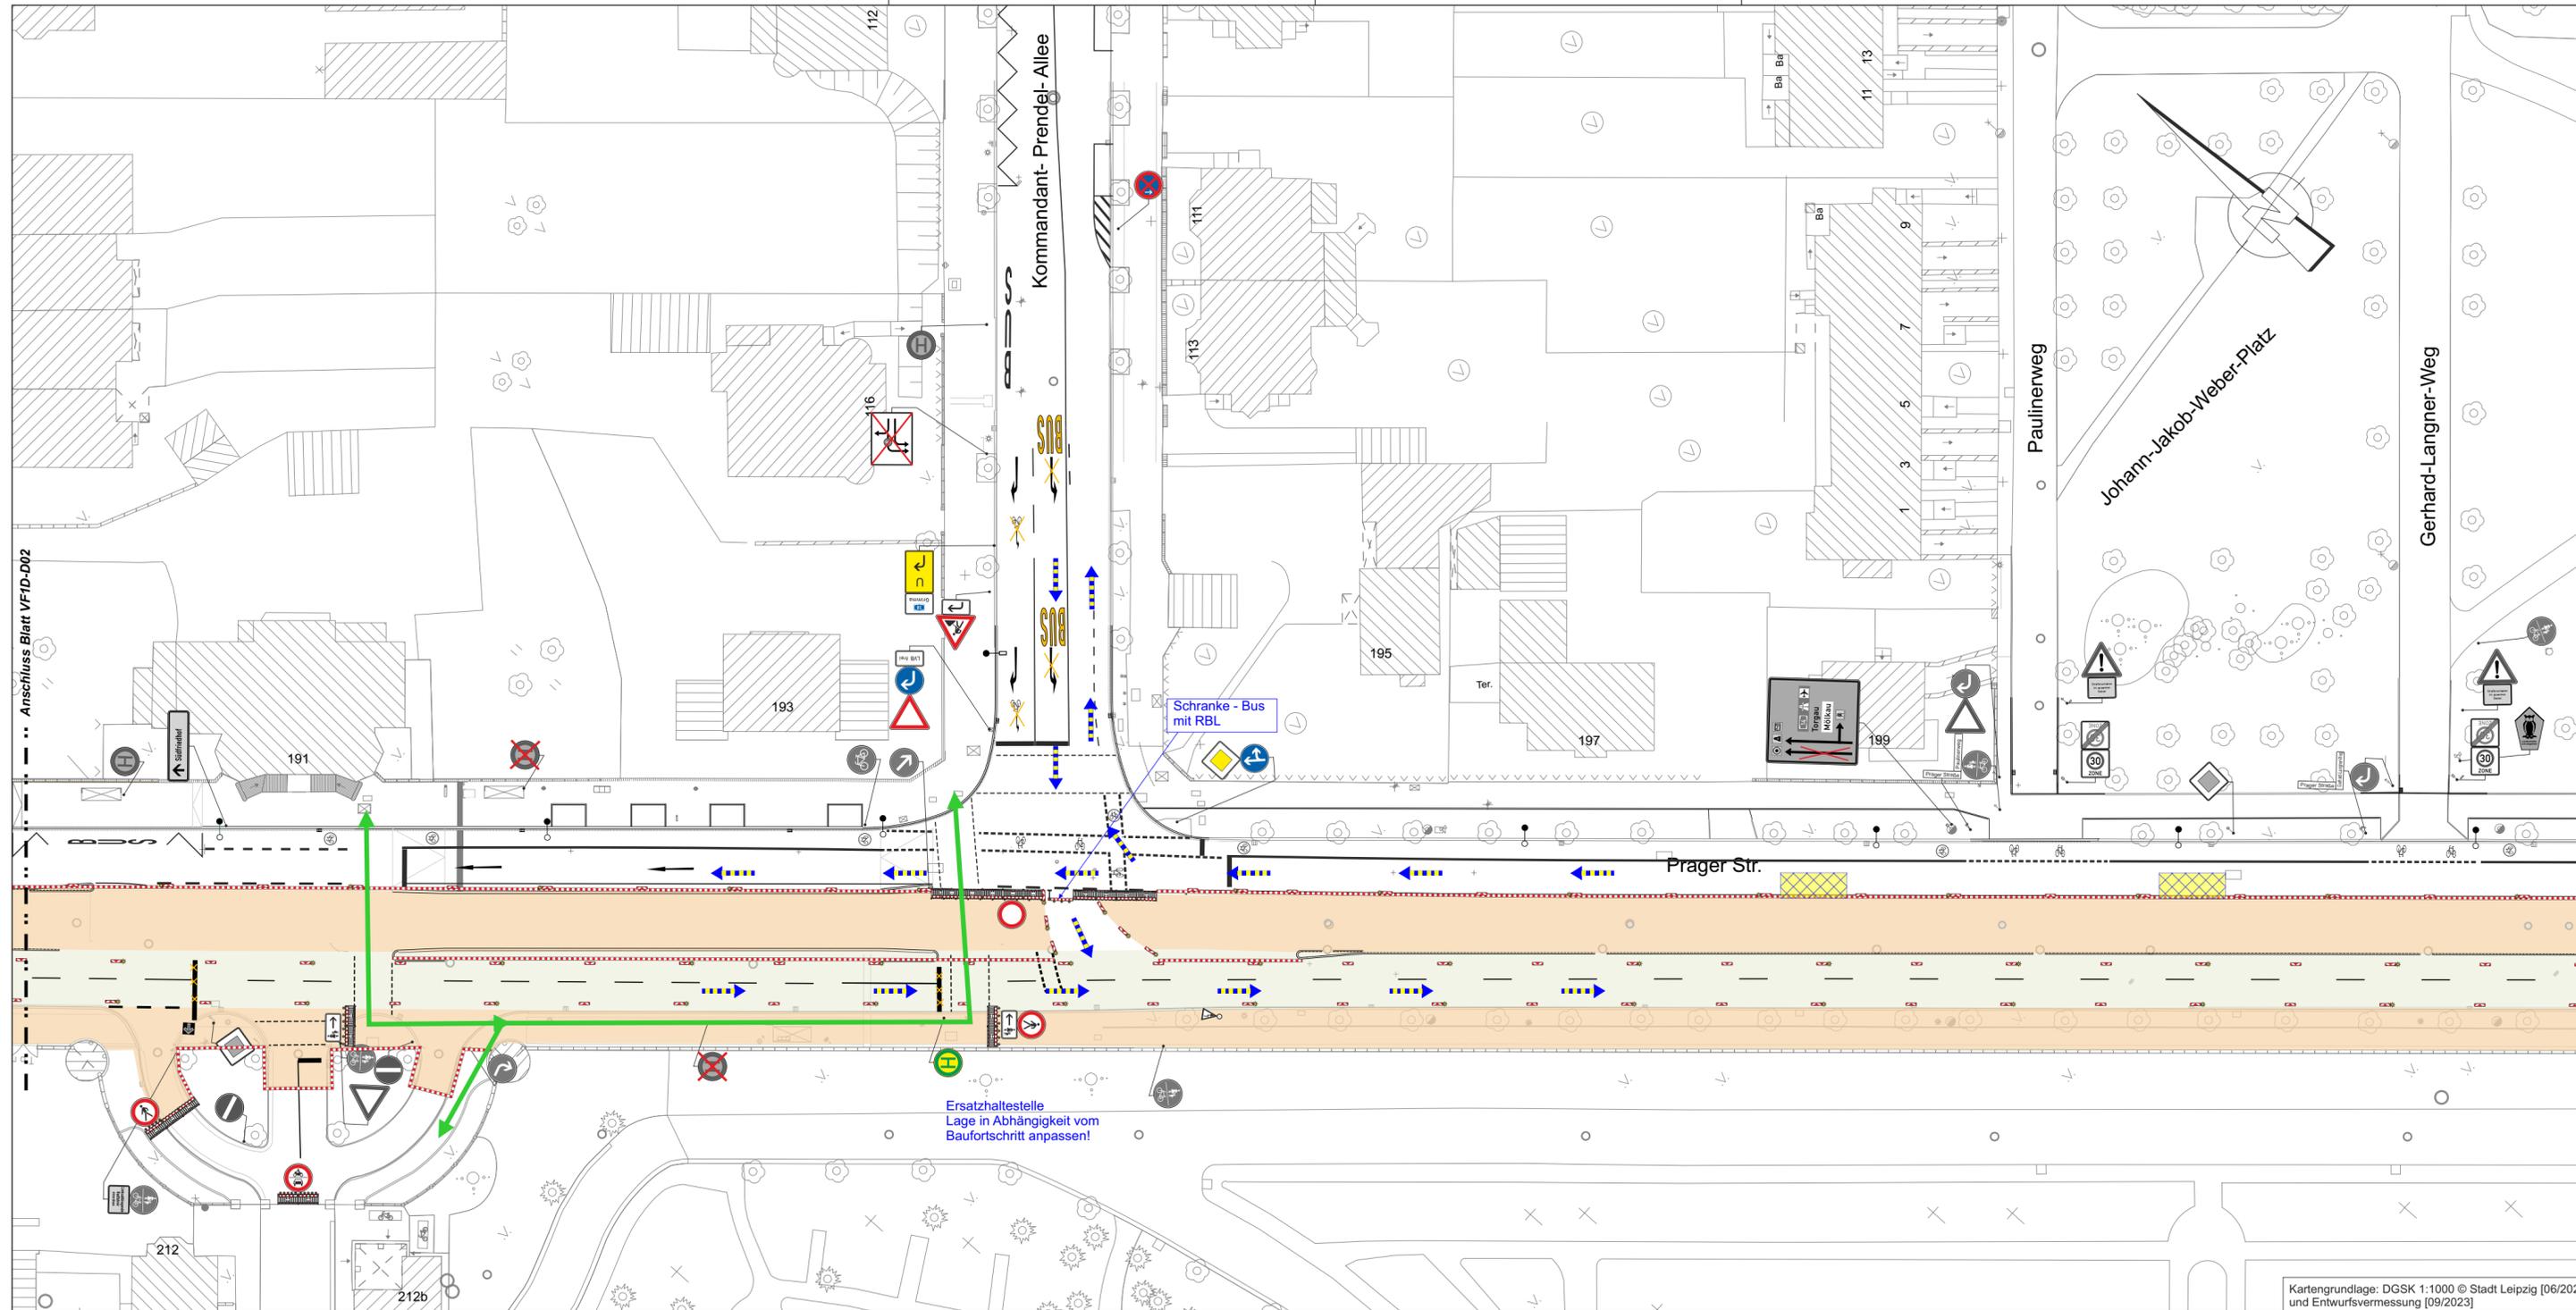

Temporäre Beschilderung
 Stationäre Beschilderung
 stationäre Beschilderung während der Bauzeit abdecken
 Zonen für Haltverbote
 Haltverbote (V.83/V.26) inkl. 1-2 Zusatzzeichen
 3 volle Tage vor Baubeginn stellen
 Schienersatzverkehr (SEV) / Bus
 Baufeld-/ Verkehrssicherungsbereiche
 (die auszuführenden Bauleistungen und deren zeitliche Abfolge sind den Bauphasenplänen
 und dem Grobabaufplan zu entnehmen)
 temporäre Befestigungen auf Grünflächen, im Gleisbereich etc.
 Wanderbaustelle für Arbeiten am Gleisbereich
 im Verkehrsbereich - Länge zwischen 5,0m - max.15,0 m;
 Durchfahrtsbreite von min. 3,0 m muss stets gewährleistet
 werden.


Plan dient nur zu Kalkulationszwecken!

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
bearbeitet	05.11.24	HMa
Blattgröße:	750 x 297 mm	

 Leipziger Verkehrsbetriebe LVB GmbH Georgiring 3 04103 Leipzig	 Stadt Leipzig Mobilitäts- und Tiefbauamt Stadt Leipzig Prager Straße 118-136 04317 Leipzig	
Bauherr: <p align="center">Prager Straße zwischen An der Tabakmühle und Friedhofsgärtnerei (P.-Nr. 90617)</p>		
Bauvorhaben: Ausschreibungsunterlage Verkehrsführungsphase 1D Baubereich Detailplan 3	Verkehrsführung während der Bauzeit geplanter Zeitraum: 04.09.25-17.11.25	Maßstab: 1:500 Unterlage/ Blatt-Nr.: VF1D-D 03

Kartengrundlage: DGSK 1:1000 © Stadt Leipzig [06/2023] und Entwurfsvermessung [09/2023]

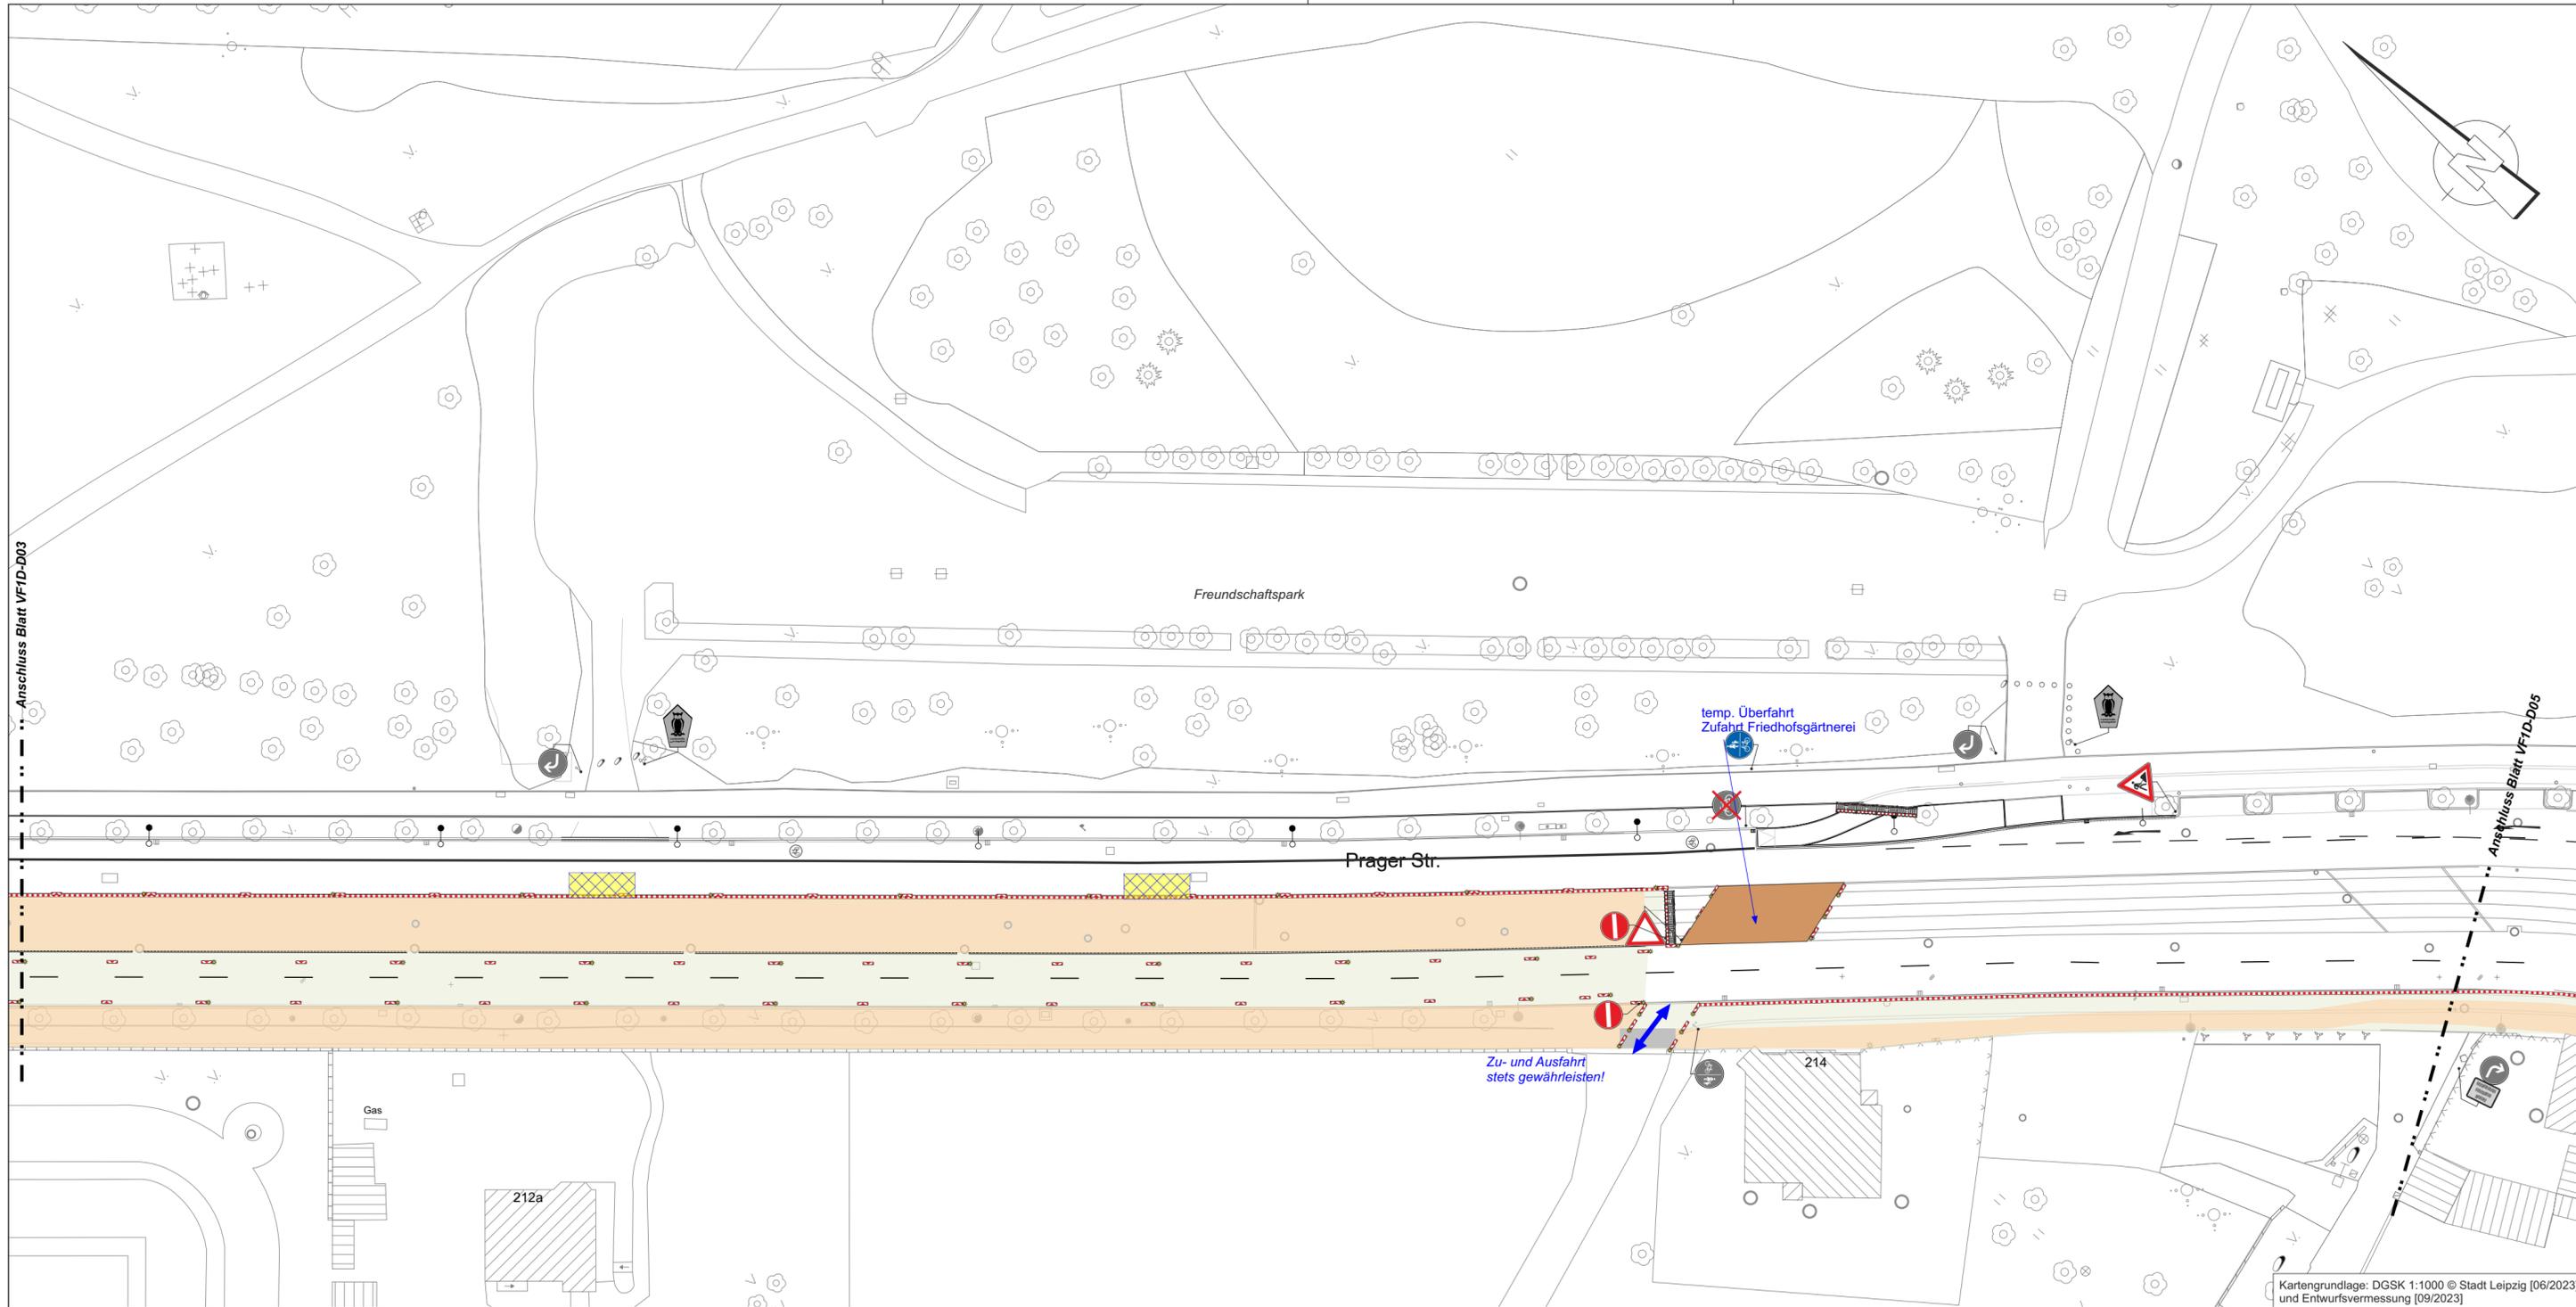

- Temporäre Beschilderung
- Stationäre Beschilderung
- stationäre Beschilderung während der Bauzeit abdecken
- Zonen für Haltverbote
Haltverbote (V.83/V.26) inkl. 1-2 Zusatzzeichen
3 volle Tage vor Baubeginn stellen
- Schienensatzverkehr (SEV) / Bus
- Baufeld-/ Verkehrssicherungsbereiche
(die auszuführenden Bauleistungen und deren zeitliche Abfolge sind den Bauphasenplänen und dem Grobabaufplan zu entnehmen)
- temporäre Befestigungen auf Grünflächen, im Gleisbereich etc.
- Wanderbaustelle für Arbeiten am Gleisbereich
im Verkehrsbereich - Länge zwischen 5,0m - max.15,0 m;
Durchfahrtsbreite von min. 3,0 m muss stets gewährleistet werden.


Plan dient nur zu Kalkulationszwecken!

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name


	Datum	Name
bearbeitet	05.11.24	HMa
Blattgröße:	750 x 297 mm	

	Leipziger Verkehrsbetriebe LVB GmbH Georgiring 3 04103 Leipzig		Stadt Leipzig Mobilitäts- und Tiefbauamt Prager Straße 118-136 04317 Leipzig
Bauherr:			
Prager Straße zwischen An der Tabakmühle und Friedhofsgärtnerei (P.-Nr. 90617)			
Bauvorhaben:	Ausschreibungsunterlage		Verkehrsführung während der Bauzeit
Verkehrsführungsphase	1D		geplanter Zeitraum: 04.09.25-17.11.25
Baubereich	Detailplan 4		Maßstab: 1:500
			Unterlage/ Blatt-Nr.: VF1D-D 04

Kartengrundlage: DGSK 1:1000 © Stadt Leipzig [06/2023] und Entwurfsvermessung [09/2023]

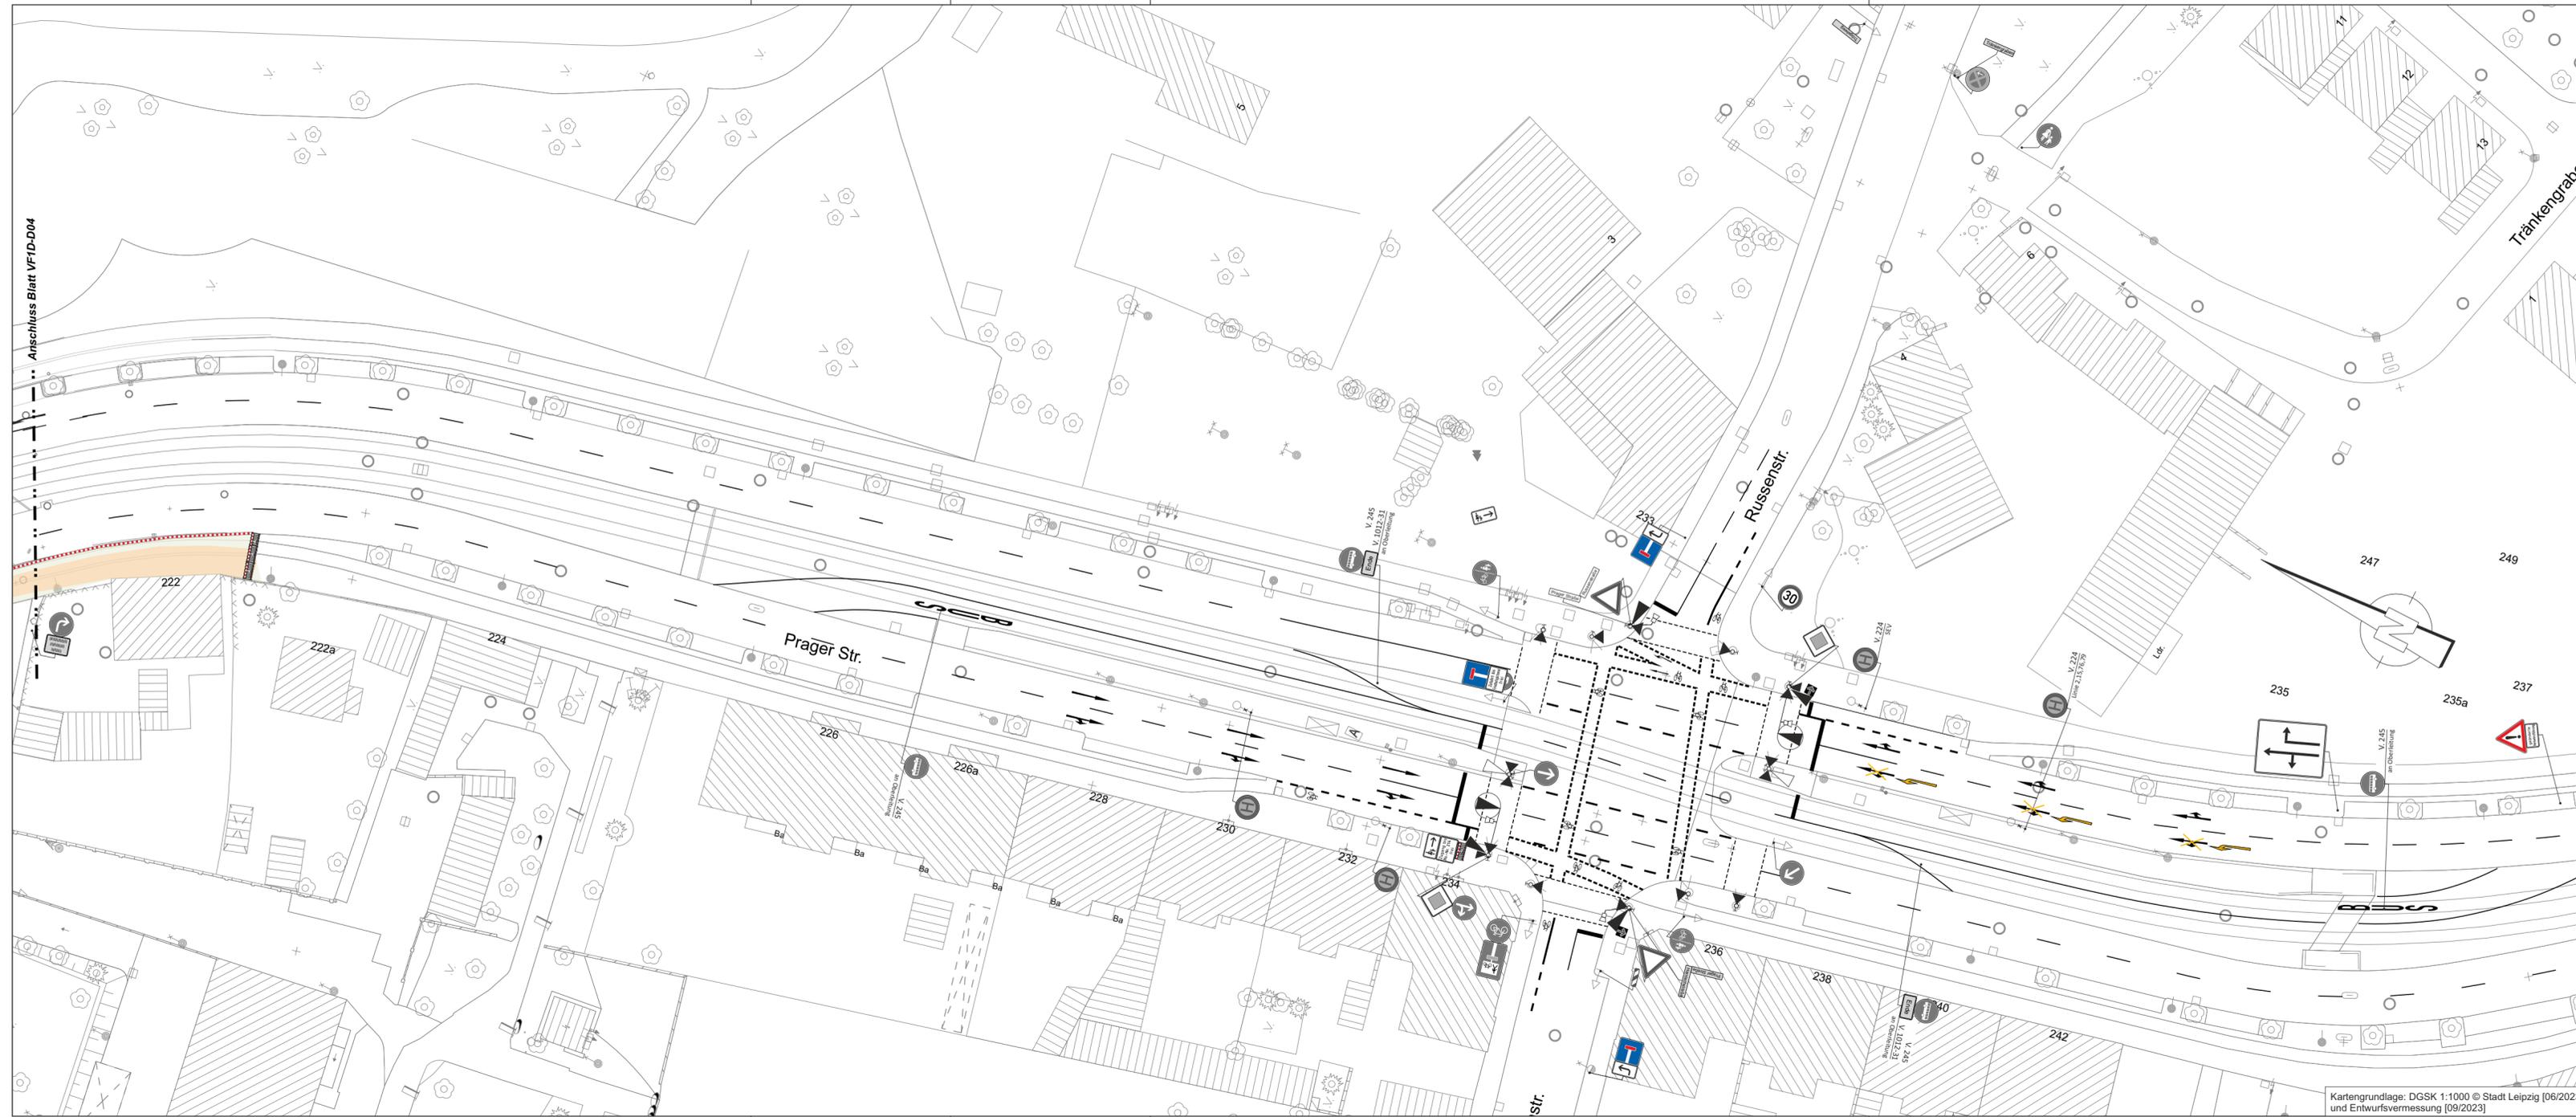

-  Temporäre Beschilderung
-  Stationäre Beschilderung
-  stationäre Beschilderung während der Bauzeit abdecken
-  Zonen für Haltverbote
Haltverbote (V.83/V.26) inkl. 1-2 Zusatzzeichen
3 volle Tage vor Baubeginn stellen
-  Schienersatzverkehr (SEV) / Bus
-  Baufeld-/ Verkehrssicherungsbereiche
(die auszuführenden Bauleistungen und deren zeitliche Abfolge sind den Bauphasenplänen und dem Grobbauplan zu entnehmen)
-  temporäre Befestigungen auf Grünflächen, im Gleisbereich etc.
-  Wanderbaustelle für Arbeiten an den Schächten/Leuchte etc.
im Verkehrsbereich - Länge zwischen 5,0m - max.10,0 m;
Durchfahrtsbreite von min. 3,0 m muss stets gewährleistet werden.



Plan dient nur zu Kalkulationszwecken!

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name
	bearbeitet	05.11.24	HMa
Blattgröße:		800 x 297 mm	

 Leipziger Verkehrsbetriebe LVB GmbH Georgiring 3 04103 Leipzig	 Stadt Leipzig Mobilitäts- und Tiefbauamt Prager Straße 118-136 04317 Leipzig
--	--

Bauherr:		
Prager Straße		
zwischen An der Tabakmühle und Friedhofsgärtnerei (P.-Nr. 90617)		
Bauvorhaben:	Verkehrsführung während der Bauzeit	Maßstab:
Ausschreibungsunterlage	Verkehrsführung während der Bauzeit	1:500
Verkehrsführungsphase 1D	geplanter Zeitraum: 04.09.25-17.11.25	Unterlage/ Blatt-Nr.:
Baubereich Detailplan 5		VF1D-D 05

Kartengrundlage: DGSK 1:1000 © Stadt Leipzig [06/2023] und Entwurfsvermessung [09/2023]



Straßenbahnvollsperrung : 14.04.2025 - 14.11.2025

Ferien:
 18.04.25 - 25.04.25 - Osterferien
 28.06.25 - 08.08.25 - Sommerferien
 06.10.25 - 18.10.25 - Herbstferien


- Umleitung MIV
- LVB/ Bus/ SEV durch Baubereich
- Baufeld
- Standorte temp. Plantafeln
- Standorte stationäre Wegweisung
- Zonen für Haltverbote (Stellung beidseitig)
 Haltverbote (V.83/V.26) inkl. 1-2 Zusatzzeichen
 3 volle Tage vor Baubeginn stellen und aller 30 m wiederholen
 ca.30m | ca.30m | ca.30m | ca.30m
- stat. LSA
- Untersuchung/ Anpassung stat. LSA
- temp. LSA

Keine Änderungen in der Beschilderung ggü. Umleitung VF- Phase 1B, nur Bus fährt auf den jeweiligen Richtungsfahrbahnen.

Plan dient nur zu Kalkulationszwecken!

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name
		05.11.25	HMa
Blattgröße:		640 x 420	

Leipziger Verkehrsbetriebe LVB GmbH Georgiring 3 04103 Leipzig		Stadt Leipzig Mobilitäts- und Tiefbauamt Stadt Leipzig Prager Straße 118-136 04317 Leipzig	
Bauherr:			
Prager Straße zwischen An der Tabakmühle und Friedhofsgärtnerei (P.-Nr. 90617)			
Bauvorhaben: Ausschreibungsunterlage		Verkehrsführung während der Bauzeit geplanter Zeitraum: 04.09.2025-17.11.25	
Verkehrsführungsphase 1D Umleitungsführung		Maßstab: ohne Unterlage/ Blatt-Nr.: VF1D-U-01	

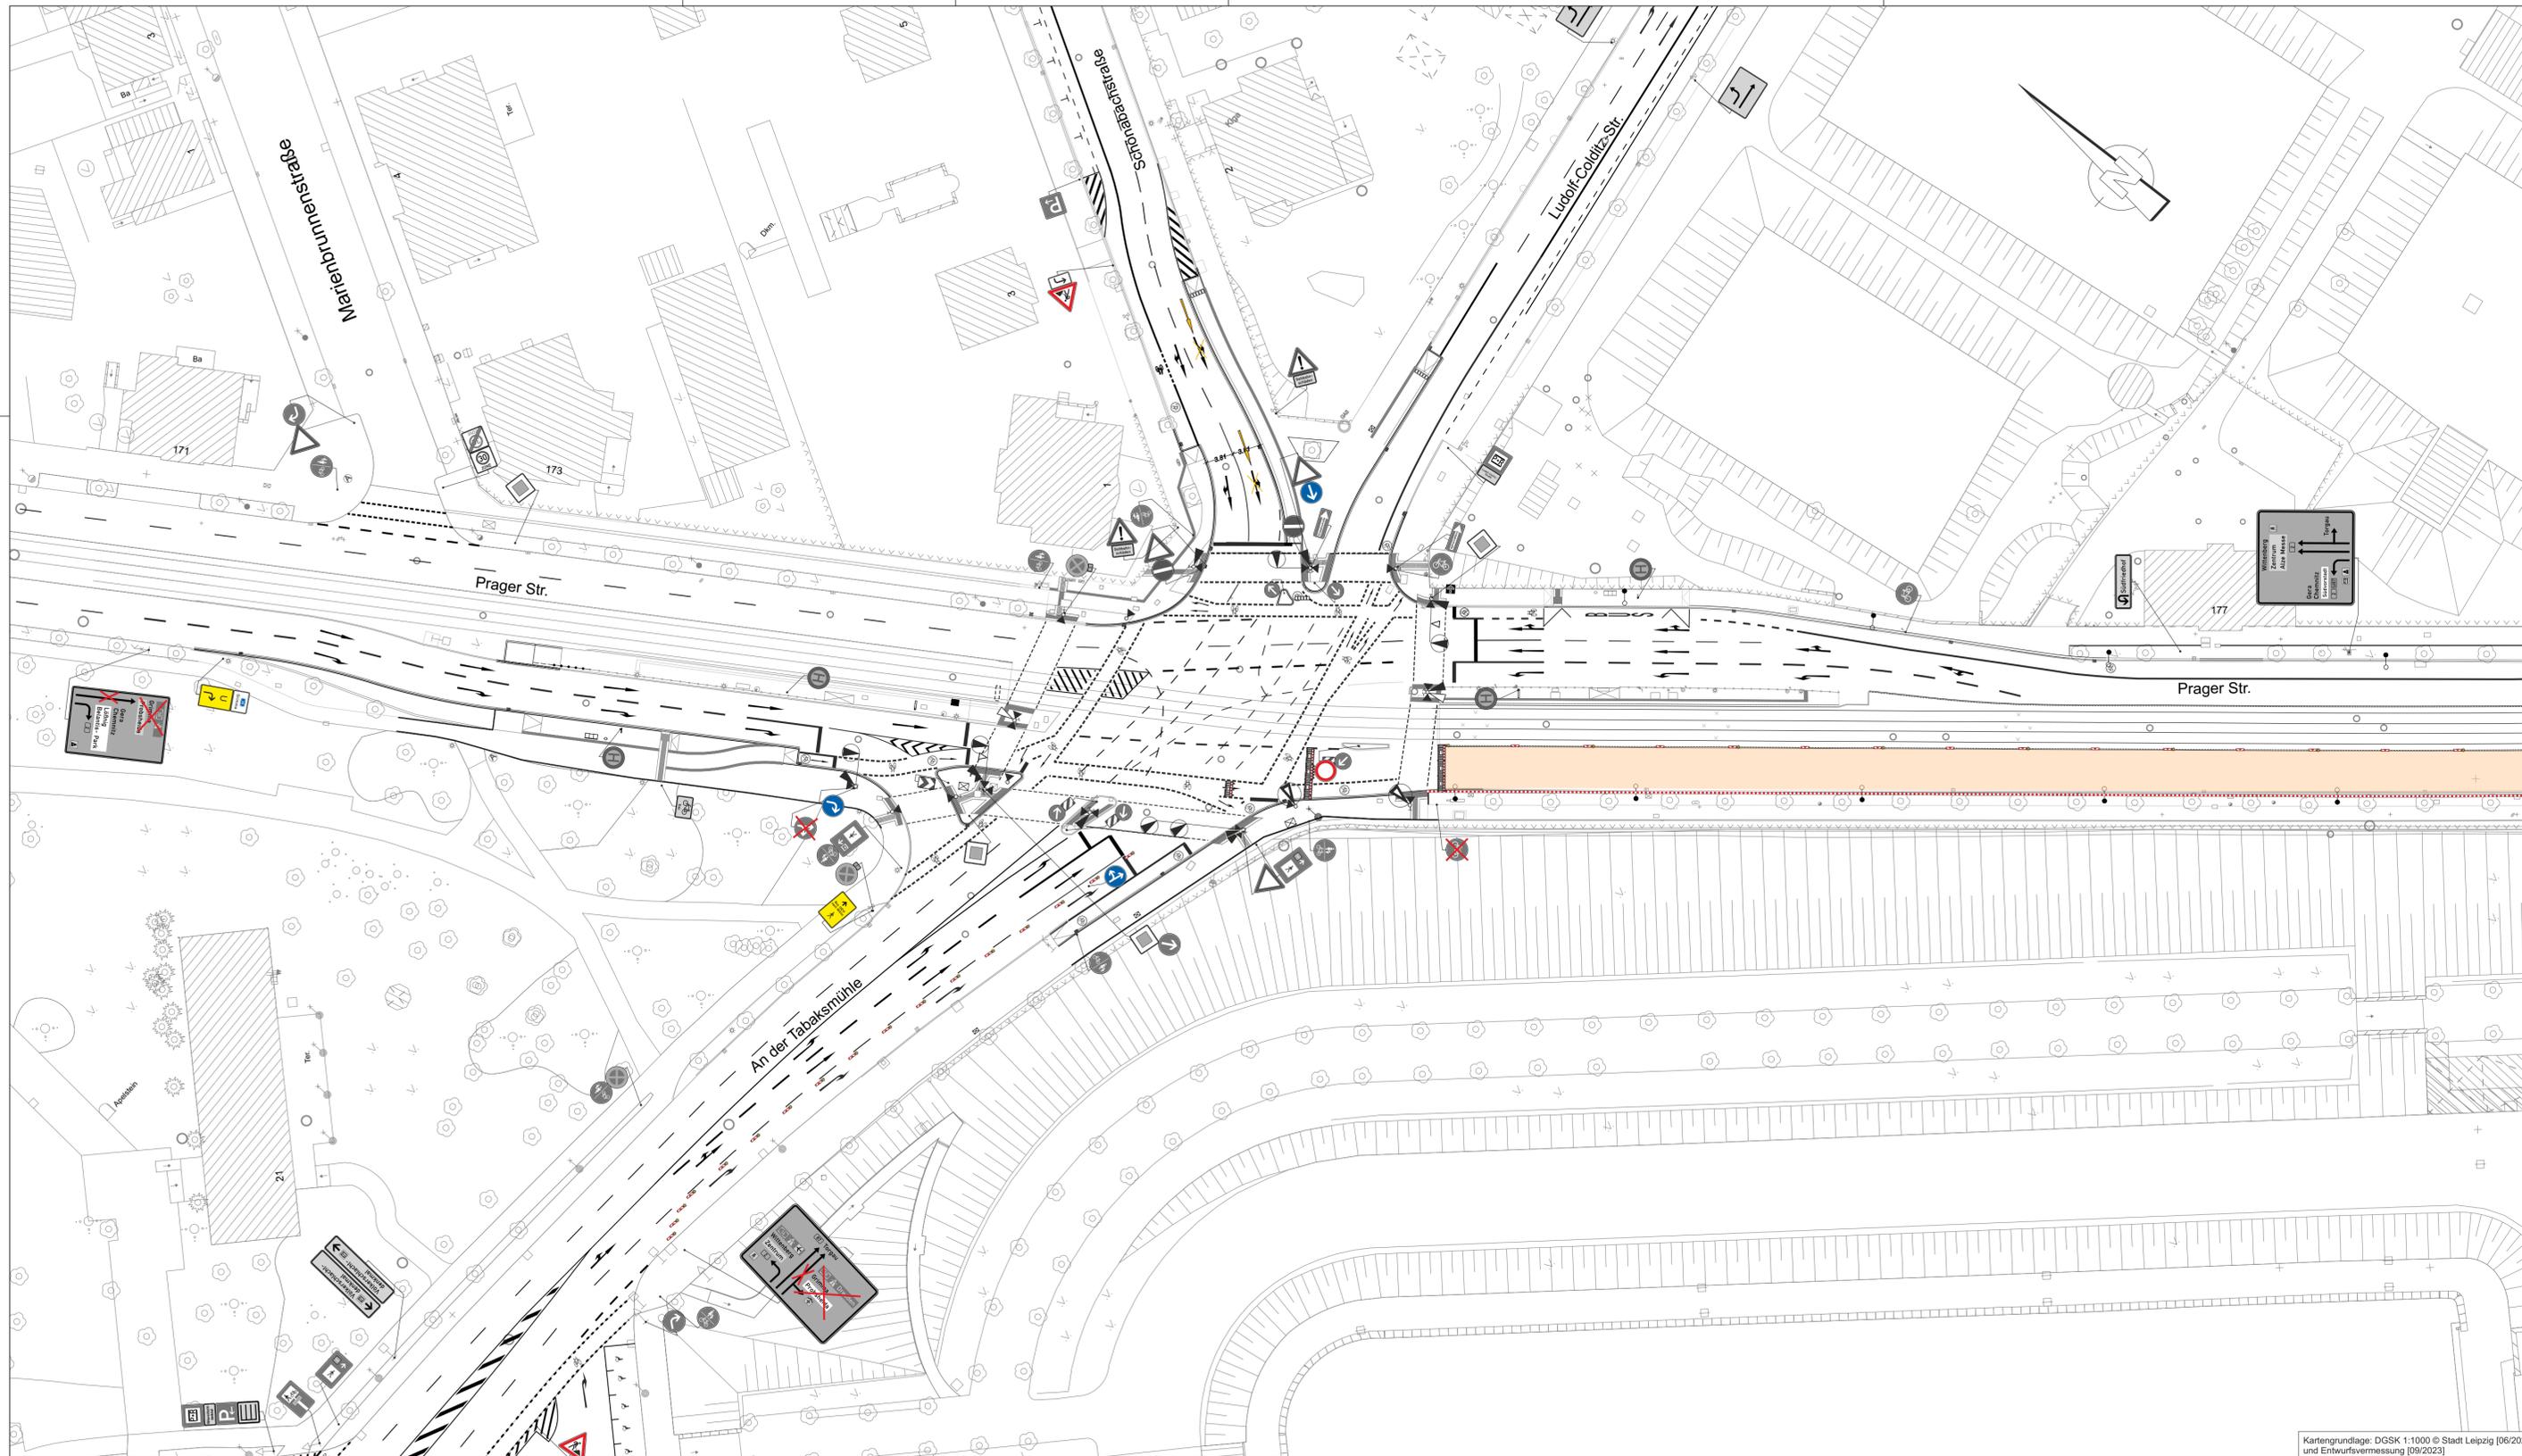

- Temporäre Beschilderung
- Stationäre Beschilderung
- stationäre Beschilderung während der Bauzeit abdecken
- Zonen für Haltverbote (V.83/V.26) inkl. 1-2 Zusatzzeichen
3 volle Tage vor Baubeginn stellen
- Schienersatzverkehr (SEV) / Bus
- Baufeld-/ Verkehrssicherungsbereiche
(die auszuführenden Bauleistungen und deren zeitliche Abfolge sind den Bauphasenplänen und dem Grobbauplan zu entnehmen)
- temporäre Befestigungen auf Grünflächen, im Gleisbereich etc.
- Wanderbaustelle für Arbeiten an den Schächten/Leuchte etc.
im Verkehrsbereich - Länge zwischen 5,0m -max.10,0 m;
Durchfahrtsbreite von min. 3,0 m muss stets gewährleistet werden.

Dem Fußgänger/ Radfahrerverkehr ist, sofern nicht anders ausgewiesen, eine mind. 1,5m breite, gesicherte, behindertengerechte befestigte Trasse zum Queren des Baufeldes vorzuhalten. Vorh. Grünstreifen im Querschnitt sind ebenfalls temp. zu befestigen. An den Bordkanten sind entspr. Anrampung vorzusehen. Die Querung über offene Leistungsgräben ist sicherzustellen (z.B. Fußgängerbrücke, Überfahrplatten- rutschfest!). Die Lage der kann in Abhängigkeit vom Baufortschritt variieren.

Das Erreichen der Grundstücke mit Kraftfahrzeugen ist außerhalb von Zeiten der Bautätigkeit (abends, nachts und an den Wochenenden) im Rahmen des Baufortschritts zu ermöglichen.

Für Rettungsfahrzeuge ist stets eine mindestens 3,00 m breite , befestigte und gesicherte Trasse im Bereich der Baufelder vorzuhalten. Kopflöcher/ Gräben müssen ggf. unverzüglich mit Stahlplatten/ Überfahrplatten abzudecken sein. Entsprechendes Gerät ist ständig vorzuhalten. Im Bereich der Fahrgasse dürfen keine Materialien gelagert oder Baufahrzeuge abgestellt sein. In Zeiten der Bauruhe ist die Trasse so aufzubereiten das Fahrzeuge (bis ca. 16t) diese befahren können. Die Fahrgasse ist mit Baken (V605-42/43) in einem Abstand von ca. 5,0 m abzusichern! Dies gilt auch für notwendige Fahrgassen und Überfahrten durch den SEV/Bus!

Plan dient nur zu Kalkulationszwecken!

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
bearbeitet	05.11.24	HMa
Blattgröße:	900 x 420 mm	

Leipziger Verkehrsbetriebe
LVB GmbH
Georgiring 3 | 04103 Leipzig

Stadt Leipzig
Mobilitäts- und Tiefbauamt
Prager Straße 118-136 | 04317 Leipzig

Bauherr:


Prager Straße
zwischen An der Tabaksmühle und Friedhofsgärtnerei
(P.-Nr. 90617)

Bauvorhaben: Ausschreibungsunterlage Verkehrsführung während der Bauzeit Maßstab: 1:500

Verkehrsführungsphase 2 geplanter Zeitraum: 17.11.25-19.11.25 Unterlage/ Blatt-Nr.: VF2-D 01

Baubereich Detailplan 1

Kartengrundlage: DGSK 1:1000 © Stadt Leipzig [06/2023] und Entwurfsvermessung [09/2023]

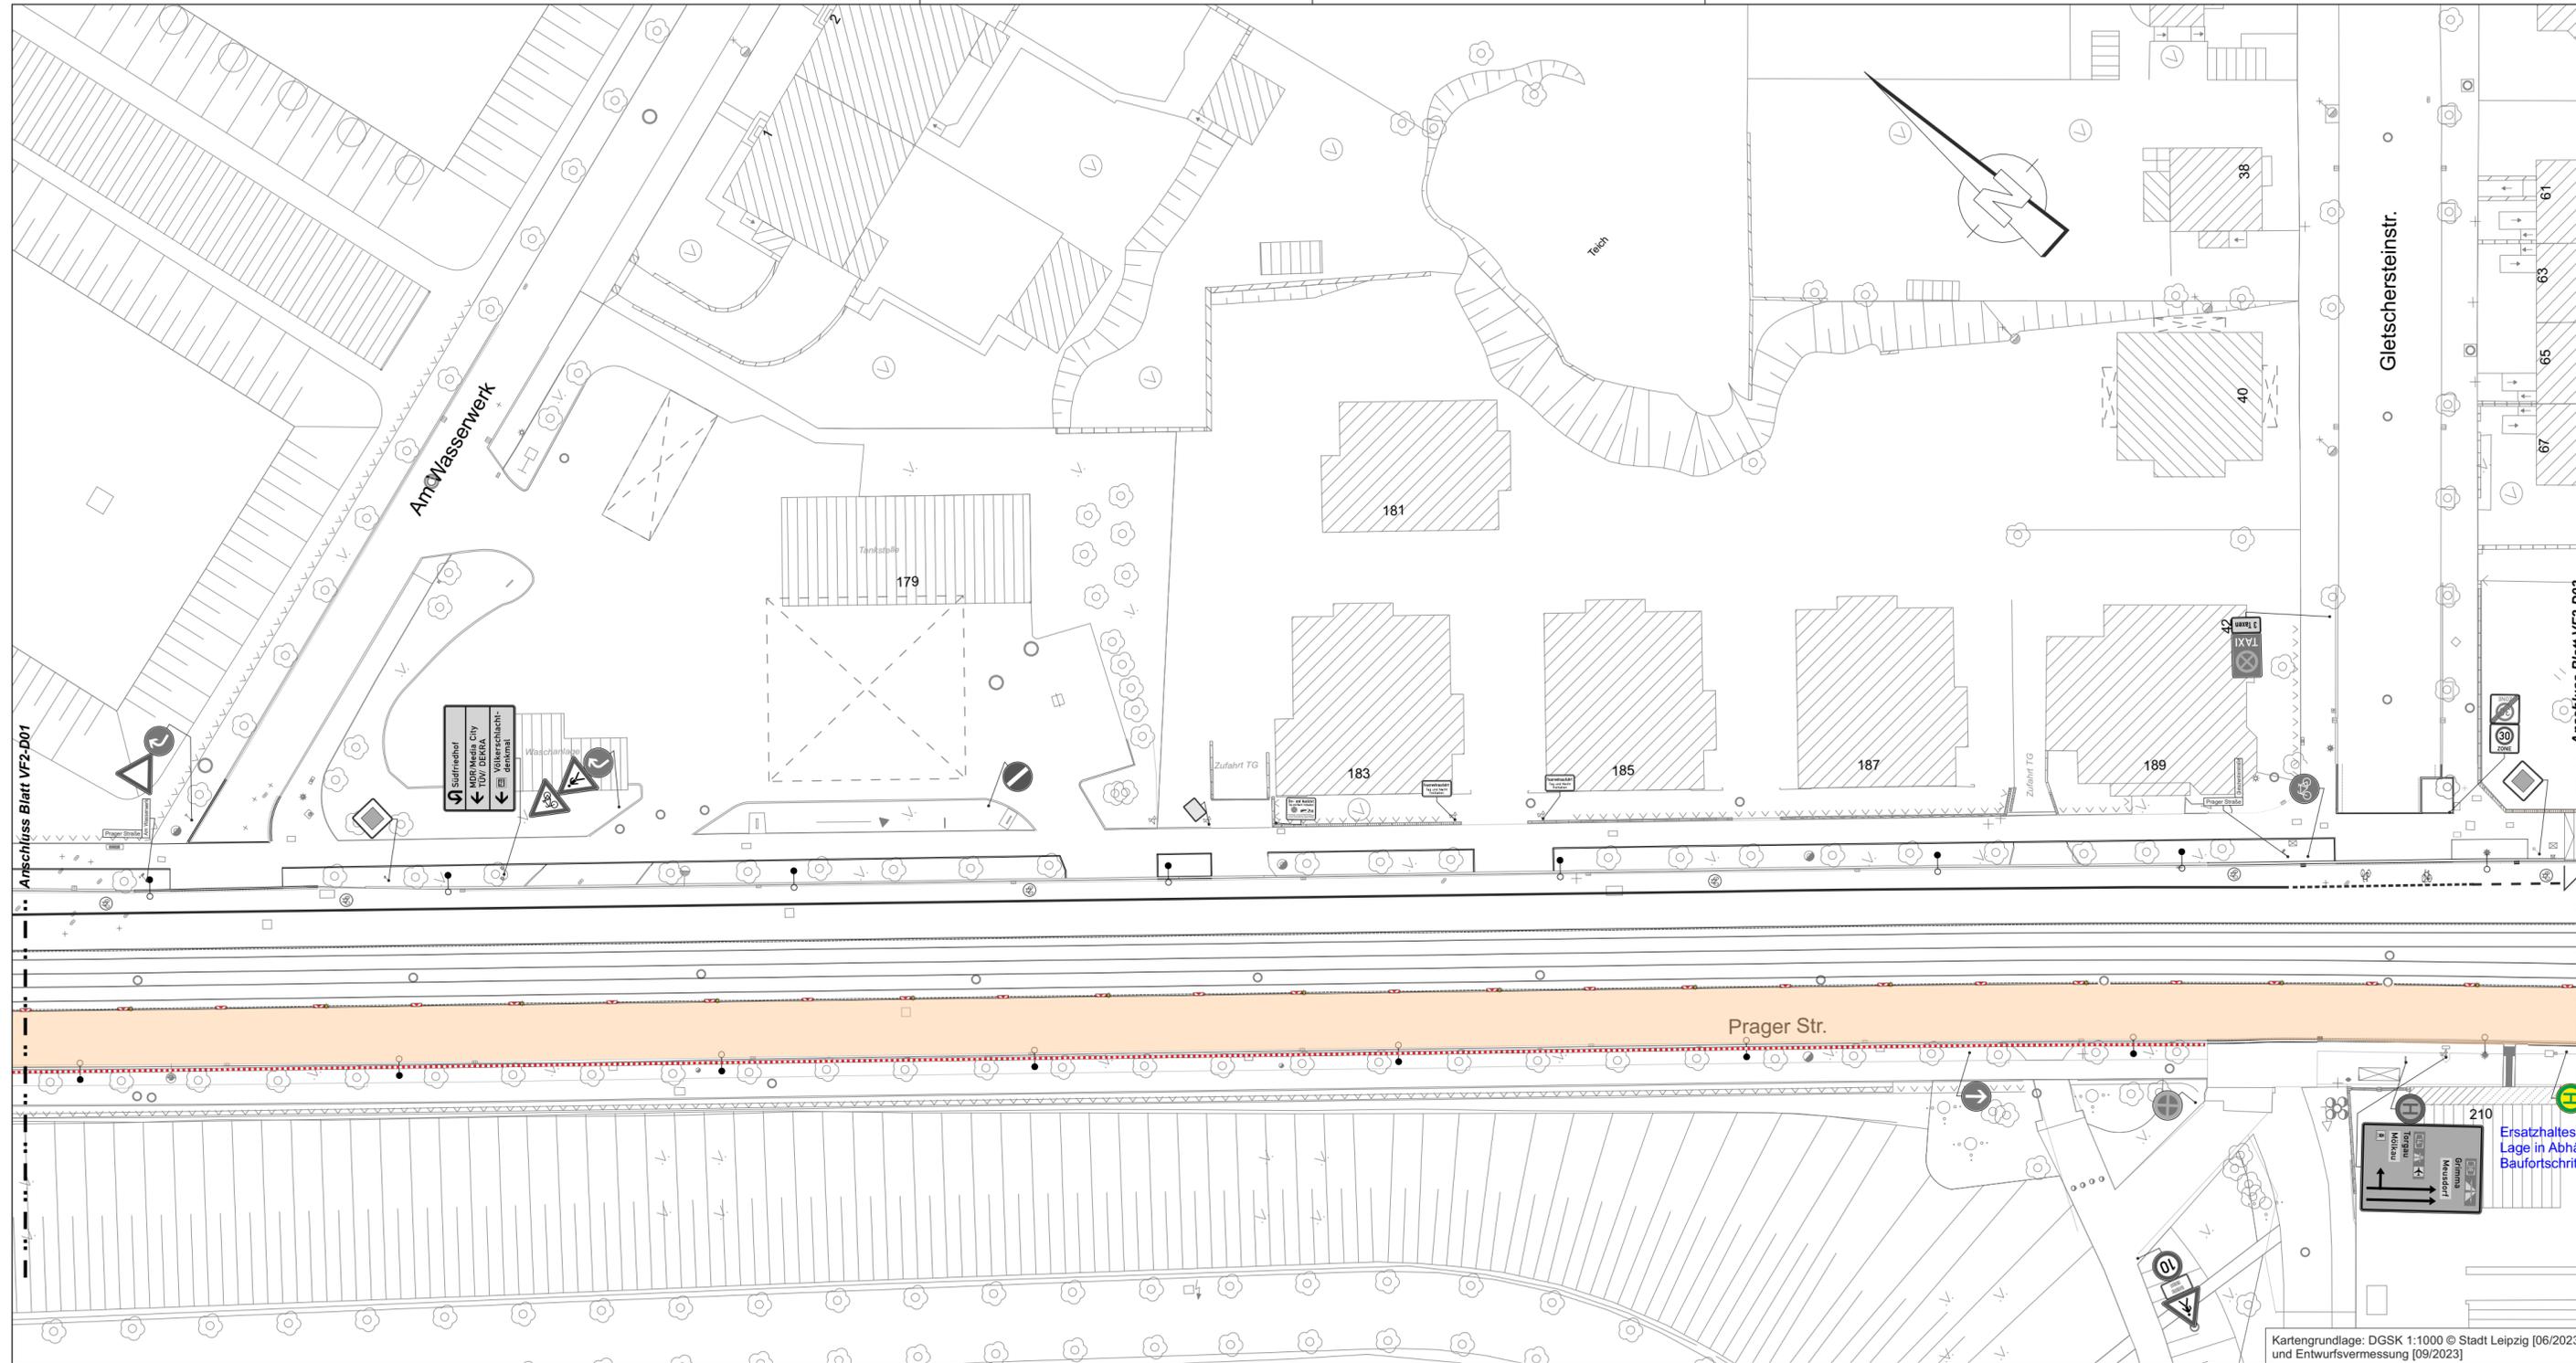

- Temporäre Beschilderung
- Stationäre Beschilderung
- stationäre Beschilderung während der Bauzeit abdecken
- Zonen für Haltverbote
Haltverbote (V.83/V.26) inkl. 1-2 Zusatzzeichen
3 volle Tage vor Baubeginn stellen
- Schienersatzverkehr (SEV) / Bus
- Baufeld-/ Verkehrsicherungsbereiche
(die auszuführenden Bauleistungen und deren zeitliche Abfolge sind den Bauphasenplänen und dem Grobablaufplan zu entnehmen)
- temporäre Befestigungen auf Grünflächen, im Gleisbereich etc.
- Wanderbaustelle für Arbeiten an den Schächten/Leuchte etc.
im Verkehrsbereich - Länge zwischen 5,0m - max.10,0 m;
Durchfahrtsbreite von min. 3,0 m muss stets gewährleistet werden.

Plan dient nur zu Kalkulationszwecken!

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name
		05.11.24	HMa

Blattgröße: 730 x 297 mm

Leipziger Verkehrsbetriebe
LVB GmbH
Georgiring 3 | 04103 Leipzig


Stadt Leipzig
Mobilitäts- und Tiefbauamt
Prager Straße 118-136 | 04317 Leipzig

Bauherr: **Stadt Leipzig**

Prager Straße
zwischen An der Tabakmühle und Friedhofsgärtnerei
(P.-Nr. 90617)

Bauvorhaben:	Verkehrsführung während der Bauzeit	Maßstab:	1:500
Ausschreibungsunterlage:	Verkehrsführung während der Bauzeit	Unterlage/ Blatt-Nr.:	VF2-D02
Verkehrsführungsphase:	2	geplanter Zeitraum:	17.11.25-19.12.25
Baubereich:	Detailplan 2		

Kartengrundlage: DGSK 1:1000 © Stadt Leipzig [06/2023] und Entwurfsvermessung [09/2023]

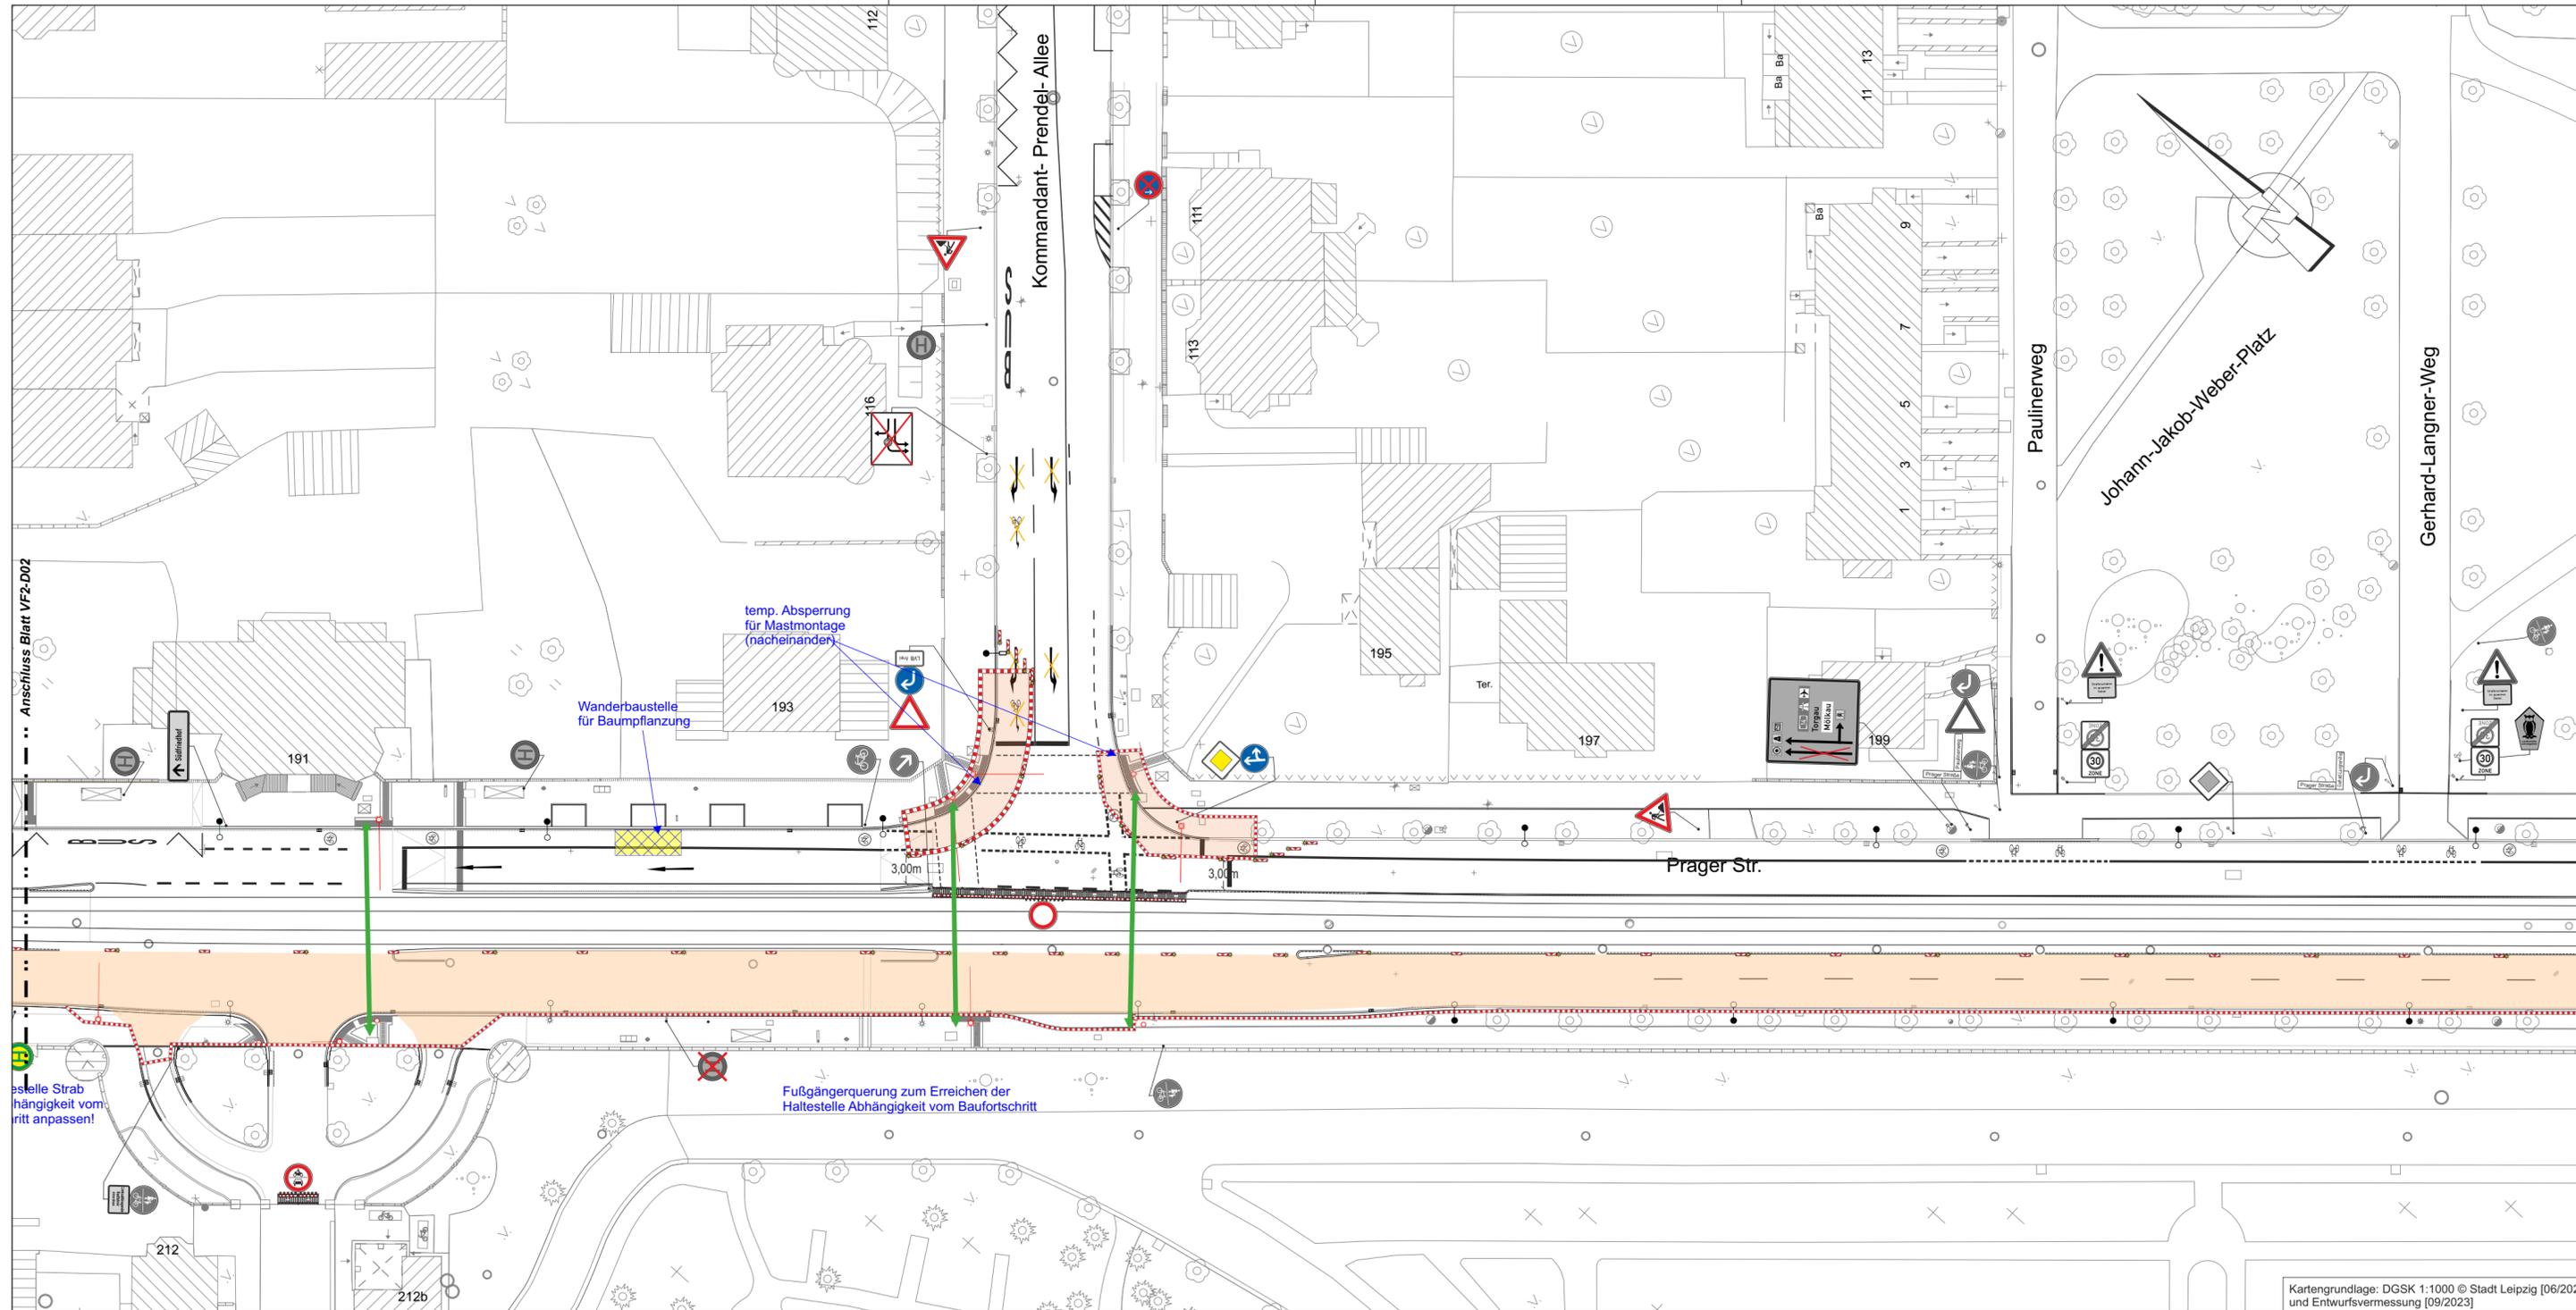

- Temporäre Beschilderung
- Stationäre Beschilderung
- stationäre Beschilderung während der Bauzeit abdecken
- Zonen für Haltverbote
Haltverbote (V.83/V.26) inkl. 1-2 Zusatzzeichen
3 volle Tage vor Baubeginn stellen
- Schienersatzverkehr (SEV) / Bus
- Baufeld-/ Verkehrssicherungsbereiche
(die auszuführenden Bauleistungen und deren zeitliche Abfolge sind den Bauphasenplänen und dem Grobbauplan zu entnehmen)
- temporäre Befestigungen auf Grünflächen, im Gleisbereich etc.
- Wanderbaustelle für Arbeiten an den Schächten/Leuchte etc.
im Verkehrsbereich - Länge zwischen 5,0m - max.10,0 m;
Durchfahrtsbreite von min. 3,0 m muss stets gewährleistet werden.

ca.30m | ca.30m | ca.30m | ca.30m

Plan dient nur zu Kalkulationszwecken!

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
bearbeitet	05.11.24	HMa
Blattgröße:	750 x 297 mm	


	Leipziger Verkehrsbetriebe LVB GmbH Georgiring 3 04103 Leipzig		Stadt Leipzig Mobilitäts- und Tiefbauamt Prager Straße 118-136 04317 Leipzig
--	---	--	---

Bauherr:

Prager Straße
zwischen An der Tabakmühle und Friedhofsgärtnerei
(P.-Nr. 90617)

Bauvorhaben:	Ausschreibungsunterlage	Verkehrsführung während der Bauzeit	Maßstab:
	Verkehrsführungsphase 2	geplanter Zeitraum: 17.11.25-19.12.25	1:500
Baubereich Detailplan 3			Unterlage/ Blatt-Nr.: VF1D-D 03

Kartengrundlage: DGSK 1:1000 © Stadt Leipzig [06/2023] und Entwurfsvermessung [09/2023]

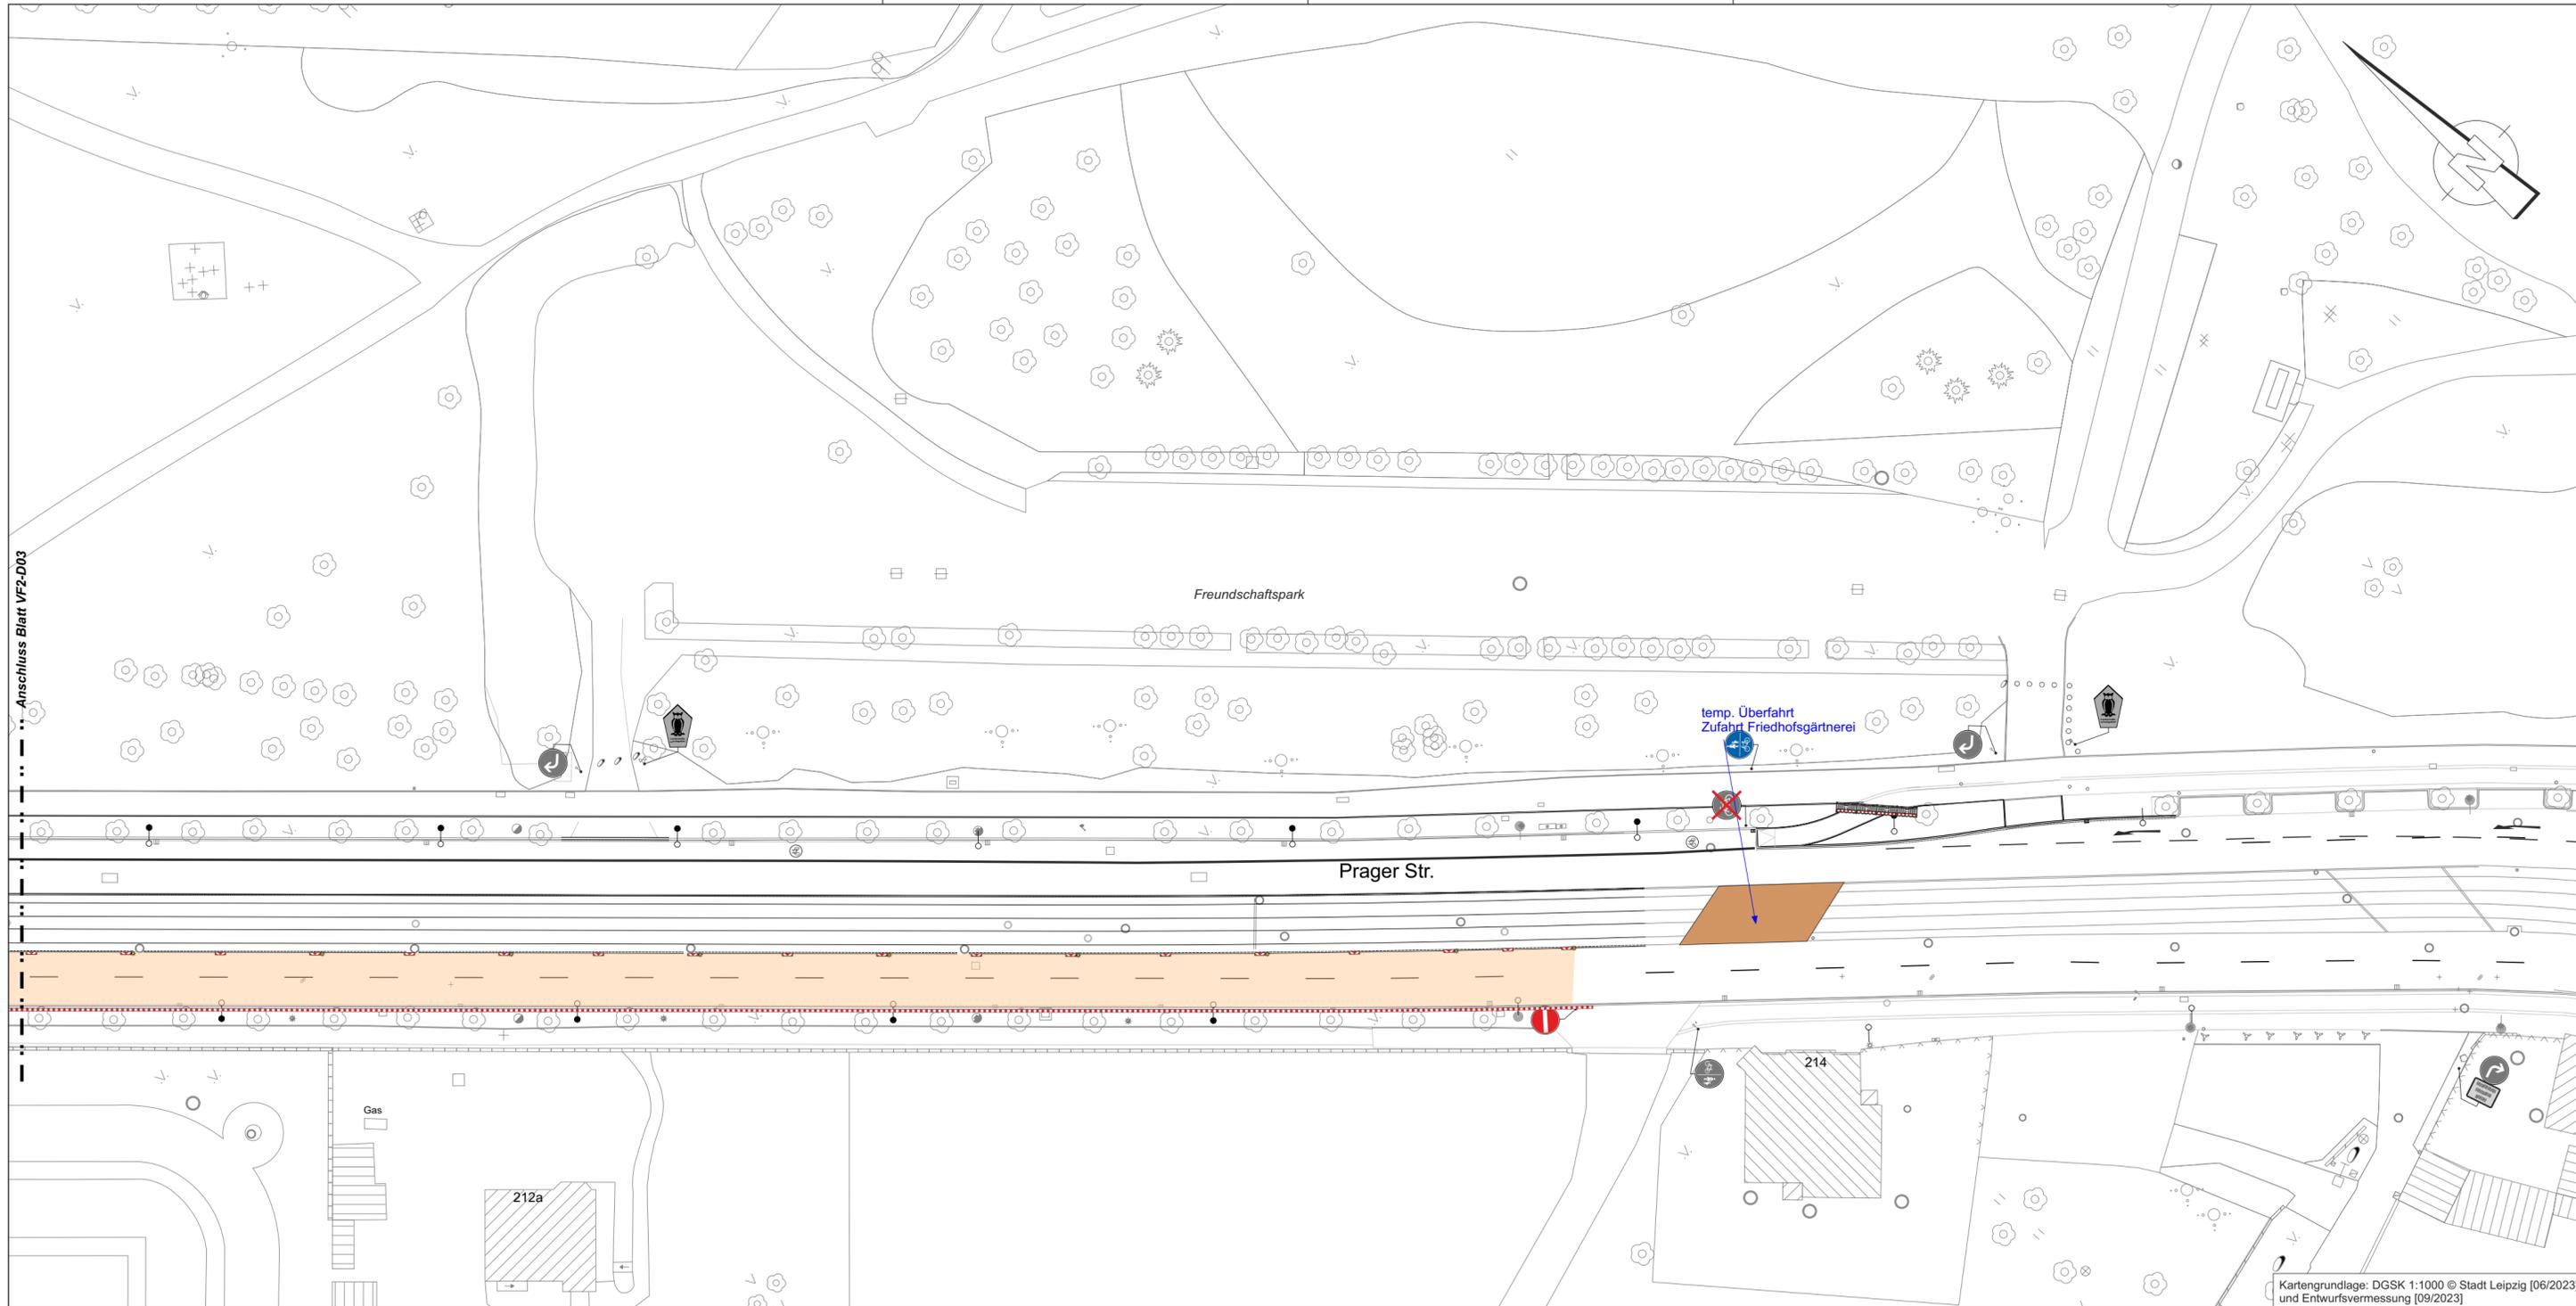

- Temporäre Beschilderung
- Stationäre Beschilderung
- stationäre Beschilderung während der Bauzeit abdecken
- Zonen für Haltverbote
Haltverbote (V.83/V.26) inkl. 1-2 Zusatzzeichen
3 volle Tage vor Baubeginn stellen
- Schienensatzverkehr (SEV) / Bus
- Baufeld-/ Verkehrssicherungsbereiche
(die auszuführenden Bauleistungen und deren zeitliche Abfolge sind den Bauphasenplänen und dem Grobabaufplan zu entnehmen)
- temporäre Befestigungen auf Grünflächen, im Gleisbereich etc.
- Wanderbaustelle für Arbeiten an den Schächten/Leuchte etc.
im Verkehrsbereich - Länge zwischen 5,0m - max.10,0 m;
Durchfahrtsbreite von min. 3,0 m muss stets gewährleistet werden.

Plan dient nur zu Kalkulationszwecken!

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
bearbeitet	05.11.24	HMa
Blattgröße:	750 x 297 mm	

	Leipziger Verkehrsbetriebe LVB GmbH Georgiring 3 04103 Leipzig		Stadt Leipzig Mobilitäts- und Tiefbauamt Prager Straße 118-136 04317 Leipzig
Bauherr:			
Prager Straße zwischen An der Tabaksmühle und Friedhofsgärtnerei (P.-Nr. 90617)			
Bauvorhaben:		Ausschreibungsunterlage	
Verkehrsführung während der Bauzeit		Verkehrsführungsphase 2	
geplanter Zeitraum: 17.11.25-19.12.25		Maßstab: 1:500	
Baubereich Detailplan 4		Unterlage/ Blatt-Nr.: VF2-D 04	

Kartengrundlage: DGSK 1:1000 © Stadt Leipzig [06/2023] und Entwurfsvermessung [09/2023]

Straßenbahnvollsperrung : 14.04.2025 - 14.11.2025

Ferien:
 18.04.25 - 25.04.25 - Osterferien
 28.06.25 - 08.08.25 - Sommerferien
 06.10.25 - 18.10.25 - Herbstferien

-  Umleitung MIV
-  LVB/ Bus/ SEV durch Baubereich
-  Baufeld
-  Standorte temp. Planaufeln
-  Standorte stationäre Wegweisung
-  Zonen für Haltverbote (Stellung beidseitig)
 Haltverbote (V.83/V.26) inkl. 1-2 Zusatzzeichen
 3 volle Tage vor Baubeginn stellen und aller 30 m wiederholen

-  stat. LSA
-  Untersuchung/ Anpassung stat. LSA
-  temp. LSA

Plan dient nur zu Kalkulationszwecken!

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name
		05.11.25	HMa
Blattgröße:		640 x 420	

Leipziger Verkehrsbetriebe
 LVB GmbH
 Georgiring 3 | 04103 Leipzig

Stadt Leipzig
 Mobilitäts- und Tiefbauamt
 Prager Straße 118-136 | 04317 Leipzig

Bauherr:

Prager Straße
 zwischen An der Tabakmühle und Friedhofsgärtnerei
 (P-Nr. 90617)

Bauvorhaben: Verkehrsführung während der Bauzeit

Verkehrsführungsphase 2 **geplanter Zeitraum:** 17.11.25- 19.12.25


Umleitungsführung

Maßstab: ohne



Unterlage/ Blatt-Nr.: VF2-U-01





Riebeckstraße vor Prager Straße

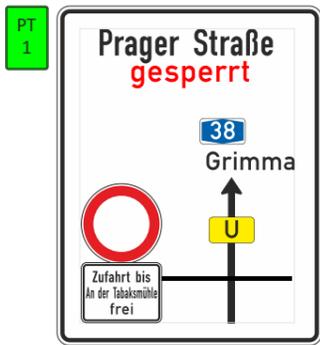

Prager Straße vor Semmelweisstraße

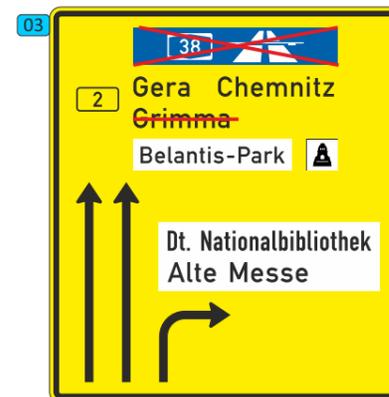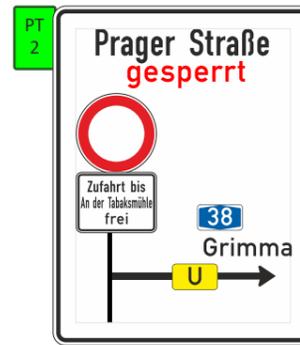


Philipp-Rosenthal-Str. vor Semmelweisstraße (Zuf. Nord)

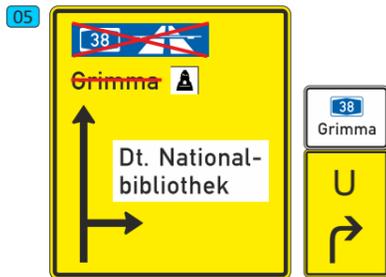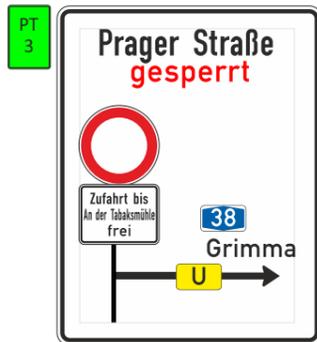



Philipp-Rosenthal-Str. vor Semmelweisstraße (Zuf. Süd)



Straße des 18. Oktober vor Semmelweisstraße

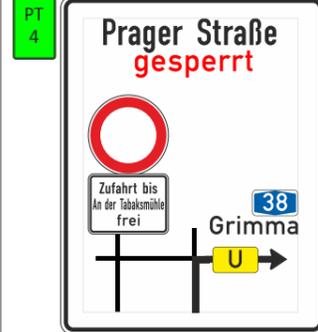


Semmelweisstraße vor Zwickauer Str.

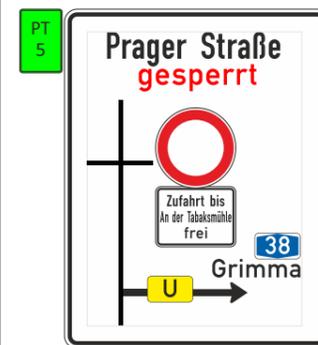


Semmelweisstr. vor Str. 18. Oktober (Zuf. West)



Deutscher Platz vor Semmelweisstr.

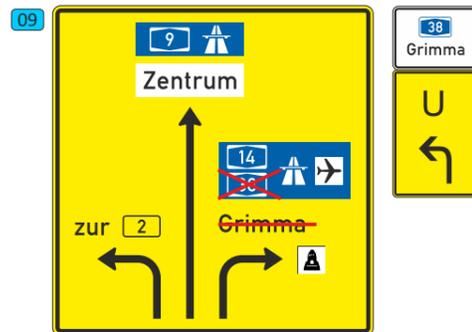



Semmelweisstr. vor Zwickauer Str. (Zuf. Ost)

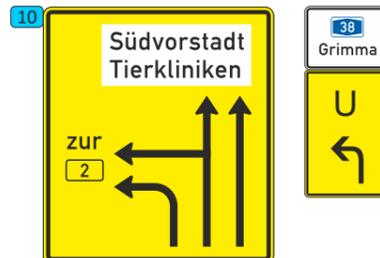

Zwickauer Str. vor R.-Lehmann-Str. (Zuf. Nord)



Richard-Lehmann-Str. vor Zwickauer Str. (Zuf. West)

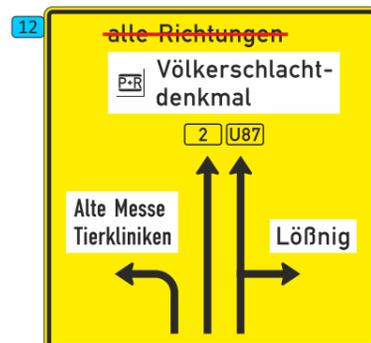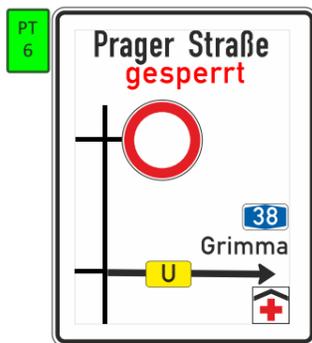

Leipziger Verkehrsbetriebe
 Leipziger Verkehrsbetriebe LVB GmbH
 Georgiring 3 | 04103 Leipzig

Stadt Leipzig
 Stadt Leipzig
 Mobilitäts- und Tiefbauamt
 Prager Straße 118-136 | 04317 Leipzig


Prager Straße
 zwischen An der Tabaksmühle und Friedhofsgärtnerei
 (P.-Nr. 90617)

Bauvorhaben:
 Ausschreibungsunterlage
 Verkehrsführung während der Bauzeit
 Verkehrsführungsphase (VF-Ph) 2
 Umleitungsbeschilderung- Details zu Planaufnahmen, Wegweisern und Zusatzzeichen für V.455


geplante Bauzeit:
 17.11.25-19.12.25

bearbeitet/ Name: HMa Maßstab: ohne Blattgröße: A3 Datum/Stand: 05.11.24 Unterlage/ Blatt-Nr.: 2-U02


Kregelstraße vor Prager Str.

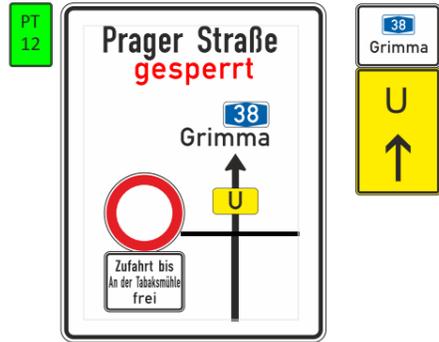

Prager Str. vor Kregelstr.

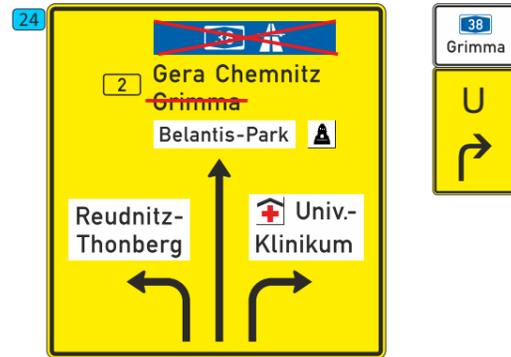

Philipp-Rosenthal-Str. vor Prager Str.

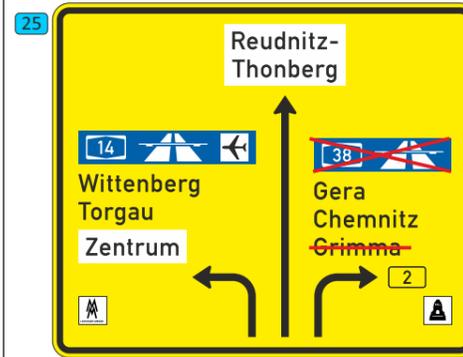

Prager Str. vor Friedhofsweg




Prager Str. vor An der Tabaksmühle




Prager Str. vor Riebeckstr.



Semmelweisstr. vor Prager Str.

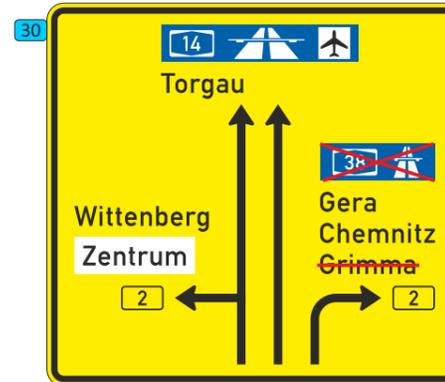

Kommandant-Prendel-Allee vor Prager Str.



Leipziger Verkehrsbetriebe LVB GmbH Georgiring 3 04103 Leipzig		Stadt Leipzig Mobilitäts- und Tiefbauamt Prager Straße 118-136 04317 Leipzig	
Prager Straße zwischen An der Tabaksmühle und Friedhofsgärtnerei (P.-Nr. 90617)			
Bauvorhaben:			
Ausschreibungsunterlage		geplante Bauzeit:	
Verkehrsführung während der Bauzeit		17.11.25-19.12.25	
Verkehrsführungsphase (VF-Ph) 2 Umleitungsbeschilderung- Details zu Plankarten, Wegweisern und Zusatzzeichen für V.455			
bearbeitet/ Name: HMa	Maßstab: ohne	Blattgröße: A3	Datum/Stand: 05.11.24
			Unterlage/ Blatt-Nr.: 2-U04

Zwickauer Str. vor Richard-Lehmann-Str. (Zuf. Süd)




Richard-Lehmann-Str. vor Zwickauer Str. (Zuf. Ost)




Richard-Lehmann-Str. vor An der Tabaksmühle



An der Tabaksmühle vor Richard-Lehmann-Str.

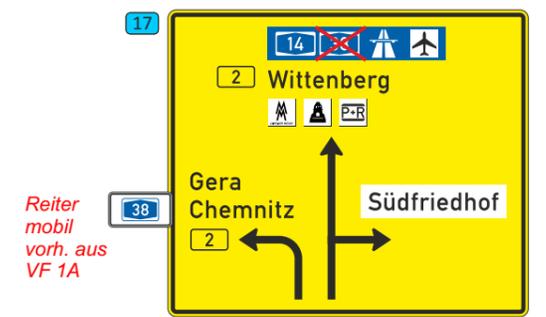


An der Tabaksmühle vor Prager Str.

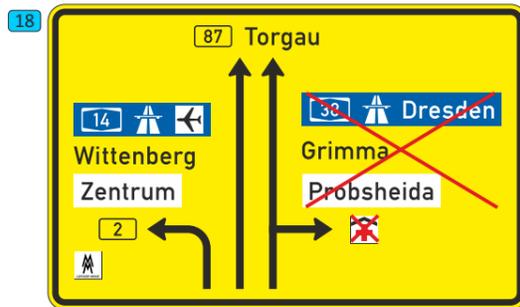

Zwickauer Str. vor Arno-Nitzsche-Str.



Arno-Nitzsche-Str. vor Zwickauer Str.

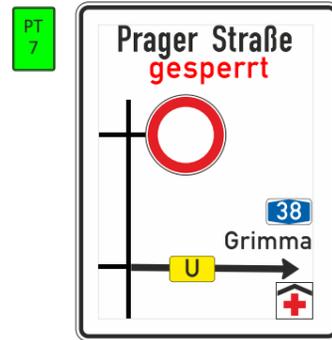

Zwickauer Str. vor Probstheidaer Str. (Zuf. Nord)



Connewitzer Str. vor Dösener Str.




Nieritzstr. vor Prager Str.




Prager Str. vor Nieritzstr.



Holzhäuser Str. vor Sommerfelder Str.

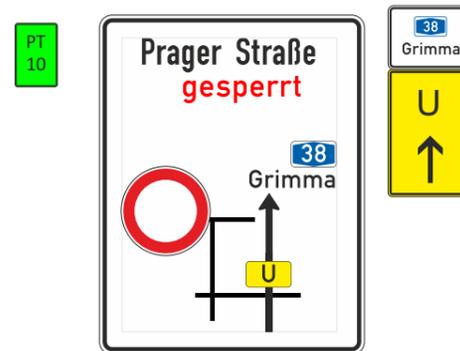

Zuckelhäuser Str. vor Holzhäuser Str.

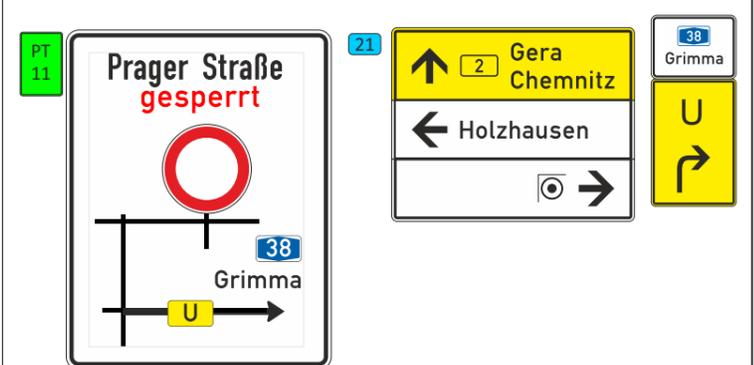


Holzhäuser Str. vor R.-Herrmann-Str.



Naunhofer Str. vor Prager Str.



Prager Str. vor Kregelstr. (Zuf. Süd)

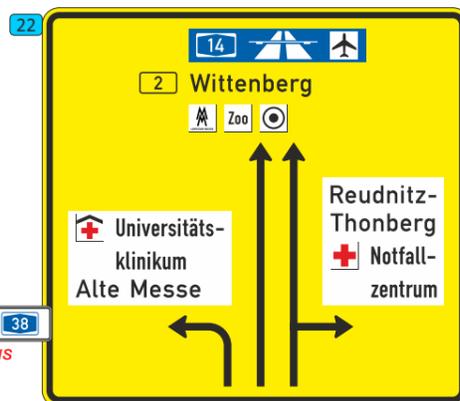

Leipziger Verkehrsbetriebe
Leipziger Verkehrsbetriebe
 LVB GmbH
 Georgiring 3 | 04103 Leipzig

Stadt Leipzig
 Stadt Leipzig
 Mobilitäts- und Tiefbauamt
 Prager Straße 118-136 | 04317 Leipzig

Prager Straße
 zwischen An der Tabaksmühle und Friedhofsgärtnerei
 (P.-Nr. 90617)

Bauherr: ...
 Bauvorhaben: ...

Ausschreibungsunterlage
 Verkehrsführung während der Bauzeit
 Verkehrsführungsphase (VF-Ph) 2
 Umleitungsbeschilderung- Details zu Planaufstellungen, Wegweisern und Zusatzzeichen für V.455

geplante Bauzeit:
 17.11.25-19.12.25

bearbeitet/ Name: HMa Maßstab: ohne Blattgröße: A3 Datum/Stand: 05.11.24 Unterlage/ Blatt-Nr.: 2-U03
